


H24-27年度 鹿野川ダム選択取水設備施設外新設工事

H28年11月 取水塔建屋建築・上流仮設構台撤去



11月7日 建屋の屋根と型枠組立、構台撤去(81%)

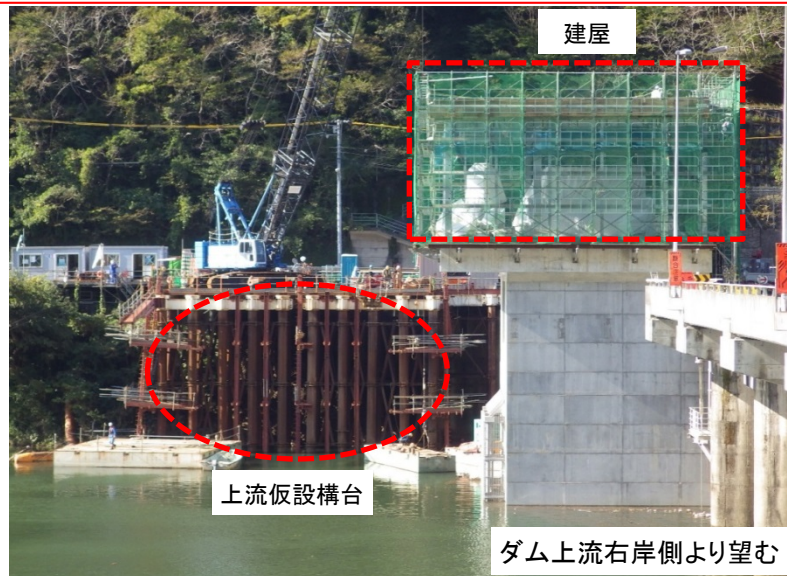

11月14日 建屋コンクリート打設完了



11月21日 建屋コンクリート養生、構台撤去(84%)



11月28日 建屋の壁パネル設置、構台撤去(92%)
