



H27-28年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設(その2)工事


H28年11月 吐ロゲート室躯体コンクリート打設

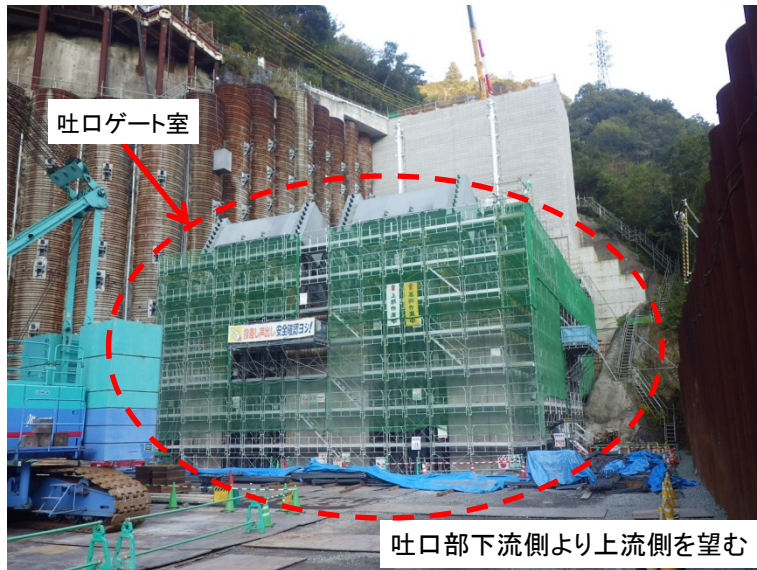

11月7日 13リフト中6リフトのコンクリート打設完了

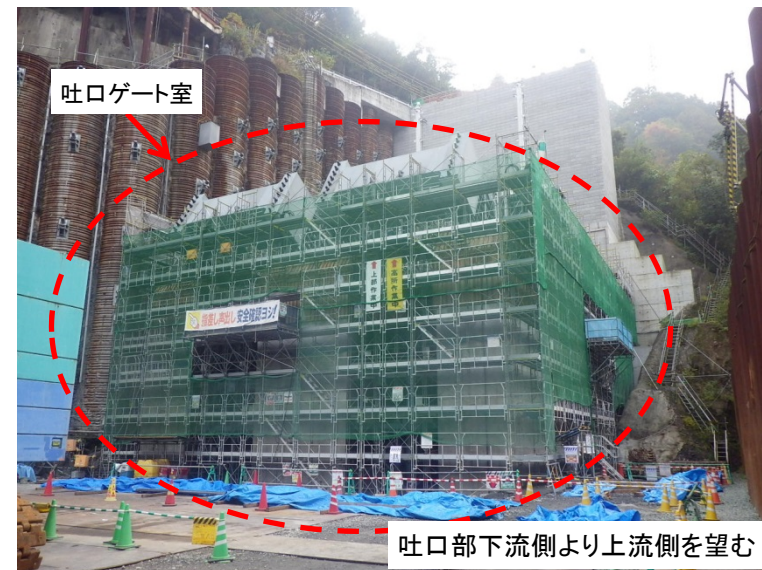

11月14日 13リフト中7リフトの鉄筋型枠組立

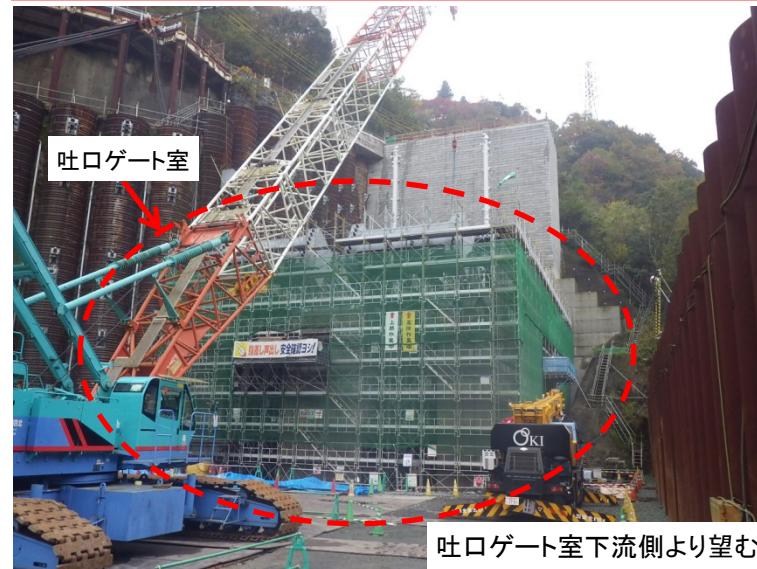

11月21日 13リフト中7リフトのコンクリート打設完了



11月28日 13リフト中8リフトの鉄筋型枠組立
