


## 資料9 工事手順及び監視

ナカちゃんに配慮した工事体制  
実施可能な対策

# ナカちゃんに配慮した工事体制

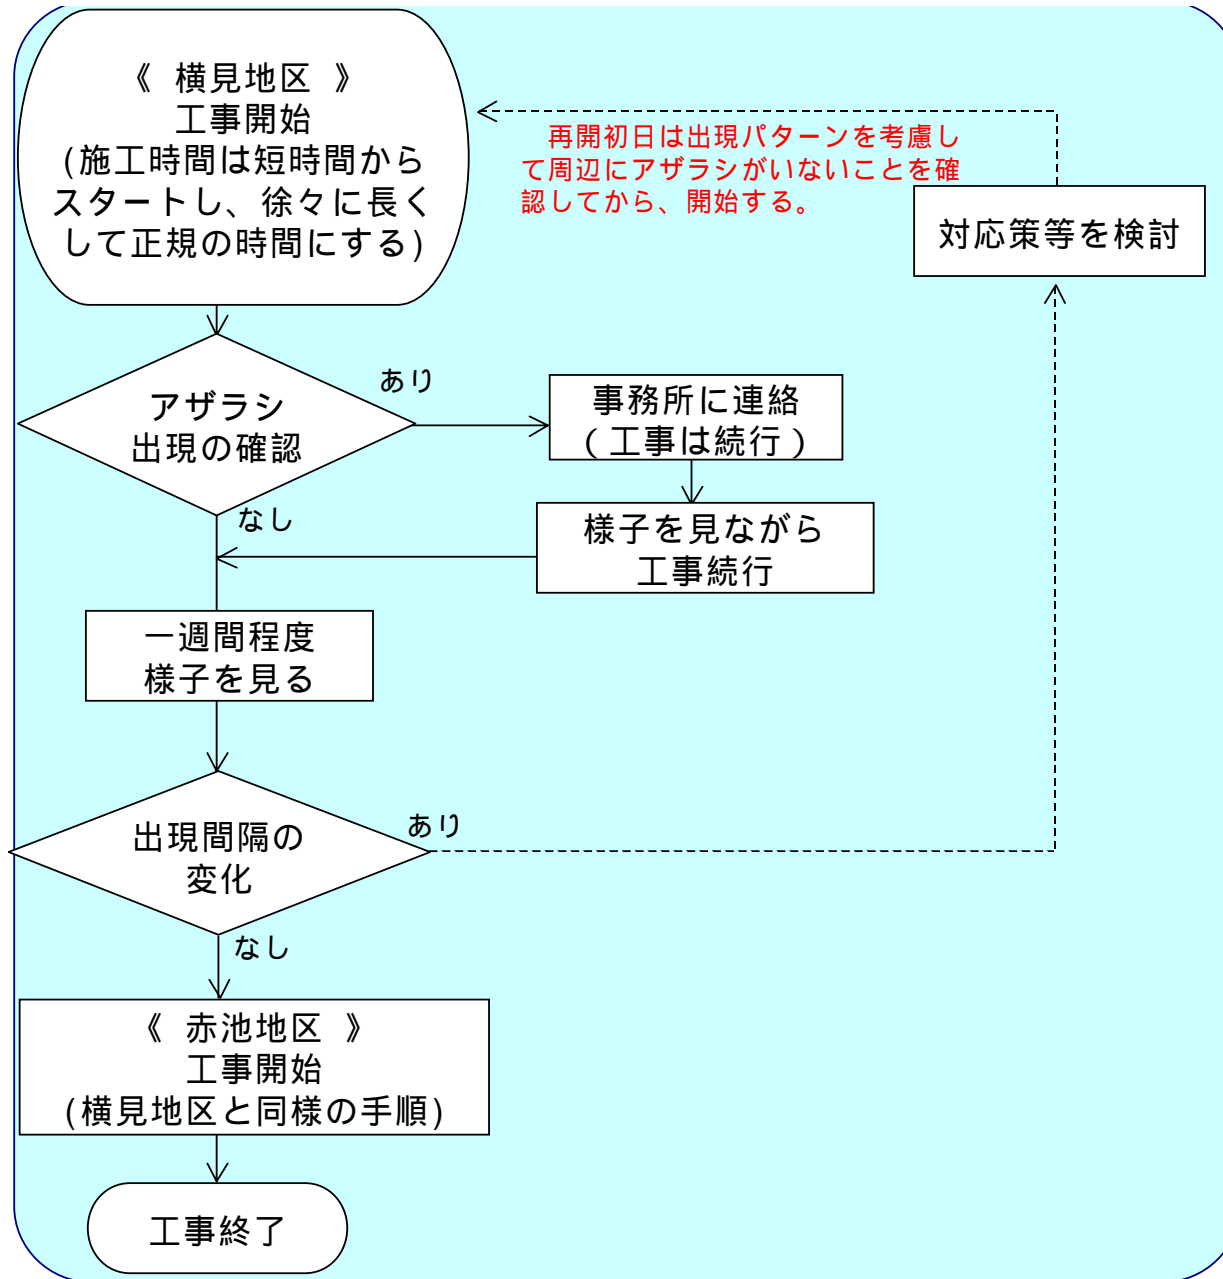

# 実施可能な対策

対策項目	通常作業	対策	
		赤池災害箇所	横見災害箇所
濁水対策	シルトフェンスを一重にて設置	二重にて設置	二重にて設置
騒音対策	ダンプトラック走行速度は20km/h程度	状況により10km/h程度とする	状況により10km/h程度とする
	材料の荷下ろし	材料を単粒砕石とし、荷下ろし速度をゆっくりと行い下方にてバックホウのバケットにて受け流しを行う	荷下ろし速度をゆっくり行う
作業動作対策	重機(バックホウ・クレーン)通常速度にて作業	通常速度よりゆっくり動作する	通常速度よりゆっくり動作する

- ・作業時間帯は出現時間が早朝ということから、8:30～17:00までとする。
- ・表の着色部分については、馴化対策のため、状況により通常作業に戻す場合がある。
- ・早期完成のため、雨天・休日も作業を実施する場合がある。
