

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【トンネル部】

7月 トンネル掘削（延伸）



7月1日 上半掘削 234m 下半145m 基礎114m



7月8日 上半掘削 248m 下半145m 基礎114m



7月15日 上半掘削 248m 下半190m 基礎114m



7月22日 上半掘削 264m 下半204m 基礎114m

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【トンネル部】

7月 トンネル掘削（延伸）



7月29日 上半掘削 287m 下半204m 基礎114m

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【呑口部】

7月 仮設構台設置(延伸)、呑口立坑掘削



7月1日 仮設構台設置、呑口立坑掘削



7月8日 仮設構台設置、呑口立坑掘削



7月15日 仮設構台設置、呑口立坑掘削



7月22日 仮設構台設置、呑口立坑掘削

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【呑口部】

7月 仮設構台設置(延伸)、呑口立坑掘削



7月29日 仮設構台設置、呑口立坑掘削

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【減勢工部】


7月 減勢工部の掘削、切梁、岩盤清掃、鉄筋組立、コンクリート打設



7月1日 鉄筋組立、コンクリート打設



7月8日 鉄筋組立、コンクリート打設

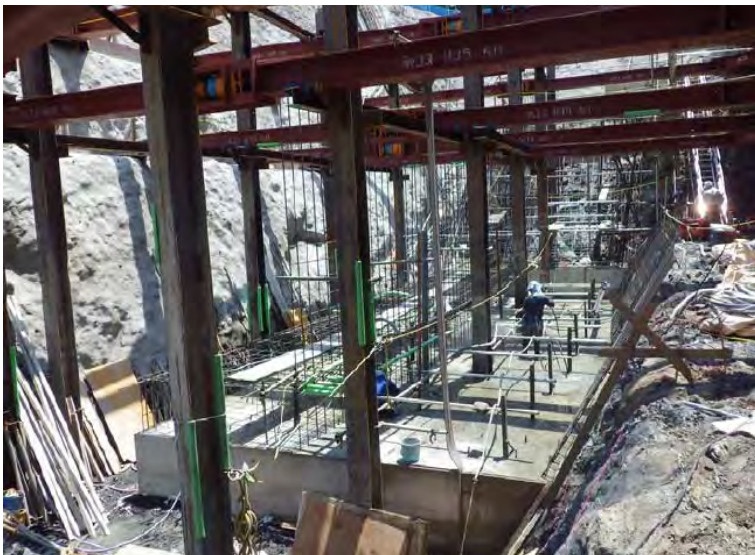

7月15日 鉄筋組立、コンクリート打設



7月22日 鉄筋組立、コンクリート打設

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【減勢工部】

7月 減勢工部の掘削、切梁、岩盤清掃、鉄筋組立、コンクリート打設



7月29日 鉄筋組立、コンクリート打設
