


吉野川水系吉野川、旧吉野川

R6. 3末時点

1)位置図

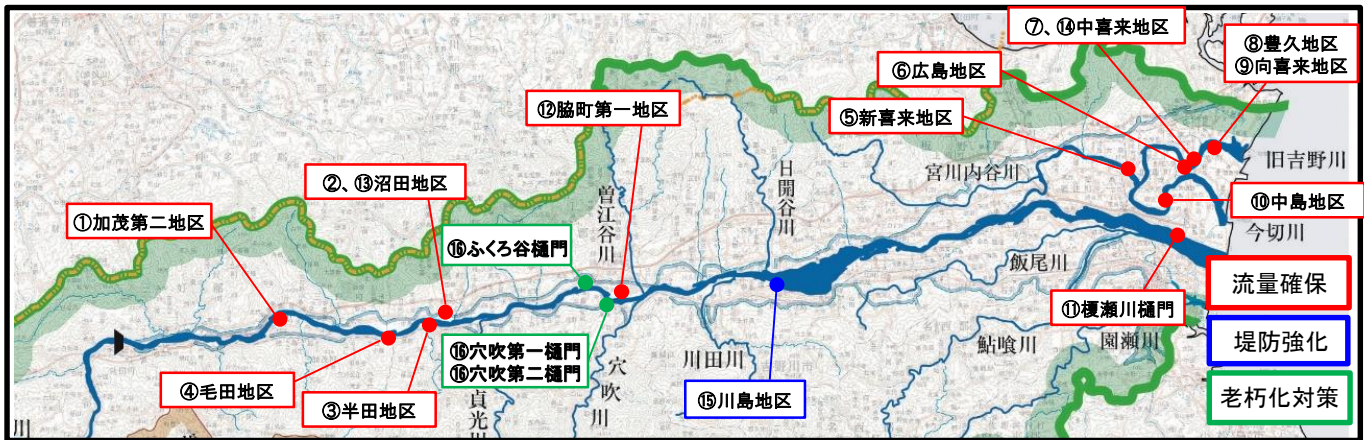

※現時点で事業着手している箇所を表示

2)事業目標及び状況

■流量確保(堤防整備、地震・津波対策、樋門新設・改築、河道掘削、樹木伐採)

①堤防整備

- ・対策必要箇所22箇所のうち、令和7年度までに14箇所着手(予定)
- ・3月末時点で7箇所着手し、現地調査、用地買収、築堤工事、樋門工事を実施中

②地震・津波対策

- ・対策必要箇所3箇所(豊久地区、向喜来地区、中島地区)で耐震対策工事を実施中
- ・令和3年12月末で中瀬地区、令和4年1月末で矢倉地区が工事完了

③樋門新設・改築(耐震)

- ・対策必要箇所5箇所のうち、令和7年度までに4箇所着手(予定)
- ・3月末時点で1箇所着手し、榎瀬川樋門では築堤、道路の付け替え工事を実施中

④河道掘削

- ・対策必要箇所10箇所のうち、令和7年度までに3箇所着手
- ・3月末時点で3箇所着手し、沼田地区で河道掘削工事を実施中
- ※掘削範囲の樹木伐採も含む

■堤防強化(堤防拡幅、漏水・侵食対策、粘り強い堤防策)

①漏水対策

- ・対策必要箇所2箇所(川島地区、西林地区)で漏水対策工事完了

②侵食対策

- ・対策必要箇所5箇所のうち、令和7年度までに1箇所着手
- ・3月末時点で1箇所着手済み

■老朽化対策

①無動力化

- ・新規実施箇所3樋門について、完成。
- (令和4年度新規箇所:穴吹第一樋門・穴吹第二樋門・ふくろ谷樋門)


3)各地区の進捗状況

| No. | 地区名 | 所在地 | 整備内容 | 事業進捗 |
|-----|--------|------------|---------|-----------------------------|
| ① | 加茂第二地区 | 東みよし町 | 堤防整備 | 工事実施中(事業延長約4.6kmのうち約70%進捗) |
| ② | 沼田地区 | 美馬市 | 堤防整備 | 工事実施中(事業延長約2.0kmのうち約73%進捗) |
| ③ | 半田地区 | つるぎ町 | 堤防整備 | 工事実施中 |
| ④ | 毛田地区 | つるぎ町、東みよし町 | 堤防整備 | 用地取得中 |
| ⑤ | 新喜来地区 | 北島町 | 堤防整備 | 工事実施中(事業延長約0.8kmのうち約95%進捗) |
| ⑥ | 広島地区 | 松茂町 | 堤防整備 | 工事実施中(事業延長約2.0kmのうち約29%進捗) |
| ⑦ | 中喜来地区 | 松茂町 | 堤防整備 | 工事実施中(事業延長約1.5kmのうち約14%進捗) |
| ⑧ | 豊久地区 | 鳴門市、松茂町 | 地震・津波対策 | 工事実施中 |
| ⑨ | 向喜来地区 | 鳴門市、松茂町 | 地震・津波対策 | 工事実施中 |
| ⑩ | 中島地区 | 徳島市 | 地震・津波対策 | 工事実施中 |
| ⑪ | 榎瀬川樋門 | 徳島市 | 樋門改築 | 工事実施中(約96%進捗) |
| ⑫ | 脇町第一地区 | 美馬市 | 河道掘削 | 工事実施中(全体掘削量約163千㎡のうち約52%進捗) |
| ⑬ | 沼田地区 | 美馬市 | 河道掘削 | 工事実施中(全体掘削量約728千㎡のうち約24%進捗) |
| ⑭ | 中喜来地区 | 松茂町 | 河道掘削 | 工事実施中(全体掘削量約46千㎡のうち約41%進捗) |
| ⑮ | 川島地区 | 吉野川市 | 侵食対策 | 工事実施中(事業延長約1.0kmのうち約27%進捗) |
| ⑯ | 樋門無動力化 | 三好市、美馬市 | 老朽化対策 | 工事完成 |

≫ 堤防が出来るまで



≫ 地震・津波対策が出来るまで



吉野川水系吉野川

R6. 3月末時点

4)各地区の施工状況

①加茂第二地区 施工状況



○実施内容

・用地買収、築堤、樋門工事を実施しています。

約70%の進捗

②沼田地区 施工状況



○実施内容

・築堤、樋門工事を実施しています。

約73%の進捗

③半田地区 施工状況



○実施内容

・用地買収、築堤、水路の工事を実施しています。

吉野川水系旧吉野川

R6. 3末時点

4)各地区の施工状況

⑤新喜来地区 施工状況

<着手前>



<R6.3末時点>



○実施内容

- ・築堤を実施しています。

⑥広島地区 施工状況

<着手前>



<R6.3月末時点>



○実施内容

- ・築堤、樋門工事を実施しています。

⑦中喜来地区 施工状況

<着手前>



<R4.2月末時点>





○実施内容

- ・築堤工事に着手しています。

吉野川水系旧吉野川

R6. 3末時点

4)各地区の施工状況

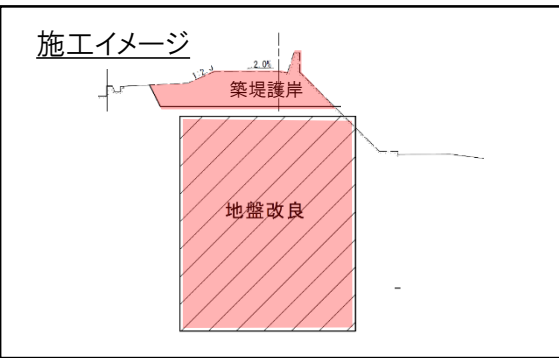

○実施内容

・耐震対策工事を実施しています。

⑨向喜来地区施工状況



⑩中島地区施工状況



吉野川水系吉野川

R6. 3月末時点

4)各地区の施工状況

①榎瀬川樋門 施工状況



○実施内容

・築堤、道路の付け替え工事を実施しています。

②脇町第一地区 施工状況



○実施内容

・河道掘削工事に着手しています。

③沼田地区 施工状況



○実施内容

・河道掘削工事を実施しています。

吉野川水系吉野川

R6. 3末時点

4)各地区の施工状況

⑩無動力化(穴吹第二樋門) 現地状況



○実施状況

・樋門の無動力化工事を実施しています。

⑪無動力化(穴吹第一樋門) 現地状況



○実施内容

・樋門の無動力化工事を実施しています。

⑫無動力化(ふくろ谷樋門) 現地状況



○実施内容

・樋門の無動力化工事を実施しています。
