

吉野川水系吉野川、旧吉野川

R7. 2月末時点

1)位置図



※現時点で事業着手している箇所を表示

2)事業目標及び状況

■流量確保(堤防整備、地震・津波対策、樋門新設・改築、河道掘削、樹木伐採)

①堤防整備

- ・対策必要箇所22箇所のうち、令和7年度までに12箇所着手(予定)
- ・2月末時点で7箇所着手し、現地調査、用地買収、築堤工事、樋門工事を実施中

②地震・津波対策

- ・対策必要箇所1箇所(中島地区)で耐震対策工事を実施中
- ・令和3年12月末で中瀬地区、令和4年1月末で矢倉地区が工事完了

③樋門新設・改築(耐震)

- ・対策必要箇所5箇所のうち、令和7年度までに4箇所着手(予定)
- ・2月末時点で1箇所着手し、榎瀬川樋門では築堤、道路の付け替え工事を実施中

④河道掘削

- ・対策必要箇所10箇所のうち、令和7年度までに3箇所着手
- ・2月末時点で3箇所着手し、沼田地区で河道掘削工事を実施中
- ※掘削範囲の樹木伐採も含む

■堤防強化(堤防拡幅、漏水・侵食対策、粘り強い堤防策)

①漏水対策

- ・対策必要箇所2箇所(川島地区、西林地区)で漏水対策工事完了

②侵食対策

- ・対策必要箇所5箇所のうち、令和7年度までに1箇所着手
- ・2月末時点で1箇所着手済み

■老朽化対策

①修繕

- ・実施箇所3箇所のうち、12月末時点で3箇所着手し、角ノ瀬排水機場、蛇池排水機場では分解整備を実施中。加賀須野地区では護岸修繕工事が2月末に完成しました。

吉野川水系吉野川、旧吉野川

R7. 2末時点


3)各地区の進捗状況

No.	地区名	所在地	整備内容	事業進捗
①	加茂第二地区	東みよし町	堤防整備	工事実施中(事業延長約4.6kmのうち約72%進捗)
②	沼田地区	美馬市	堤防整備	工事実施中(事業延長約2.0kmのうち約80%進捗)
③	半田地区	つるぎ町	堤防整備	工事実施中
④	毛田地区	つるぎ町、東みよし町	堤防整備	用地取得中
⑤	新喜来・勝瑞地区	鳴門市、北島町	堤防整備	関係機関協議中(事業延長約0.8kmのうち約95%進捗)
⑥	広島地区	松茂町	堤防整備	工事実施中(事業延長約2.0kmのうち約29%進捗)
⑦	中喜来地区	松茂町	堤防整備	工事実施中(事業延長約1.5kmのうち約14%進捗)
⑧	豊久地区	鳴門市、松茂町	地震・津波対策	工事実施中
⑨	向喜来地区	鳴門市、松茂町	地震・津波対策	工事実施中
⑩	中島地区	徳島市	地震・津波対策	工事実施中
⑪	榎瀬川樋門	徳島市	樋門改築	工事実施中(約96%進捗)
⑫	脇町第一地区	美馬市	河道掘削	工事実施中(全体掘削量約163千m ³ のうち約52%進捗)
⑬	沼田地区	美馬市	河道掘削	工事実施中(全体掘削量約728千m ³ のうち約24%進捗)
⑭	中喜来地区	松茂町	河道掘削	工事実施中(全体掘削量約46千m ³ のうち約43%進捗)
⑮	川島地区	吉野川市	侵食対策	工事実施中(事業延長約1.0kmのうち約27%進捗)
⑯	加賀須野地区	徳島市	老朽化対策	工事実施中

≫ 堤防が出来るまで



≫ 地震・津波対策が出来るまで



吉野川水系吉野川

R7. 2月末時点

4)各地区の施工状況

①加茂第二地区 施工状況



○実施内容

・用地買収、築堤、樋門工事を実施しています。

約72%の進捗

②沼田地区 施工状況



○実施内容

・築堤、樋門工事を実施しています。

約80%の進捗

③半田地区 施工状況



○実施内容

・用地買収、築堤、水路の工事を実施しています。

施工中

吉野川水系旧吉野川

R7. 2月末時点

4)各地区の施工状況

⑤新喜来・勝瑞地区 施工状況



○実施内容

・関係機関協議を実施しています。

約95%の進捗

⑥広島地区 施工状況




○実施内容

・築堤、樋門工事を実施しています。

約29%の進捗

⑦中喜来地区 施工状況

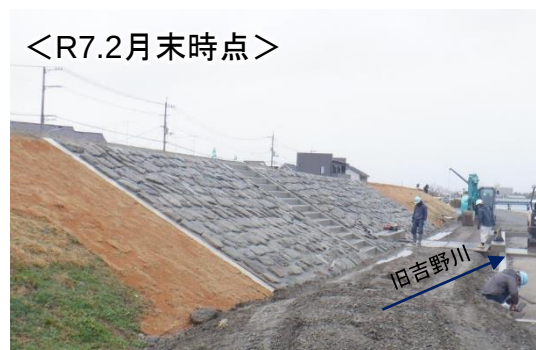

○実施内容

・築堤工事に着手しています。

約14%の進捗

防災・減災国土強靱化のための5か年加速化対策等の工事進捗状況


吉野川水系旧吉野川

R7. 2末時点

4)各地区の施工状況



施工イメージ

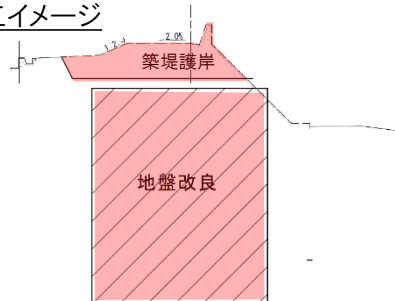

○実施内容

・耐震対策工事を実施しています。

⑨向喜来地区施工状況



＜R5.11末時点＞



⑩中島地区施工状況



＜R7.2末時点＞



吉野川水系吉野川

R7. 2月末時点

4)各地区の施工状況

⑪榎瀬川樋門 施工状況



○実施内容

・築堤、道路の付け替え工事を実施しています。

約96%の進捗

⑫脇町第一地区 施工状況



○実施内容

・河道掘削工事に着手しています。

約52%の進捗

⑬沼田地区 施工状況



○実施内容

・河道掘削工事を実施しています。

約24%の進捗

吉野川水系吉野川

R7. 2月末時点

4)各地区の施工状況

⑩加賀須野地区現地状況

＜着手前＞



＜加賀須野箇所＞

＜R7.2月末時点＞



＜着手前＞



＜大寺箇所＞

＜R7.2月末時点＞



＜着手前＞



＜乙瀬箇所＞

＜R7.2月末時点＞



○実施状況

・2月28日に工事完成しました。ご協力ありがとうございました。
