


防災・減災国土強靱化のための5か年加速化対策等の工事進捗状況

吉野川水系吉野川、旧吉野川

R7. 9末時点

1)位置図

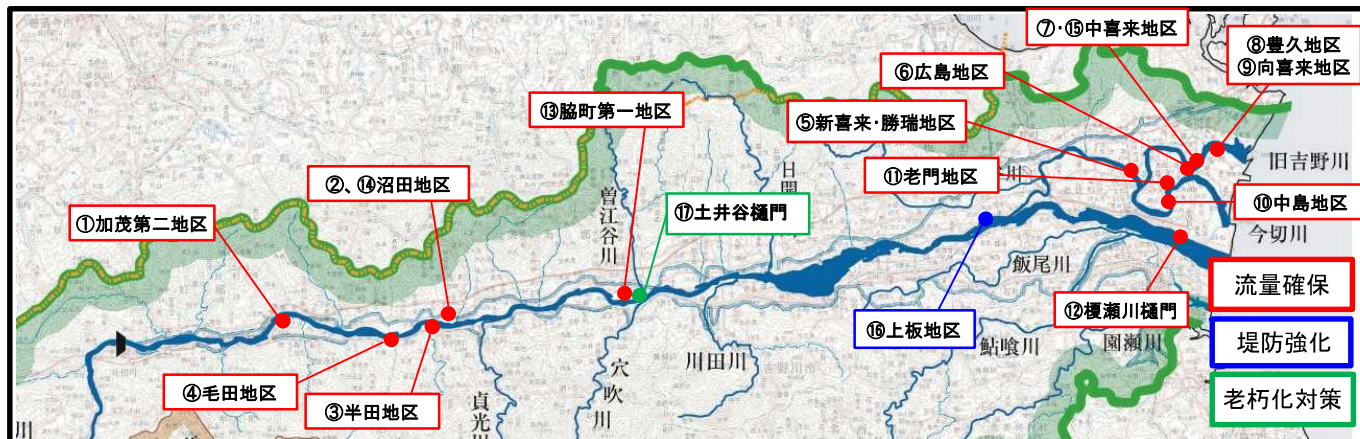

※現時点で事業着手している箇所を表示

2)事業目標及び状況

■流量確保(堤防整備、地震・津波対策、樋門新設・改築、河道掘削、樹木伐採)

①堤防整備

- ・対策必要箇所22箇所のうち、令和7年度までに9箇所着手
- ・9月末時点で9箇所着手し、現地調査、用地買収、築堤工事、樋門工事を実施中

②地震・津波対策

- ・旧吉野川、今切川の対策必要箇所のうち、向喜来地区、中島地区、老門地区で耐震対策工事を実施中

③樋門新設・改築(耐震)

- ・対策必要箇所5箇所のうち、令和7年度までに1箇所着手
- ・榎瀬川樋門は築堤が令和7年3月末に対策完了

④河道掘削

- ・対策必要箇所10箇所のうち、令和7年度までに4箇所着手
- ・9月末時点で4箇所着手し、沼田地区で河道掘削工事を実施中
- ※掘削範囲の樹木伐採も含む

■堤防強化(堤防拡幅、漏水・侵食対策、粘り強い堤防策)

①漏水対策

- ・対策必要箇所2箇所(川島地区、西林地区)で漏水対策工事完了

②侵食対策

- ・対策必要箇所5箇所のうち、令和7年度までに1箇所着手
- ・9月末時点で1箇所着手済み

■老朽化対策

①修繕

- ・実施箇所4箇所のうち、12月末時点で4箇所着手し、角ノ瀬排水機場では分解整備を実施中。土井谷樋門では閉鎖装置の更新を実施中。加賀須野地区では護岸修繕工事が令和7年2月末に完成しました。蛇池排水機場では分解整備が完了しました。

防災・減災国土強靱化のための5か年加速化対策等の工事進捗状況

吉野川水系吉野川、旧吉野川

R7. 9末時点

3)各地区の進捗状況

No.	地区名	所在地	整備内容	事業進捗
①	加茂第二地区	東みよし町	堤防整備	工事实施中(事業延長約4.6kmのうち約84%進捗)
②	沼田地区	美馬市	堤防整備	工事实施中(事業延長約2.0kmのうち約92%進捗)
③	半田地区	つるぎ町	堤防整備	工事实施中(全体盛土量85千m ³ のうち約47%進捗)
④	毛田地区	つるぎ町、東みよし町	堤防整備	工事实施中(全体盛土量60千m ³ のうち約5%進捗)
⑤	新喜来・勝瑞地区	鳴門市、北島町	堤防整備	関係機関協議中(事業延長約0.8kmのうち約95%進捗)
⑥	広島地区	松茂町	堤防整備	工事实施中(事業延長約2.0kmのうち約29%進捗)
⑦	中喜来地区	松茂町	堤防整備	工事实施中(事業延長約1.5kmのうち約22%進捗)
⑧	豊久地区	鳴門市、松茂町	地震・津波対策	工事实施中
⑨	向喜来地区	鳴門市、松茂町	地震・津波対策	工事实施中
⑩	中島地区	徳島市	地震・津波対策	工事实施中
⑪	老門地区	北島町	地震・津波対策	工事实施中
⑫	榎瀬川樋門	徳島市	樋門改築	工事完成
⑬	脇町第一地区	美馬市	河道掘削	工事实施中(全体掘削量約163千m ³ のうち約52%進捗)
⑭	沼田地区	美馬市	河道掘削	工事实施中(全体掘削量約728千m ³ のうち約32%進捗)
⑮	中喜来地区	松茂町	河道掘削	工事实施中(全体掘削量約46千m ³ のうち約43%進捗)
⑯	上板地区	上板町	侵食対策	工事準備中
⑰	樋門開閉装置更新	美馬市	老朽化対策	工事实施中

≫ 堤防が出来るまで

詳細
設計

現地
調査

用地
買収

工事

堤防
完成

≫ 地震・津波対策が出来るまで

仮設
設置

地盤
改良

築堤
護岸

仮設
撤去

堤防
完成

防災・減災国土強靱化のための5か年加速化対策等の工事進捗状況

吉野川水系吉野川

R7. 9月末時点

4)各地区の施工状況

①加茂第二地区 施工状況



○実施内容

- ・用地買収、築堤、樋門工事を実施しています。

約84%の進捗

②沼田地区 施工状況



○実施内容

- ・築堤、樋門工事を実施しています。

約92%の進捗

③半田地区 施工状況



○実施内容

- ・用地買収、築堤、水路の工事を実施しています。

約47%の進捗

防災・減災国土強靱化のための5か年加速化対策等の工事進捗状況

吉野川水系旧吉野川

R7. 9月末時点

4)各地区の施工状況

⑤新喜来・勝瑞地区 施工状況



○実施内容

- ・関係機関協議を実施しています。

約95%の進捗

⑥広島地区 施工状況



○実施内容

- ・築堤、樋門工事を実施しています。

約29%の進捗

⑦中喜来地区 施工状況



○実施内容

- ・築堤工事に着手しています。

約22%の進捗

防災・減災国土強靱化のための5か年加速化対策等の工事進捗状況

吉野川水系旧吉野川

R7. 9月末時点

4)各地区の施工状況

⑧豊久地区施工状況



○実施内容

- ・耐震対策工事を実施しています。

⑨向喜来地区施工状況



○実施内容

- ・耐震対策工事を実施しています。

⑩中島地区施工状況



○実施内容

- ・耐震対策工事を実施しています。

防災・減災国土強靱化のための5か年加速化対策等の工事進捗状況

吉野川水系旧吉野川

R7. 9月末時点

4)各地区の施工状況

①老門地区 施工状況



○実施内容

- ・耐震対策工事を実施しています。

防災・減災国土強靱化のための5か年加速化対策等の工事進捗状況

吉野川水系吉野川

R7. 9月末時点

4)各地区の施工状況

⑬脇町第一地区 施工状況



○実施内容

- ・河道掘削工事に着手しています。

約52%の進捗

⑭沼田地区 施工状況



○実施内容

- ・河道掘削工事を実施しています。

約32%の進捗

⑮上板地区 施工状況



○実施状況

- ・侵食対策工事の実施しています。

防災・減災国土強靱化のための5か年加速化対策等の工事進捗状況

吉野川水系吉野川

R7. 9末時点

4)各地区の施工状況

⑩土井谷樋門現地状況



○実施状況

- ・令和7年3月に契約し、機器更新に向けて製造中
