

だんだん通信 Vol.2

みぎやん (許諾番号209059)

津島道路沿線地域の皆様のご協力により津島道路建設(延長10.3km)を進めております。津島道路の整備効果として下記事項を目指しています。

- ①現在、幹線道路として国道56号しかなく災害発生時には代替道路となります。
- ②現国道56号の線形不良に対し、急カーブ・急こう配が解消され、走行性・安全性が優れます。
- ③愛南町と松山方面の地域交流の活性化が促進されます。

工事状況報告

— 令和2年度 津島道路上畑地区工事用道路工事 —
(株)浅田組 工期：R2.7.4～R3.3.31

当工事は、津島道路の一部で津島町上畑地区における工事用道路の工事となります。山の掘削と盛土が主な工事となります。10月初旬より掘削・盛土作業を開始いたしました。山の掘削作業はICT機械により3次元データを活用し掘削を行っています。近隣の皆様には日頃よりご迷惑をお掛けしております。工事としては、まだ始まったばかりですが早期完了に向け進めてまいりますので、何卒、ご理解ご協力をお願いいたします。

現場代理人：宮本 亮



ICTバックボウによる掘削状況



周辺の観光情報 南楽園

総面積15.3ヘクタールの庭園は上池・下池2つの池を中心に現代造園技術の粋を集めて築いた四国最大規模の日本庭園です。30,000株の花菖蒲や梅・桜・つつじ等四季折々の花ごよみも自慢の風情です。



宇和島市津島町近家甲1813
TEL.0895-32-3344
<http://www.nanreku.jp/site/nanrakuen/>

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 四国地方整備局 大洲河川国道事務所
〒795-8512 大洲市中村210 TEL.0893-24-5185


大洲河川国道事務所ホームページは
大洲国道 で検索出来ます。

大洲河川国道事務所
公式Twitter @mlit_oozu

津島道路 工事の進捗状況

発行日：令和2年10月31日
発行：津島道路安全協議会
編集・監修：国土交通省大洲河川国道事務所

工事名	受注者	工期	備考	工事名	受注者	工期	備考
1 令和元年度 津島道路柏改良第1工事	西南建設(株)	R1. 7.31 R2. 9.30	完了	6 令和元-2年度 津島道路柏改良第3工事	(株)小島組	R2. 3.17 R3. 2.26	
2 令和元年度 津島道路柏改良第2工事	亀岡建設(株)	R1. 8. 3 R2. 6.30	完了	7 令和2年度 津島道路柏改良第1工事	西南建設(株)	R2. 5.21 R3. 2.26	
3 令和元年度 津島道路上畑地区改良工事	(株)浅田組	R1.10. 1 R2. 9.30	完了	8 令和2年度 津島道路柏改良第2工事	一若建設(株)	R2. 5.23 R3. 2.26	
4 令和元-2年度 津島道路柏地区工事用道路工事	(株)藤堂組	R1.12.28 R3. 3.31		9 令和2年度 津島道路柏改良第3工事	(株)明正建設	R2. 7. 7 R3. 3.31	
5 令和元-2年度 津島道路津島南ICランプトンネル工事	戸田建設(株)	R2. 3. 3 R3. 2.26		10 令和2年度 津島道路上畑地区工事用道路工事	(株)浅田組	R2. 7. 4 R3. 3.31	

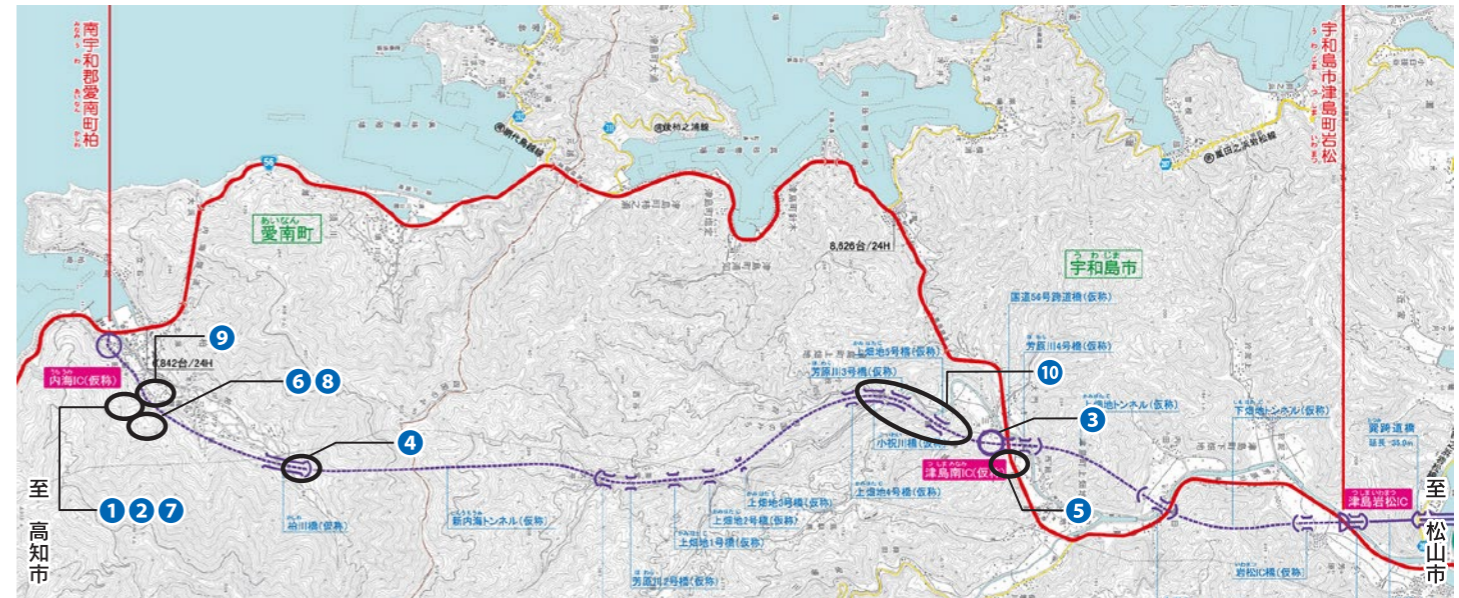

3 (株)浅田組




当工事は、近隣住民の御協力により無事R2.9月末に完了しました。工事中は、御理解、御協力を頂きまして有難うございました。

4 (株)藤堂組



R2.4月より工事用道路を施工し、R3.3月末に完成予定です。

5 戸田建設(株)

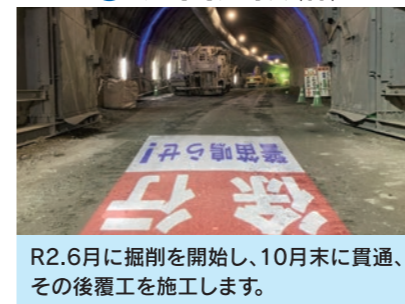

R2.6月に掘削を開始し、10月末に貫通、その後覆工を施工します。

6 (株)小島組



R2.8月中旬より鍛冶邸川の仮設水路を設置し、現場打函渠工・流路工により鍛冶邸川の付け替え工事を行っています。

7 西南建設(株)



現場打函渠工 7基のうち、2基を現在施工中です。

8 一若建設(株)



現場打函渠工5ブロック中、2ブロックが完成し引き続き施工中です。

9 (株)明正建設



R2.11月より河川内の工事を実施しR3.7月に竣工予定です。

10 (株)浅田組



R2.10月より掘削と盛土工事を開始しました。
