

様式－1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道11号 新居浜バイパス
事業主体	四国地方整備局

【費用対効果分析等に係る項目は、平成23年度評価時点】

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比(3便益)(B/C)=1.4 (経済的純現在価値(B-C)=233億円、経済的内部收益率(EIRR)=5.7%) 残事業：費用便益比(3便益)(B/C)=2.7 (経済的純現在価値(B-C)=368億円、経済的内部收益率(EIRR)=13.2%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑なモビリティの確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 現道等の年間時間損失及び削減率</li> <li>■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される</li> <li>□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される</li> <li>■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する</li> <li>■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる</li> <li>■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる</li> </ul>	時間損失削減量：139 万人時間/年 損失削減率91.4%	
		並行区間の混雑時旅行速度 13.8km/h⇒25.0km/h	
			せとうちバスが運行しており、所要時間が短縮（定時性が向上）する見込み
			大生院地区～JR 新居浜駅 29 分⇒11 分 舟木地区～JR 新居浜駅 24 分⇒9 分
			新居浜市役所～松山空港 84 分⇒67 分
物流効率化の支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる</li> <li>□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上が見込まれる</li> </ul>	いよ西条IC～新居浜港 37 分⇒19 分 新居浜IC～新居浜港 28 分⇒16 分	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する</li> </ul>		

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km <sup>2</sup> 以下である市街地内での事業である	
		<input checked="" type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	DID 地区内で行う事業
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	住宅宅地開発（東田総合開発）（28.1ha）
国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り		
	<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり		
	<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	新居浜西条地方生活圏～今治地方生活圏 新居浜西条地方生活圏～松山地方生活圏	
	<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する		
	<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	新居浜市役所～西条市役所 44 分⇒26 分 新居浜市役所～四国中央市役所 115 分⇒110 分	
個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的の発展が阻害されている地区を解消する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	新居浜太鼓まつり	
	<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	いよ西条IC～広瀬歴史記念館 23 分⇒9 分 新居浜IC～マイントビア別子 27 分⇒17 分	
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である		
2. むらし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	

		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	いよ西条IC～東予救命救急センター 18 分⇒6 分 新居浜市役所～東予救命救急センター 13 分⇒10 分
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる  <input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する  対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	愛媛県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に指定
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	松山自動車道、国道11号現道、等
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2 排出削減量：8千t-CO2/年 CO2 排出削減率：2.0%
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	NO2 排出削減量：73.4t-NOX/年 NO2 排出削減率：75%
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	SPM 排出削減量：6.9t-SPM/年 SPM 排出削減率：74%
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	夜間要請限度の超過区間が改善
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	バイパスへの交通転換により、現道区間における交通安全性の向上が期待

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B P・その他の別
一般国道11号	新居浜バイパス	L = 9.3 km	二次改築	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
17,300～29,500	4	四国地方整備局

上記の計画交通量は、現況＋事業化済み箇所を考慮したネットワークによるもの。

### ① 費用

	事 業 費	維持管理費	合 計
基 準 年	平成23年度		
単純合計	581億円	61億円	642億円
うち残事業分	279億円	49億円	328億円
基準年における現在価値(C)	576億円	27億円	603億円
うち残事業分	202億円	17億円	218億円

### ② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成23年度			
供 用 年	平成17年度(暫定)、平成20年度(暫定)、平成24年度(暫定) 平成30年度(暫定)、平成31年度(暫定)、平成42年度			
単年便益 (初年便益)	9.0億円	0.55億円	0.06億円	9.7億円
基準年における現在価値(B)	762億円	58億円	16億円	837億円
うち残事業分	521億円	52億円	14億円	587億円

### ③ 結 果

費用便益比（事業全体）	1.4
経済的純現在価値（事業全体）	233億円
経済的内部收益率（事業全体）	5.7%
費用便益比（残事業）	2.7
経済的純現在価値（残事業）	368億円
経済的内部收益率（残事業）	13.2%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

### ④ 感 度 分 析（残事業を対象）

#### 【事業全体】

	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	17,300～29,500 台/日	±10%	1.3～1.5
事業費	279億円	±10%	1.3～1.4
事業期間	17年	±10%	1.3～1.5

#### 【残事業】

	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	17,300～29,500 台/日	±10%	2.4～3.1
事業費	279億円	±10%	2.5～3.1
事業期間	17年	±10%	2.5～2.9

## 交通状況の変化

【事業全体】

様式－3①

## 事業名：新居浜バイパス

(推計時点 H 4 2 年)

			整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 新居浜バイパス : 9.3km	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]	3,258	22,829
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]	4	12
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]	11.80	51.19
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	国道11号 : 7.0km	交通量	16,449	4,937
		走行時間	19	12
		走行時間費用	57.90	9.69
	(主)壬生川新居浜野田線 : 9.3km	交通量	20,194	17,073
		走行時間	17	17
		走行時間費用	64.55	52.50
	(一)新居浜港線 : 0.5km	交通量	7,238	0
		走行時間	1	1
		走行時間費用	1.11	0.00
松山自動車道 市道 : 8.8km	交通量	[台/日]	17,293	16,708
		[分]	7	7
		走行時間費用	20.93	20.25
	交通量	[台/日]	2,189	0
		[分]	28	18
		走行時間費用	10.86	0.00
③その他道路合計 : 447.4km		走行時間費用	748.37	737.36

		走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 489.9km	走行時間短縮便益 [億円/年]	915.52	870.99	44.53

※1：当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2：配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5：②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面 (①、②に該当する道路を明示すること)

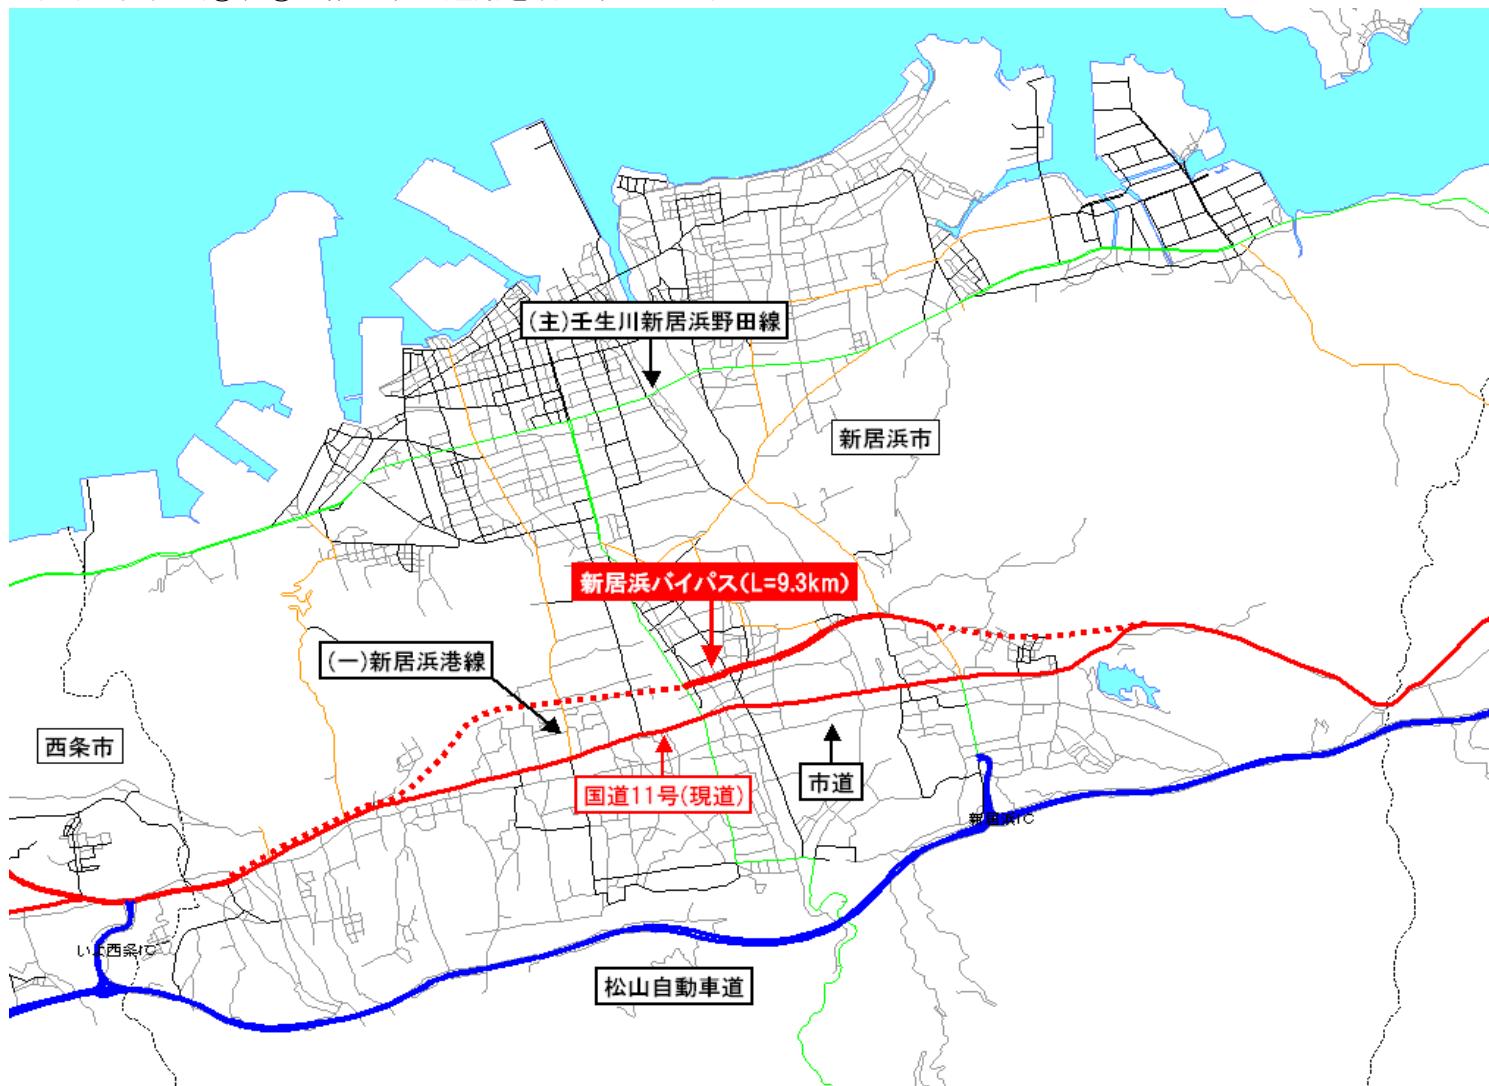

## 交通状況の変化

【残事業】

様式－3①

## 事業名：新居浜バイパス

(推計時点 H 4 2 年)

			整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 新居浜バイパス : 9.3km	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]	6,259	22,829
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]	7	12
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]	18.06	51.19
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	国道11号 : 7.0km	交通量	[台/日]	15,531
		走行時間	[分]	18
		走行時間費用	[億円/年]	52.52
	(主)壬生川新居浜野田線 : 9.3km	交通量	[台/日]	19,365
		走行時間	[分]	17
		走行時間費用	[億円/年]	61.14
	(一)新居浜港線 : 0.5km	交通量	[台/日]	7,108
		走行時間	[分]	1
		走行時間費用	[億円/年]	1.10
③その他道路合計 : 447.4km	松山自動車道 : 8.8km	交通量	[台/日]	17,660
		走行時間	[分]	7
		走行時間費用	[億円/年]	21.34
	市道 : 7.7km	交通量	[台/日]	1,441
		走行時間	[分]	27
		走行時間費用	[億円/年]	7.91
走行時間費用		[億円/年]	747.33	737.36

		走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 489.9km	走行時間短縮便益 [億円/年]	909.40	870.99	38.41

※1：当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2：配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5：②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面 (①、②に該当する道路を明示すること)

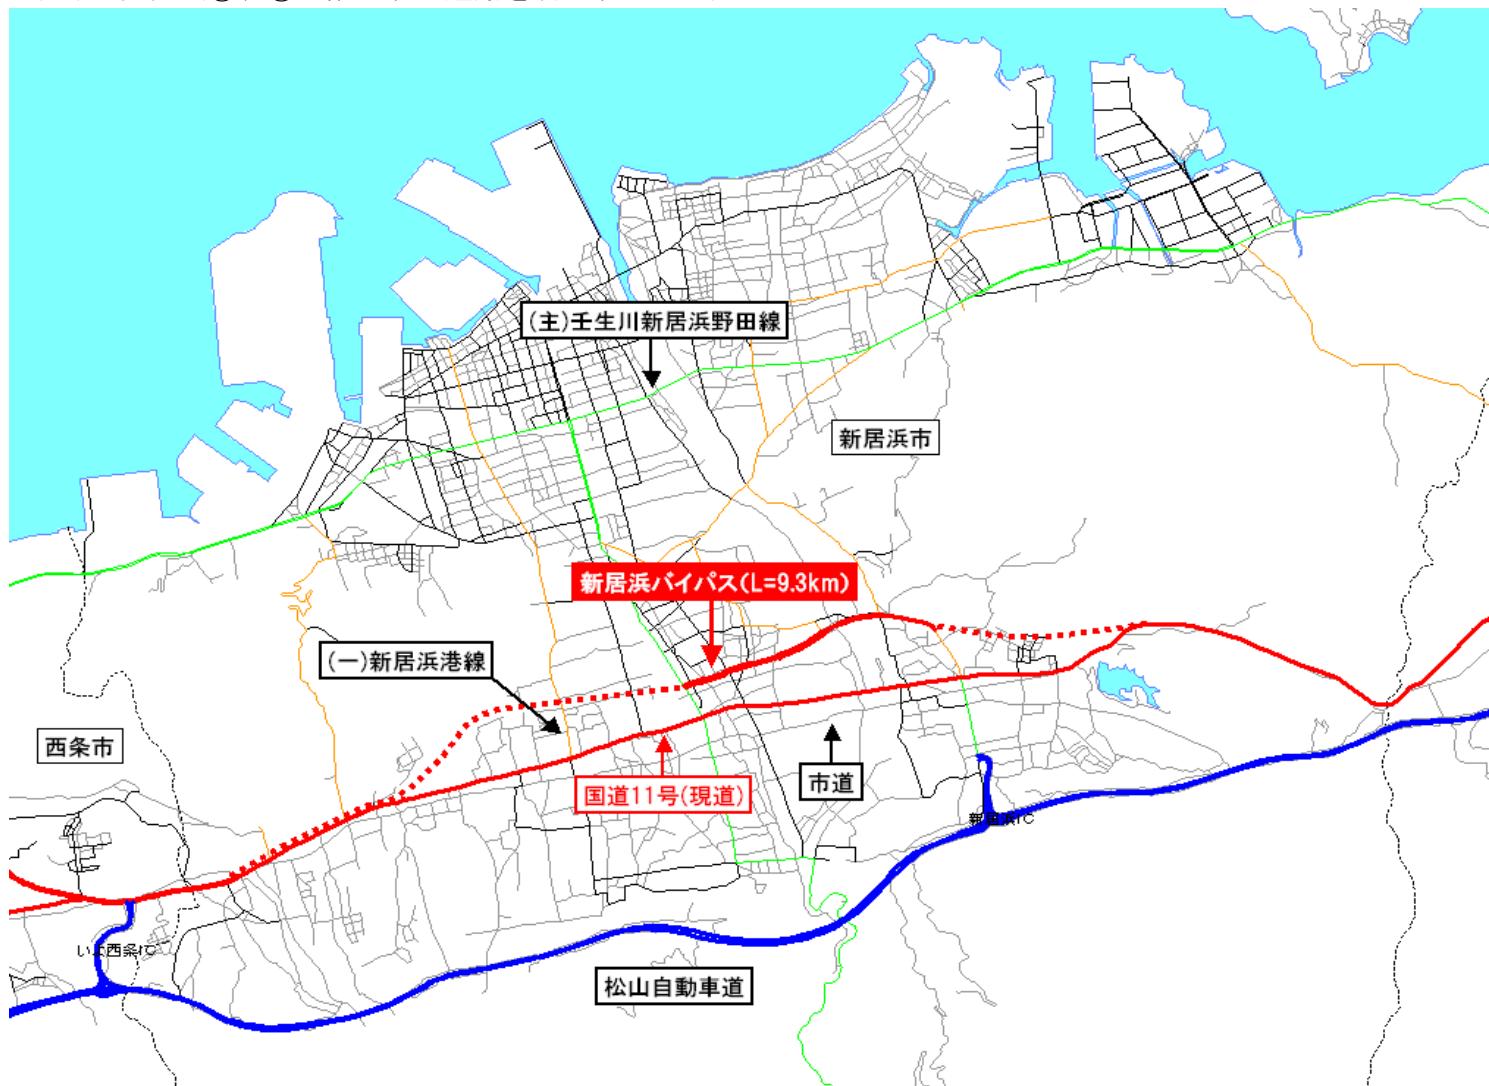

## 費用便益分析の条件

事業名：新居浜バイパス

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成23年度
交通流の推計	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	いずれかのみの推計の場合	いずれかのみの推計とした理由を記載
	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他( )	<input type="checkbox"/>
	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数)
		考慮した理由を記載
	その他( )	<input type="checkbox"/>
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由	小規模事業である
		山間部海岸部で併行道路が少ない
		その他( )
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
	その他( )	<input type="checkbox"/>
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載 対象路線における実際の交通状況(速度)が概ね反映されている。	
	最終配分の速度 採用理由を記載	
	その他( )	<input type="checkbox"/>

事業名：新居浜バイパス

(3)

項目		チェック欄
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない <input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する <input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ 面的に考慮 <input type="checkbox"/>
		対象路線のみ考慮 <input type="checkbox"/>
		採用した休日係数 ( ) % 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載
	災害等による通行止めの影響	考慮しない <input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する <input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ 採用した通行止め日数 ( ) 日 採用した通行止め日数の考え方を記載
		とり止め交通を考慮する <input type="checkbox"/> とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載
		考慮しない <input checked="" type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮する <input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ 採用した冬期日数 ( ) 日 採用した冬期日数の考え方を記載
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載
		考慮しない <input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する <input type="checkbox"/>
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定 <input checked="" type="checkbox"/>
		その他 ( ) <input type="checkbox"/>
		費用便益分析マニュアルの値を使用 <input checked="" type="checkbox"/>
	車種別時間価値原単位	独自に設定した値を使用 <input checked="" type="checkbox"/>
		算出根拠を添付すること
		費用便益分析マニュアルの値を使用 <input checked="" type="checkbox"/>
	車種別走行経費原単位	独自に設定した値を使用 <input type="checkbox"/>
		算出根拠を添付すること
		費用便益分析マニュアルの値を使用 <input checked="" type="checkbox"/>
	交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮 <input checked="" type="checkbox"/>
		中央分離帯の有無を考慮しない <input type="checkbox"/>
	走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない <input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する <input type="checkbox"/>
		(考慮の場合、算出根拠を添付すること)
その他		

事業名：新居浜バイパス

(4)

項目		チェック欄
費用の算定	事業費	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 松山河川国道事務所の実績値より設定
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である
		考慮しない 考慮する
	当該道路整備が行われない場合の費用	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ
	その他	
4. その他		

# 費用の現在価値算定表

【事業全体】

箇所名：新居浜バイパス

維持管理費の単純単価の算出

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.18	9.3	1.67

年次	年度	割戻率 (基準年:H23)	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-18年目	S 62	2.5633	94.4	0.28	0.68		
-17年目	S 63	2.4647	94.9	0.30	0.70		
-16年目	H 1	2.3699	97.4	0.83	1.83		
-15年目	H 2	2.2788	99.6	12.57	25.89		
-14年目	H 3	2.1911	102.0	4.76	9.20		
-13年目	H 4	2.1068	103.4	3.01	5.52		
-12年目	H 5	2.0258	103.7	1.82	3.19		
-11年目	H 6	1.9479	103.6	2.53	4.29		
-10年目	H 7	1.8730	103.0	5.83	9.53		
-9年目	H 8	1.8009	102.4	6.78	10.73		
-8年目	H 9	1.7317	103.4	7.41	11.17		
-7年目	H 10	1.6651	102.8	4.43	6.46		
-6年目	H 11	1.6010	101.3	6.04	8.59		
-5年目	H 12	1.5395	99.7	8.57	11.91		
-4年目	H 13	1.4802	98.4	20.00	27.08		
-3年目	H 14	1.4233	96.6	34.38	45.59		
-2年目	H 15	1.3686	95.4	26.19	33.82		
-1年目	H 16	1.3159	94.4	27.02	33.90		
供用開始年次	H 17	1.2653	93.2	13.83	16.90	0.34	0.42
1年目	H 18	1.2167	92.5	12.29	14.54	0.34	0.40
2年目	H 19	1.1699	91.7	21.32	24.48	0.34	0.39
3年目	H 20	1.1249	91.2	23.76	26.38	0.43	0.48
4年目	H 21	1.0816	90.0	28.48	30.80	0.43	0.47
5年目	H 22	1.0400	90.0	14.02	14.58	0.43	0.45
6年目	H 23	1.0000	90.0	15.23	15.23	0.43	0.43
7年目	H 24	0.9615	90.0	19.75	18.99	0.67	0.64
8年目	H 25	0.9246	90.0	27.11	25.07	0.67	0.62
9年目	H 26	0.8890	90.0	39.52	35.14	0.67	0.60
10年目	H 27	0.8548	90.0	30.10	25.73	0.67	0.57
11年目	H 28	0.8219	90.0	21.37	17.57	0.67	0.55
12年目	H 29	0.7903	90.0	13.27	10.48	0.67	0.53
13年目	H 30	0.7599	90.0	11.22	8.53	0.93	0.71
14年目	H 31	0.7307	90.0	7.85	5.73	1.05	0.77
15年目	H 32	0.7026	90.0	5.24	3.68	1.05	0.74
16年目	H 33	0.6756	90.0	7.73	5.22	1.05	0.71
17年目	H 34	0.6496	90.0	5.41	3.51	1.05	0.68
18年目	H 35	0.6246	90.0	4.56	2.85	1.05	0.66
19年目	H 36	0.6006	90.0	14.38	8.64	1.05	0.63
20年目	H 37	0.5775	90.0	14.27	8.24	1.05	0.61
21年目	H 38	0.5553	90.0	14.32	7.95	1.05	0.58
22年目	H 39	0.5339	90.0	14.40	7.69	1.05	0.56
23年目	H 40	0.5134	90.0	14.35	7.37	1.05	0.54
24年目	H 41	0.4936	90.0	14.22	7.02	1.05	0.52
25年目	H 42	0.4746	90.0			1.67	0.79
26年目	H 43	0.4564	90.0			1.67	0.76
27年目	H 44	0.4388	90.0			1.67	0.73
28年目	H 45	0.4220	90.0			1.67	0.70
29年目	H 46	0.4057	90.0			1.67	0.68
30年目	H 47	0.3901	90.0			1.67	0.65
31年目	H 48	0.3751	90.0			1.67	0.63
32年目	H 49	0.3607	90.0			1.67	0.60
33年目	H 50	0.3468	90.0			1.67	0.58
34年目	H 51	0.3335	90.0			1.67	0.56
35年目	H 52	0.3207	90.0			1.67	0.54
36年目	H 53	0.3083	90.0			1.67	0.51
37年目	H 54	0.2965	90.0			1.67	0.50
38年目	H 55	0.2851	90.0			1.67	0.48
39年目	H 56	0.2741	90.0			1.67	0.46
40年目	H 57	0.2636	90.0			1.67	0.44
41年目	H 58	0.2534	90.0			1.67	0.42
42年目	H 59	0.2437	90.0			1.67	0.41
43年目	H 60	0.2343	90.0			1.67	0.39
44年目	H 61	0.2253	90.0			1.67	0.38
45年目	H 62	0.2166	90.0			1.67	0.36
46年目	H 63	0.2083	90.0			1.67	0.35
47年目	H 64	0.2003	90.0			1.67	0.33
48年目	H 65	0.1926	90.0			1.67	0.32
49年目	H 66	0.1852	90.0	-143.14	-26.50	1.67	0.31
合計				437.61	575.90	60.99	27.14
単純事業費計				580.75		60.99	

注1)事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

# 費用の現在価値算定表

【残事業】

箇所名：新居浜バイパス

維持管理費の単純単価の算出

年次	年度	割戻率 (基準年:H23)	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
供用開始年次	H 24	0.9615	90.0	19.75	18.99	0.25	0.24
1年目	H 25	0.9246	90.0	27.11	25.07	0.25	0.23
2年目	H 26	0.8890	90.0	39.52	35.14	0.25	0.22
3年目	H 27	0.8548	90.0	30.10	25.73	0.25	0.21
4年目	H 28	0.8219	90.0	21.37	17.57	0.25	0.21
5年目	H 29	0.7903	90.0	13.27	10.48	0.25	0.20
6年目	H 30	0.7599	90.0	11.22	8.53	0.48	0.36
7年目	H 31	0.7307	90.0	7.85	5.73	0.64	0.47
8年目	H 32	0.7026	90.0	5.24	3.68	0.64	0.45
9年目	H 33	0.6756	90.0	7.73	5.22	0.64	0.43
10年目	H 34	0.6496	90.0	5.41	3.51	0.64	0.42
11年目	H 35	0.6246	90.0	4.56	2.85	0.64	0.40
12年目	H 36	0.6006	90.0	14.38	8.64	0.64	0.38
13年目	H 37	0.5775	90.0	14.27	8.24	0.64	0.37
14年目	H 38	0.5553	90.0	14.32	7.95	0.64	0.36
15年目	H 39	0.5339	90.0	14.40	7.69	0.64	0.34
16年目	H 40	0.5134	90.0	14.35	7.37	0.64	0.33
17年目	H 41	0.4936	90.0	14.22	7.02	0.64	0.32
18年目	H 42	0.4746	90.0			1.24	0.59
19年目	H 43	0.4564	90.0			1.24	0.57
20年目	H 44	0.4388	90.0			1.24	0.54
21年目	H 45	0.4220	90.0			1.24	0.52
22年目	H 46	0.4057	90.0			1.24	0.50
23年目	H 47	0.3901	90.0			1.24	0.48
24年目	H 48	0.3751	90.0			1.24	0.47
25年目	H 49	0.3607	90.0			1.24	0.45
26年目	H 50	0.3468	90.0			1.24	0.43
27年目	H 51	0.3335	90.0			1.24	0.41
28年目	H 52	0.3207	90.0			1.24	0.40
29年目	H 53	0.3083	90.0			1.24	0.38
30年目	H 54	0.2965	90.0			1.24	0.37
31年目	H 55	0.2851	90.0			1.24	0.35
32年目	H 56	0.2741	90.0			1.24	0.34
33年目	H 57	0.2636	90.0			1.24	0.33
34年目	H 58	0.2534	90.0			1.24	0.31
35年目	H 59	0.2437	90.0			1.24	0.30
36年目	H 60	0.2343	90.0			1.24	0.29
37年目	H 61	0.2253	90.0			1.24	0.28
38年目	H 62	0.2166	90.0			1.24	0.27
39年目	H 63	0.2083	90.0			1.24	0.26
40年目	H 64	0.2003	90.0			1.24	0.25
41年目	H 65	0.1926	90.0			1.24	0.24
42年目	H 66	0.1852	90.0			1.24	0.23
43年目	H 67	0.1780	90.0			1.24	0.22
44年目	H 68	0.1712	90.0			1.24	0.21
45年目	H 69	0.1646	90.0			1.24	0.20
46年目	H 70	0.1583	90.0			1.24	0.20
47年目	H 71	0.1522	90.0			1.24	0.19
48年目	H 72	0.1463	90.0			1.24	0.18
49年目	H 73	0.1407	90.0	-55.52	-7.81	1.24	0.17
合計				223.56	201.60	48.70	16.87
単純事業費計				279.09		48.70	

注1)事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 便益の現在価値算定表

【事業全体】

箇所名：新居浜バイパス

年次	年度	総走行台数の年次別伸び率 (四国ブロック)				割戻率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益 (億円/年)					走行費用減少便益 (億円/年)					事故減少便益 (億円/年)		合計 (億円/年)			
								乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率%	合計 (億円/年)	現在価値 割引率%	
		基準年 H 23	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車	(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率%	合計 (億円/年)	現在価値 割引率%
供用開始年次	H 17	1.01358	0.96621	1.02052	1.00085	1.2653	93.2	6.56	1.63	0.85	9.04	11.05	0.29	0.08	0.18	0.55	0.67	0.06	0.07	9.65	11.79	9.65	11.79
1年目	H 18	0.99410	0.99015	0.99503	0.99323	1.2167	92.5	6.52	1.61	0.85	8.98	10.63	0.29	0.08	0.18	0.55	0.65	0.06	0.07	9.59	11.35	9.59	11.35
2年目	H 19	0.99407	0.99005	0.99501	0.99318	1.1699	91.7	6.48	1.60	0.84	8.92	10.24	0.29	0.08	0.18	0.54	0.62	0.06	0.07	9.52	10.94	9.52	10.94
3年目	H 20	0.99403	0.98995	0.99498	0.99314	1.1249	91.2	9.21	2.31	1.28	12.80	14.21	0.29	0.02	0.17	0.48	0.53	0.04	0.04	13.33	14.79	13.33	14.79
4年目	H 21	0.99399	0.98985	0.99496	0.99309	1.0816	90.0	9.16	2.29	1.27	12.72	13.76	0.29	0.02	0.17	0.48	0.52	0.04	0.04	13.24	14.32	13.24	14.32
5年目	H 22	0.99396	0.98975	0.99493	0.99304	1.0400	90.0	9.10	2.26	1.27	12.63	13.14	0.29	0.02	0.17	0.48	0.49	0.04	0.04	13.15	13.67	13.15	13.67
6年目	H 23	0.99392	0.98964	0.99491	0.99299	1.0000	90.0	9.05	2.24	1.26	12.55	12.55	0.29	0.02	0.16	0.47	0.47	0.04	0.04	13.06	13.06	13.06	13.06
7年目	H 24	0.99388	0.98953	0.99488	0.99294	0.9615	90.0	12.54	3.12	1.53	17.18	16.52	0.74	0.12	0.11	0.97	0.93	0.10	0.10	18.25	17.55	18.25	17.55
8年目	H 25	0.99385	0.98942	0.99485	0.99289	0.9246	90.0	12.46	3.09	1.52	17.07	15.78	0.73	0.12	0.11	0.96	0.89	0.10	0.10	18.13	16.76	18.13	16.76
9年目	H 26	0.99381	0.98931	0.99483	0.99284	0.8890	90.0	12.39	3.05	1.51	16.95	15.07	0.73	0.12	0.11	0.95	0.85	0.10	0.09	18.00	16.01	18.00	16.01
10年目	H 27	0.99377	0.98919	0.99480	0.99279	0.8548	90.0	12.31	3.02	1.50	16.83	14.39	0.72	0.12	0.10	0.95	0.81	0.10	0.09	17.88	15.28	17.88	15.28
11年目	H 28	0.99373	0.98908	0.99477	0.99274	0.8219	90.0	12.23	2.99	1.49	16.71	13.74	0.72	0.12	0.10	0.94	0.77	0.10	0.08	17.75	14.59	17.75	14.59
12年目	H 29	0.99369	0.98896	0.99475	0.99269	0.7903	90.0	12.15	2.95	1.49	16.59	13.11	0.72	0.11	0.10	0.93	0.74	0.10	0.08	17.63	13.93	17.63	13.93
13年目	H 30	0.99365	0.98883	0.99472	0.99263	0.7599	90.0	23.68	6.07	5.91	35.66	27.10	1.95	0.44	0.72	3.11	2.36	0.78	0.59	39.55	30.05	39.55	30.05
14年目	H 31	0.99361	0.98871	0.99469	0.99258	0.7307	90.0	23.93	6.16	6.82	36.91	26.97	1.78	0.44	0.69	2.91	2.13	0.94	0.69	40.76	29.79	40.76	29.79
15年目	H 32	0.99357	0.98858	0.99466	0.99252	0.7026	90.0	23.78	6.09	6.78	36.65	25.75	1.77	0.43	0.69	2.89	2.03	0.94	0.66	40.48	28.44	40.48	28.44
16年目	H 33	0.99514	0.98954	0.99856	0.99416	0.6756	90.0	23.66	6.03	6.77	36.46	24.63	1.76	0.43	0.69	2.88	1.95	0.93	0.63	40.27	27.21	40.27	27.21
17年目	H 34	0.99512	0.98942	0.99856	0.99412	0.6496	90.0	23.54	5.97	6.76	36.27	23.56	1.75	0.43	0.69	2.87	1.86	0.92	0.60	40.06	26.02	40.06	26.02
18年目	H 35	0.99509	0.98931	0.99856	0.99409	0.6246	90.0	23.42	5.91	6.75	36.08	22.54	1.74	0.43	0.69	2.86	1.79	0.91	0.57	39.85	24.89	39.85	24.89
19年目	H 36	0.99507	0.98920	0.99856	0.99406	0.6006	90.0	23.30	5.85	6.74	35.89	21.56	1.73	0.43	0.69	2.85	1.71	0.90	0.54	39.64	23.81	39.64	23.81
20年目	H 37	0.99505	0.98908	0.99856	0.99402	0.5775	90.0	23.18	5.79	6.73	35.70	20.62	1.72	0.43	0.69	2.84	1.64	0.89	0.51	39.43	22.77	39.43	22.77
21年目	H 38	0.99502	0.98896	0.99855	0.99398	0.5553	90.0	23.06	5.73	6.72	35.51	19.72	1.71	0.43	0.69	2.83	1.57	0.88	0.49	39.22	21.78	39.22	21.78
22年目	H 39	0.99500	0.98883	0.99855	0.99395	0.5339	90.0	22.94	5.67	6.71	35.32	18.86	1.70	0.43	0.69	2.82	1.51	0.87	0.46	39.01	20.83	39.01	20.83
23年目	H 40	0.99497	0.98871	0.99855	0.99391	0.5134	90.0	22.82	5.61	6.70	35.13	18.04	1.69	0.43	0.69	2.81	1.44	0.86	0.44	38.80	19.92	38.80	19.92
24年目	H 41	0.99495	0.98858	0.99855	0.99387	0.4936	90.0	22.70	5.55	6.69	34.94	17.25	1.68	0.43	0.69	2.80	1.38	0.85	0.42	38.59	19.05	38.59	19.05
25年目	H 42	0.99492	0.98845	0.99855	0.99384	0.4746	90.0	27.05	6.30	11.18	44.53	21.13	1.88	0.42	1.45	3.75	1.78	1.23	0.58	49.51	23.50	49.51	23.50
26年目	H 43																						

## 便益の現在価値算定表

【残事業】

箇所名：新居浜バイパス

年次	年度 基準年 H 23	総走行台数の年次別伸び率 (四国ブロック)				割戻率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益 (億円/年)					走行費用減少便益 (億円/年)					事故減少便益 (億円/年)		合計 (億円/年)	
								乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率%
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率%
供用開始年次	H 24	0.99388	0.98953	0.99488	0.99294	0.9615	90.0	3.86	0.91	0.51	5.29	5.08	0.47	0.10	0.02	0.59	0.57	0.03	0.03	5.91	5.68
1年目	H 25	0.99385	0.98942	0.99485	0.99289	0.9246	90.0	3.84	0.90	0.51	5.25	4.86	0.47	0.10	0.02	0.59	0.54	0.03	0.03	5.87	5.42
2年目	H 26	0.99381	0.98931	0.99483	0.99284	0.8890	90.0	3.82	0.89	0.51	5.22	4.64	0.46	0.10	0.02	0.58	0.52	0.03	0.03	5.83	5.18
3年目	H 27	0.99377	0.98919	0.99480	0.99279	0.8548	90.0	3.79	0.88	0.50	5.18	4.43	0.46	0.10	0.02	0.58	0.50	0.03	0.02	5.79	4.95
4年目	H 28	0.99373	0.98908	0.99477	0.99274	0.8219	90.0	3.77	0.87	0.50	5.14	4.23	0.46	0.10	0.02	0.58	0.47	0.03	0.02	5.75	4.72
5年目	H 29	0.99369	0.98896	0.99475	0.99269	0.7903	90.0	3.74	0.86	0.50	5.11	4.04	0.46	0.10	0.02	0.57	0.45	0.03	0.02	5.71	4.51
6年目	H 30	0.99365	0.98883	0.99472	0.99263	0.7599	90.0	15.02	4.00	4.71	23.73	18.03	1.60	0.44	0.62	2.66	2.02	0.49	0.37	26.88	20.43
7年目	H 31	0.99361	0.98871	0.99469	0.99258	0.7307	90.0	15.25	4.10	5.61	24.96	18.24	1.43	0.42	0.61	2.46	1.80	0.53	0.39	27.95	20.42
8年目	H 32	0.99357	0.98858	0.99466	0.99252	0.7026	90.0	15.15	4.05	5.58	24.78	17.41	1.42	0.42	0.61	2.45	1.72	0.53	0.37	27.76	19.50
9年目	H 33	0.99514	0.98954	0.99856	0.99416	0.6756	90.0	15.08	4.01	5.57	24.66	16.66	1.41	0.42	0.61	2.44	1.65	0.53	0.36	27.63	18.67
10年目	H 34	0.99512	0.98942	0.99856	0.99412	0.6496	90.0	15.01	3.97	5.56	24.54	15.94	1.40	0.42	0.61	2.43	1.58	0.53	0.34	27.50	17.86
11年目	H 35	0.99509	0.98931	0.99856	0.99409	0.6246	90.0	14.94	3.93	5.55	24.42	15.25	1.39	0.42	0.61	2.42	1.51	0.53	0.33	27.37	17.10
12年目	H 36	0.99507	0.98920	0.99856	0.99406	0.6006	90.0	14.87	3.89	5.54	24.30	14.59	1.38	0.42	0.61	2.41	1.45	0.53	0.32	27.24	16.36
13年目	H 37	0.99505	0.98908	0.99856	0.99402	0.5775	90.0	14.80	3.85	5.53	24.18	13.96	1.37	0.42	0.61	2.40	1.39	0.53	0.31	27.11	15.66
14年目	H 38	0.99502	0.98896	0.99855	0.99398	0.5553	90.0	14.73	3.81	5.52	24.06	13.36	1.36	0.42	0.61	2.39	1.33	0.53	0.29	26.98	14.98
15年目	H 39	0.99500	0.98883	0.99855	0.99395	0.5339	90.0	14.66	3.77	5.51	23.94	12.78	1.35	0.42	0.61	2.38	1.27	0.53	0.28	26.85	14.34
16年目	H 40	0.99497	0.98871	0.99855	0.99391	0.5134	90.0	14.59	3.73	5.50	23.82	12.23	1.34	0.42	0.61	2.37	1.22	0.53	0.27	26.72	13.72
17年目	H 41	0.99495	0.98858	0.99855	0.99387	0.4936	90.0	14.52	3.69	5.49	23.70	11.70	1.33	0.42	0.61	2.36	1.16	0.53	0.26	26.59	13.12
18年目	H 42	0.99492	0.98845	0.99855	0.99384	0.4746	90.0	22.93	5.38	10.10	38.41	18.23	2.00	0.46	1.30	3.76	1.78	1.22	0.58	43.39	20.59
19年目	H 43	0.99044	0.99323	1.00173	0.99206	0.4564	90.0	22.71	5.34	10.12	38.17	17.42	1.98	0.46	1.30	3.74	1.71	1.21	0.55	43.12	19.68
20年目	H 44	0.99035	0.99318	1.00173	0.99200	0.4388	90.0	22.49	5.31	10.13	37.93	16.65	1.96	0.45	1.30	3.72	1.63	1.20	0.53	42.85	18.80
21年目	H 45	0.99025	0.99313	1.00173	0.99193	0.4220	90.0	22.27	5.27	10.15	37.70	15.91	1.94	0.45	1.31	3.70	1.56	1.19	0.50	42.59	17.97
22年目	H 46	0.99015	0.99309	1.00172	0.99187	0.4057	90.0	22.05	5.23	10.17	37.46	15.20	1.92	0.45	1.31	3.68	1.49	1.18	0.48	42.32	17.17
23年目	H 47	0.99006	0.99304	1.00172	0.99180	0.3901	90.0	21.83	5.20	10.19	37.22	14.52	1.90	0.44	1.31	3.66	1.43	1.17	0.46	42.05	16.40
24年目	H 48	0.98996	0.99299	1.00172	0.99173	0.3751	90.0	21.61	5.16	10.20	36.98	13.87	1.89	0.44	1.31	3.64	1.37	1.16	0.44	41.78	15.67
25年目	H 49	0.98986	0.99294	1.00171	0.99167	0.3607	90.0	21.40	5.12	10.22	36.74	13.25	1.87	0.44	1.32	3.62	1.31	1.15	0.42	41.52	14.97
26年目	H 50	0.98975	0.99289	1.00171	0.99160	0.3468	90.0	21.18	5.09	10.24	36.50	12.66	1.85	0.44	1.32	3.60	1.25	1.14	0.40	41.25	14.30
27年目	H 51	0.98965	0.99284	1.00171	0.99152	0.3335	90.0	20.96	5.05	10.26	36.27	12.09	1.83	0.43	1.32	3.58	1.19	1.13	0.38	40.98	13.67
28年目	H 52	0.98954	0.99279	1.00170	0.99145	0.3207	90.0	20.74	5.02	10.27	36.03</td										
