

山鳥坂ダム工事事務所 ダム事業費等監理委員会

—山鳥坂ダム建設事業—

令和4年7月

山鳥坂ダム工事事務所

1. 事業概要 P. 2～P. 7
2. 事業の進捗状況 P. 8～P. 9
3. 令和3・4年度の主な実施内容 P. 10～P. 16
4. コスト縮減 P. 17～P. 19
5. まとめ P. 20

事業の必要性(治水)

- 肱川の戦後最大流量を記録した洪水は平成30年7月豪雨であり、大洲市全域で3,022戸※が浸水する等、極めて甚大な被害が発生。
- 本洪水をはじめ、近年、平成16年8月(台風16号)洪水、平成17年9月(台風14号)洪水、平成23年9月(台風15号)洪水等で浸水被害が頻発している。

※令和4年4月現在

過去の浸水被害実績(肱川)

年 月 日	原因	流量(m ³ /s) (大洲地点) ダム氾濫戻し	被害状況(大洲市内の被害数量)	
			上段: 浸水面積	下段: 人的被害、浸水家屋数
昭和18年7月24日	低気圧・前線	5,400※1	田畑浸水 1876町	死傷者数 131名、住家浸水 7477戸
昭和20年9月18日	枕崎台風	5,000※2	浸水面積 不明	死傷者数 152名、床上浸水 7229戸、床下浸水 2686戸
昭和38年8月10日	台風9号	1,800	農地浸水 18ha、宅地浸水 62ha	浸水家屋数 不明
昭和40年9月17日	台風24号	3,100	田畑浸水 668ha	床上浸水 10戸、床下浸水 312戸
昭和45年8月21日	台風10号	2,900	農地浸水 340ha、宅地浸水 540ha	床上浸水 35戸、床下浸水 245戸
昭和51年9月11日	台風17号	2,100	農地浸水 14ha、宅地浸水 4ha	床上浸水 1戸、床下浸水 24戸
昭和55年7月2日	梅雨前線	2,000	農地浸水 310ha	床上浸水 4戸、床下浸水19戸
昭和57年7月24日	梅雨前線	2,000※3	農地浸水 178ha、宅地浸水 3ha	床上浸水 2戸、床下浸水 16戸
昭和57年8月27日	台風13号	3,000	農地浸水 707ha、宅地浸水 41ha	床上浸水 26戸、床下浸水 88戸
昭和62年7月18日	梅雨前線	3,100	農地浸水 444ha、宅地浸水 79ha	床上浸水 16戸、床下浸水41戸
昭和63年6月25日	梅雨前線・台風4号	3,100	農地浸水 72ha、宅地浸水 14ha	床上浸水 13戸、床下浸水 32戸
平成元年9月19日	台風22号	2,500	農地浸水 39ha、宅地浸水 1ha	床上浸水 8戸、床下浸水 38戸
平成5年7月28日	台風5号	2,800	農地浸水 502ha	床上浸水 3戸、床下浸水 26戸
平成5年9月4日	台風13号	2400※3	農地浸水 267ha	床上浸水 4戸、床下浸水 25戸
平成7年7月4日	梅雨前線	3,200	農地浸水 601ha、宅地浸水 356ha	床上浸水 768戸、床下浸水 427戸
平成10年10月18日	台風10号	3,300	農地浸水 133ha、宅地浸水 3ha	床上浸水 2戸、床下浸水 29戸
平成16年8月31日	台風16号	4,200	浸水面積 約839ha	床上浸水 297戸、床下浸水 277戸
平成16年9月29日	台風21号	2,900	浸水面積 約266ha	床上浸水 6戸、床下浸水 38戸
平成16年10月20日	台風23号	3,100	浸水面積 約415ha	床上浸水 1戸、床下浸水 9戸
平成17年9月6日	台風14号	3,800	浸水面積 約713ha	床上浸水 145戸、床下浸水 167戸
平成23年9月21日	台風15号	3,300	浸水面積 約574ha	床上浸水 69戸、床下浸水 79戸
平成30年7月7日	梅雨前線	6,200	浸水面積 約1,372ha	死者数 4名、床上浸水約 2,234戸、床下浸水 788戸

※1: 氾濫計算による推計値 ※2: 実績水位からの推計値 ※3: 観測実績値(ダム調節後流量)



平成30年7月(梅雨前線)※大洲市提供



平成17年9月(台風14号)




平成23年9月(台風15号)



平成16年8月(台風16号)

事業の必要性(利水)

- 肱川では平素の河川流量の減少が課題であり、現状では渇水時に $4.3\text{m}^3/\text{s}$ 程度しか流れていない時期もあり、動植物の生息・生育・繁殖や景観等に必要な正常流量 $6.5\text{m}^3/\text{s}$ (大洲地点での冬期以外)の確保が必要である。

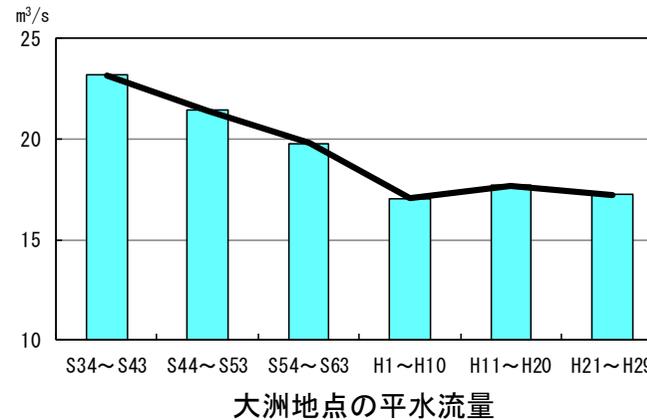

※平水流量とは、年間185日はこれを下回らない流量

- 平成21年は、4月から少雨傾向が続き、6月末までまとまった降雨がなく、鹿野川ダムの貯水位は、最低水位(EL72.0m)を下回り、ダム完成後50年間で最も低い水位となるEL63.14mを記録する渇水となった。この渇水により鮎の遡上障害や農業用水の取水障害などが発生した。



6月22日 (最渇水時)

大洲床止めの様子



本郷揚水機場
取水障害の対応




溜まり水での魚救出
動植物の保護

事業の必要性(水利用)

- 肱川では多種多様な動植物が確認されているとともに、地域住民が身近に自然とふれあえる憩いの場として四季折々で様々な利用されている。

正常流量を確保することで様々な水利用を継続できる

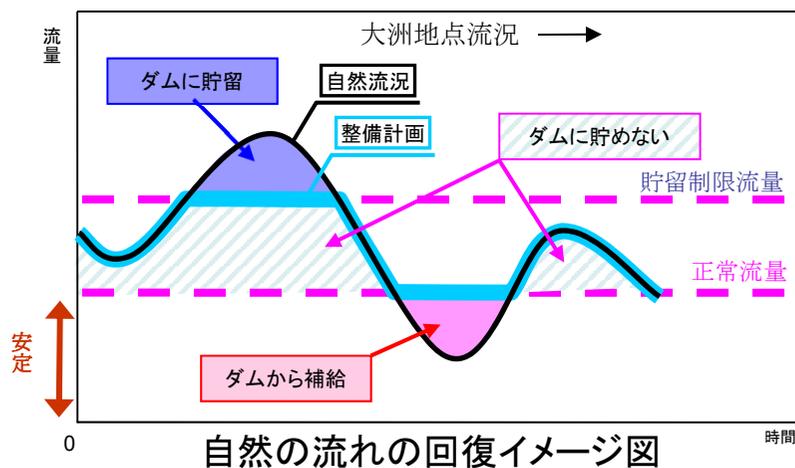

鵜飼い 日本三大鵜飼いの一つ(長良川、三隈川、肱川)



カヌーツーリング



アユ釣り


事業概要(山鳥坂ダム建設事業の主な経緯)




平成 4 年	4 月	建設事業着手
平成 6 年	8 月	特定多目的ダム法の基本計画公示(事業費 約1,070億円)
平成13年	5 月	分水量を縮小した「見直し案」を提示
平成14年	5 月	中予分水を除外した上で計画を再構築した「再構築計画案」を提示
平成15年	10月	「肱川水系河川整備基本方針」策定
平成16年	5 月	「肱川水系河川整備計画」策定
平成17年	4 月	特定多目的ダム建設事業から直轄河川総合開発事業に移行(事業費 約850億円)
	10月	特定多目的ダム法に基づく基本計画を廃止
平成18年	7 月	地権者協議会とダム事業に関する基本協定書を締結(用地調査の開始)
平成20年	5 月	環境影響評価手続き完了 ダム事業費等監理委員会設立(毎年実施)
	7 月	山鳥坂ダム・鹿野川ダム環境検討委員会設立
平成21年	9 月	用地補償基準(案)を地権者協議会が了承
	10月	国土交通大臣が平成21年度におけるダム事業の進め方について発表「当初予定していた新たな段階に入ることとなる用地買収の着手を取りやめる事業」となる
	12月	国土交通大臣が新たな基準に沿った検証の対象とするダム事業を設定する考え方について発表 山鳥坂ダムは検証対象ダムとなる
平成22年	9 月	国土交通大臣よりダム事業の検証に係る検討指示
平成25年	1 月	国土交通省の対応方針について「継続」決定
	3 月	損失補償基準に関する協定書調印式
令和元年	12月	「肱川水系河川整備計画」変更
令和3年	12月	「令和3年度 山鳥坂ダム工事事務所 ダム事業費等監理委員会(第2回)」にてダムサイトの変更を公表
令和4年	6 月	「肱川水系河川整備計画」変更

- おおずし ひじかわちょう やまとさか ひじかわ かわべがわ
- 場所：愛媛県大洲市肱川町山鳥坂(肱川水系河辺川)
 - 目的：洪水調節(肱川の洪水防御)
流水の正常な機能の維持

山鳥坂ダム建設予定地

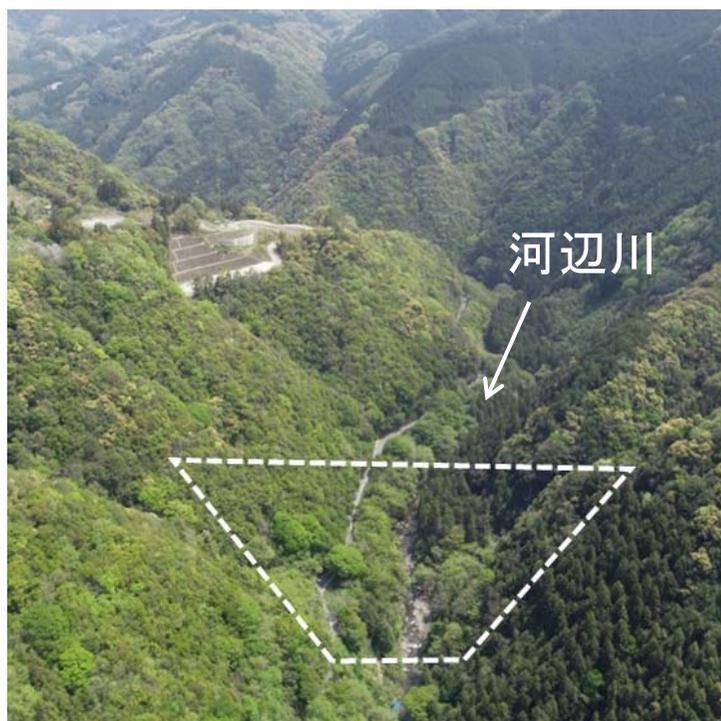


山鳥坂ダム容量配分図

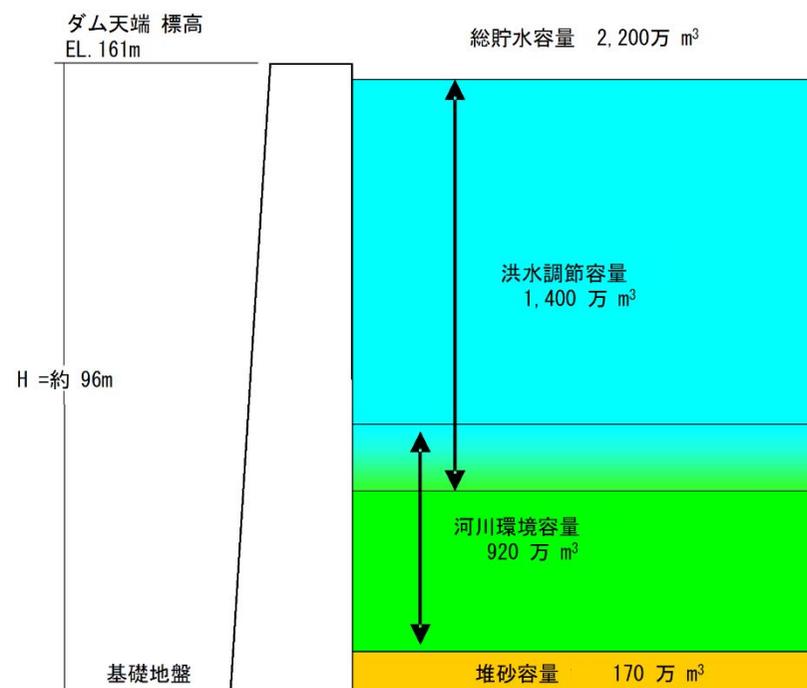


事業概要

全体計画図

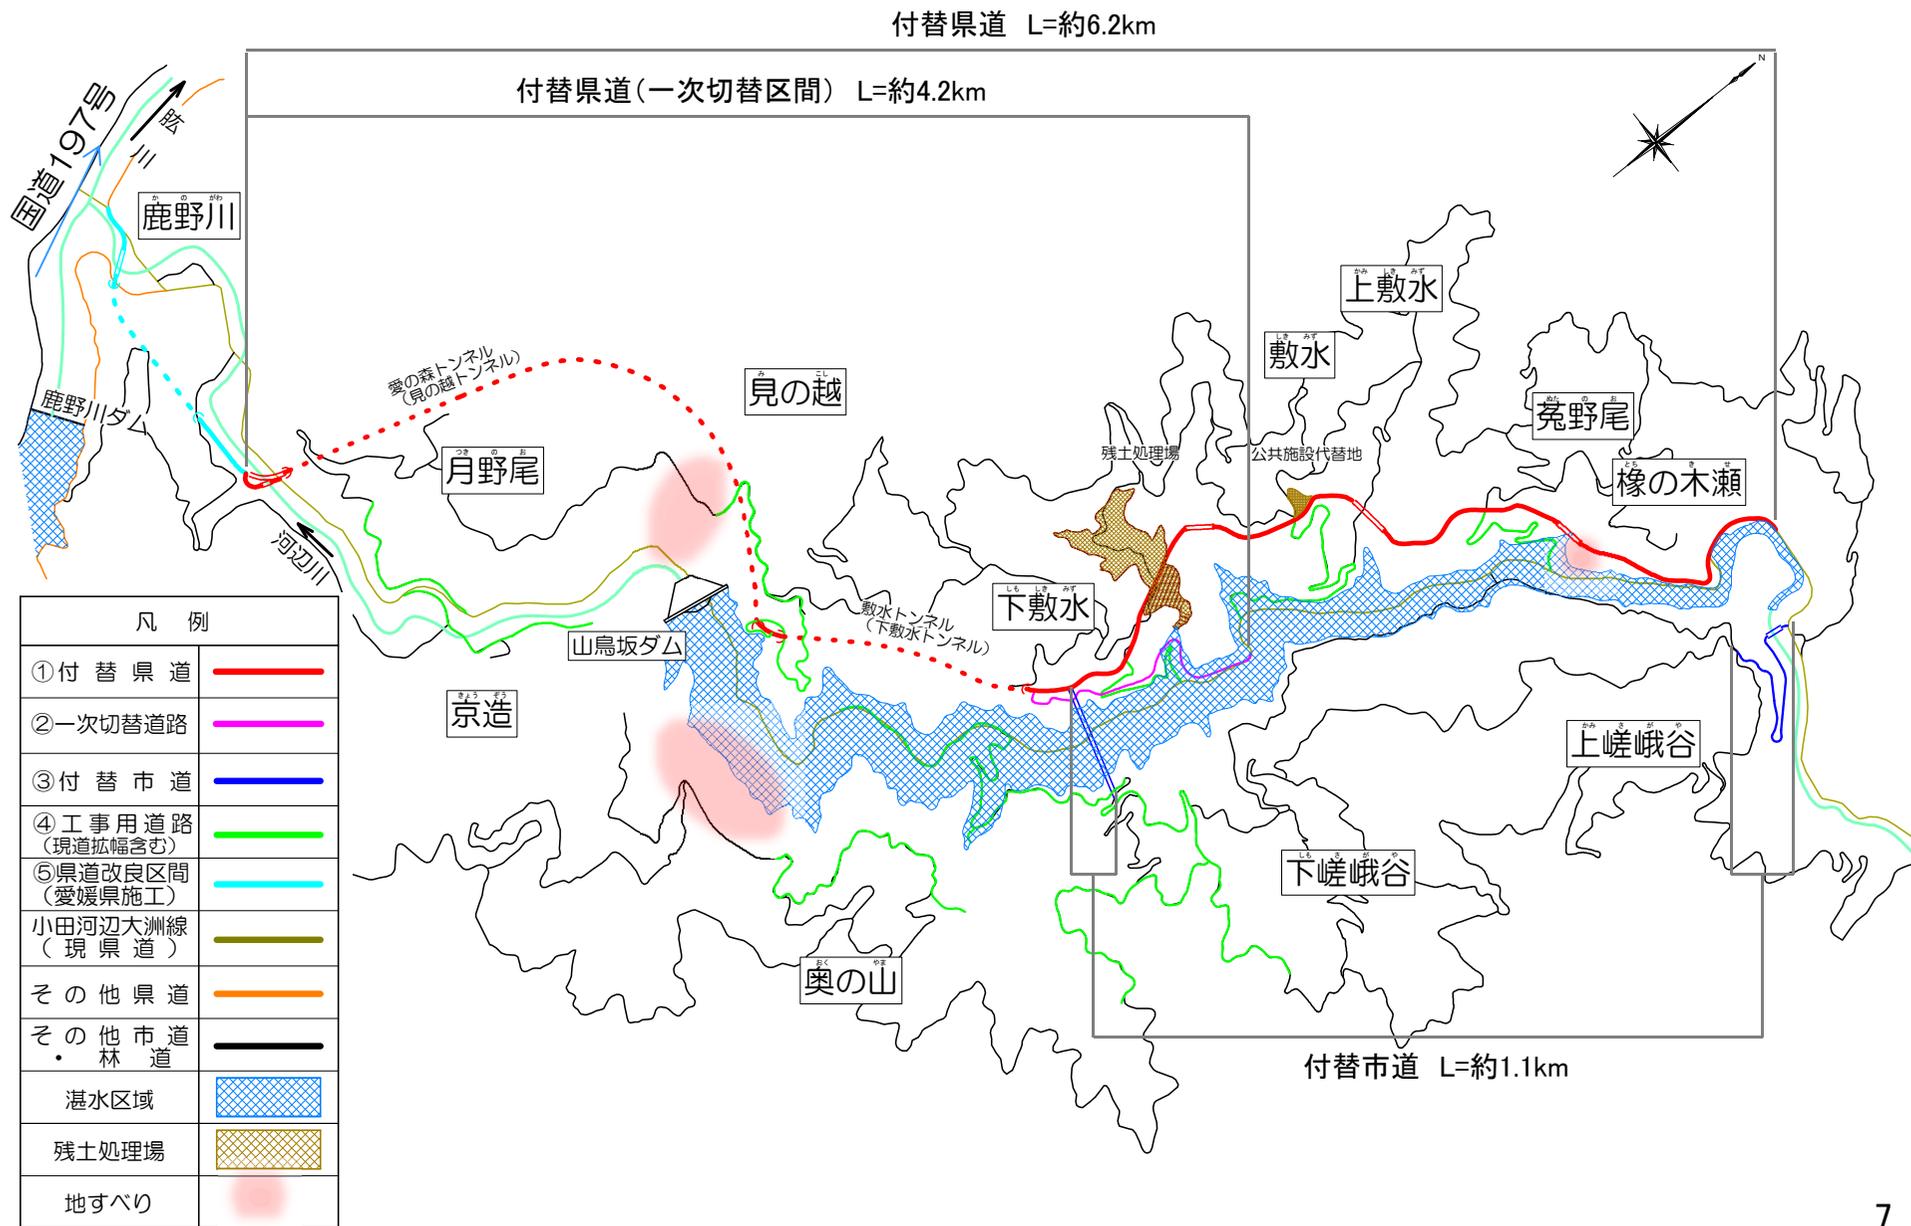

事業の進捗状況

事業工程

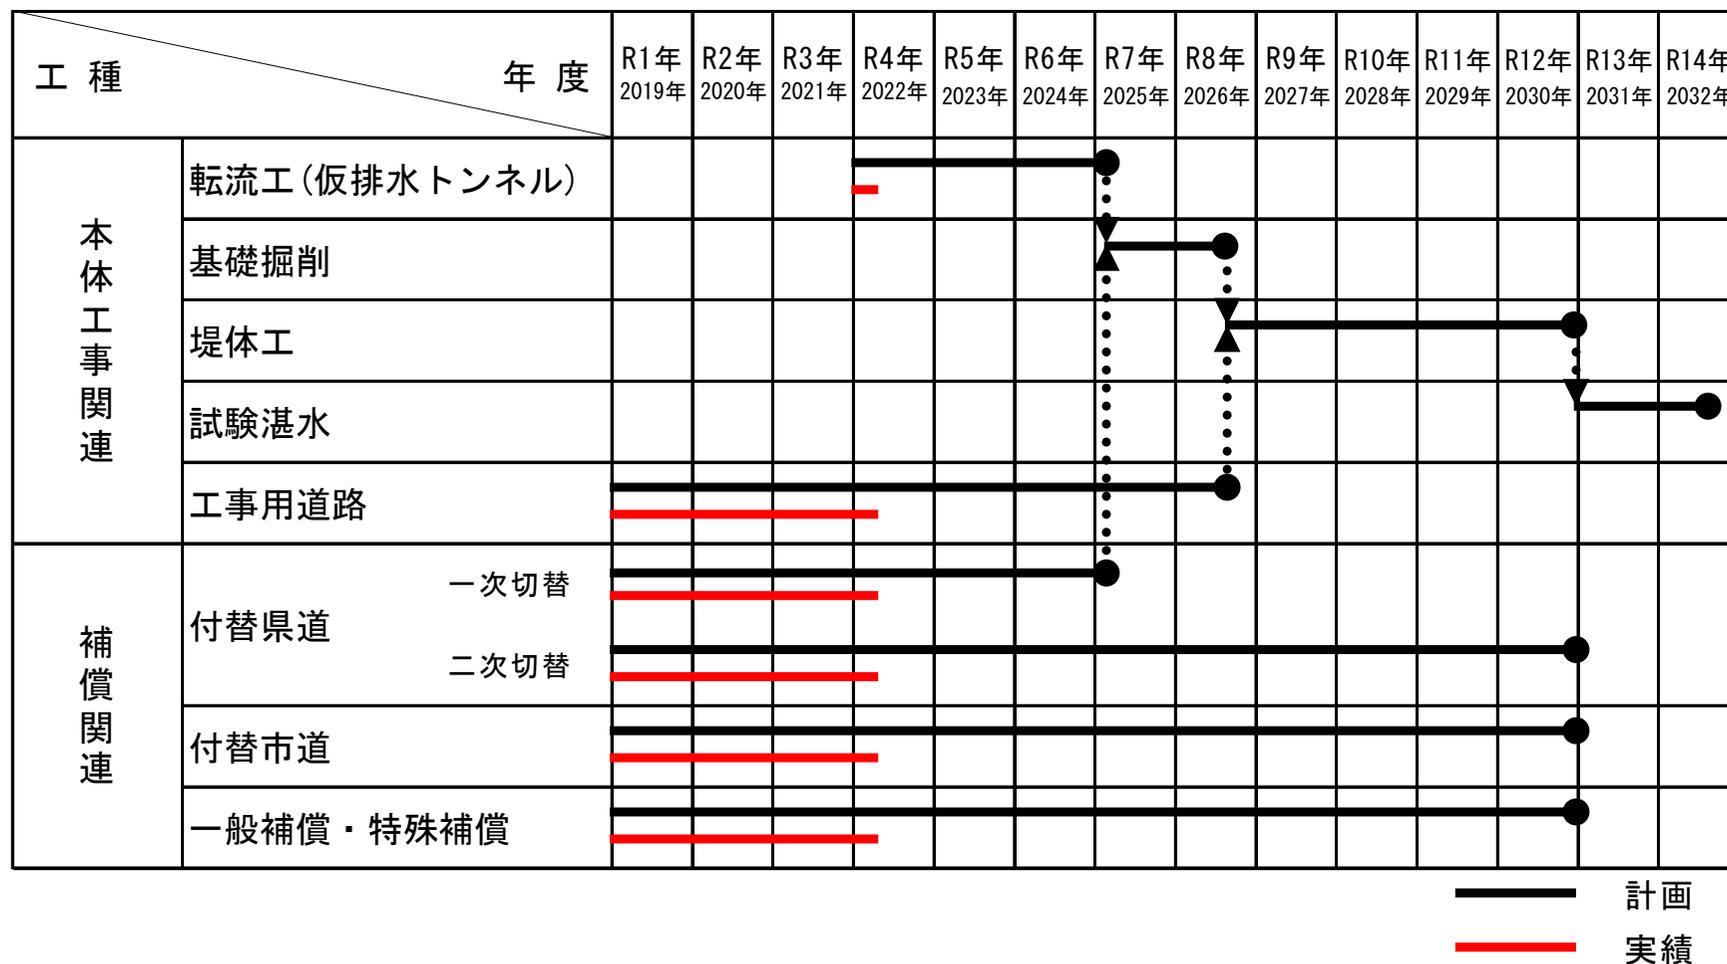

事業の進捗状況

(令和4年3月末時点)

主な経緯	H20.5 環境影響評価の手続き終了 H25.1 事業継続の決定 H25.3 用地補償基準妥結			
用地取得 (約139ha)	72% (100.3ha) <前回 72% (100.3ha) >			
家屋移転契約 (33戸)	100% (33戸)			
付替道路 (県道 約6.2km) (市道 約1.1km)	15% (約1.1km) <前回 12% (約0.9km) >			
付替県道に関する 工事用道路 (約2.6km)	85% (約2.2km) <前回 85% (約2.2km) >			
ダム本体に関する 工事用道路 (約7.3km)	3% (約0.2km) <前回 3% (約0.2km) >			
ダム本体及び 関連工事	仮排水トンネル	基礎掘削	コンクリート打設	試験湛水

--- 用地取得
 --- 道路工事
 --- ダム本体関連

令和4年度の主な実施内容(付替道路・工事用道路工事)


令和4年4月時点



見の越トンネル掘削状況



下敷水残土処理場整備

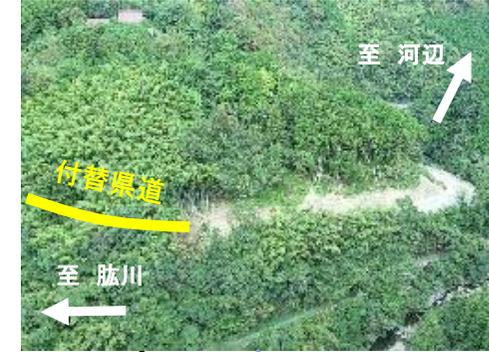

菟野尾地区付替県道



月野尾工事用道路



横坑試掘



下敷水トンネル掘削状況




新入船橋橋脚基礎




新岩谷橋仮設構台・岩山掘削 10

令和3年度の主な実施内容

①

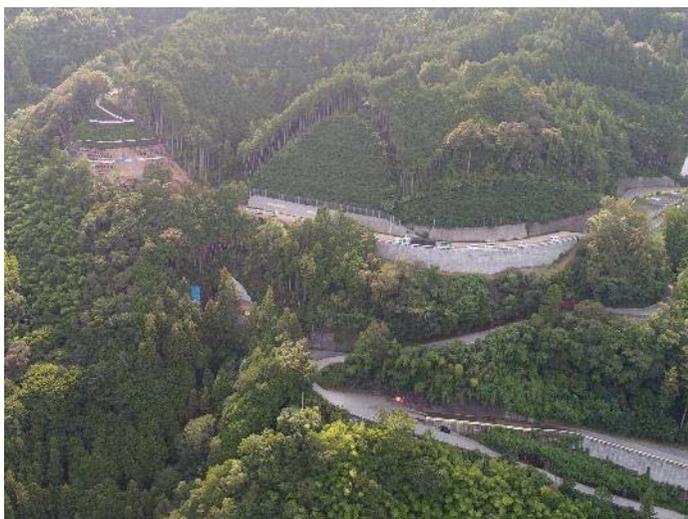

下敷水地区工事用道路 施工中(令和元年7月)




下敷水地区工事用道路 施工中(令和4年4月)

②



菟野尾地区付替県道 着手前(令和3年3月)



菟野尾地区付替県道 施工中(令和4年4月)

令和3年度の主な実施内容

③



椽の木瀬地区付替県道 施工中(令和4年4月)

④




敷水地区付替県道 施工中(令和4年4月)

⑤




新入船橋作業構台 施工中(令和3年1月)



新入船橋作業構台 施工中(令和4年4月)

令和3年度の主な実施内容

⑥



見の越トンネル坑口(終点側) 着手前(平成29年4月)

見の越トンネル坑口(終点側) 施工中(令和4年4月)

⑦



上鹿野川地区付替県道 施工中(令和4年4月)

⑧



月野尾工事用道路 施工中(令和4年4月)

令和4年度の主な実施内容(仮排水トンネル)

○仮排水トンネル工事においては、設計段階から突発的な湧水への対応など施工者独自のノウハウを取り入れるECIを適用して発注し、工事着手後の現場条件の変更等のリスクを最小限に抑える。

国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和4年 3月24日
四国地方整備局

山鳥坂ダムトンネル工事 『技術提案・交渉方式』(ECI)を適用し発注

四国地方整備局では『山鳥坂ダムトンネル工事』において、「技術提案・交渉方式」(ECI)による調達方式を適用します。

山鳥坂ダムトンネル工事は、ダム本体工事に着手するために、河辺川の流れを一時的に迂回させるトンネル工事です。当該工事は、土砂の搬出等の制約条件を踏まえた施工方法や工事中の湧水発生等の可能性も踏まえつつ、安全かつ確実に工事を実施することが求められることから技術提案・交渉方式による調達を実施するものです。

技術協力業務の概要は以下のとおりです。

◆山鳥坂ダムトンネル工事に係る技術協力業務の概要【山鳥坂ダム工事事務所】

業務名：山鳥坂ダムトンネル工事に係る技術協力業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 業務場所：愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 公告時期：令和4年度第1四半期
- 4) 業務期間：令和4年8月～令和5年3月31日

◆山鳥坂ダムトンネル工事の概要


工事名：山鳥坂ダムトンネル工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：掘削覆工 L=約680m、坑口工 2箇所、呑口工 1式、吐口工 1式、吐口水路工 1式、上流仮締切工 V=約4,000m³、下流仮締切工 V=約500m³、仮設工 1式
- 5) 入札予定時期：令和5年度第2四半期予定
- 6) 工事発注規模：15億円以上30億円未満
- 7) その他：本工事は以下の対象工事である。
見積活用積算方式、労働者確保に要する間接費の設計変更、余裕期間制度、週休2日試行

この実施は、四国圏広域地方計画「No1 南高トラフ地震を給めとする大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト」及び「四国地震防災基本戦略」の取り組みに該当します。

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 TEL:087-851-8061 FAX:087-811-8412
 制度に関すること：企画部 技術管理課長 田邊 守英 (内線:3311)
 工事に関すること：河川部 河川工事課長 坂本 雄彦 (内線:3711)
 山鳥坂ダム工事事務所 TEL:0893-34-3000 FAX:0893-34-3367
 現地状況等に関すること：山鳥坂ダム工事事務所 副所長 矢野 慎二 (内線:204)

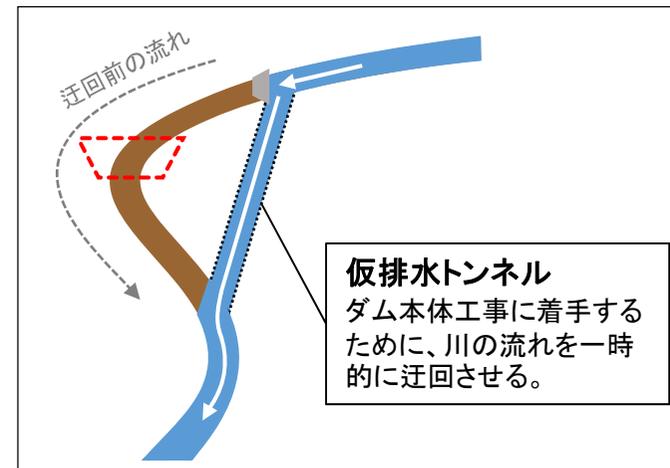


仮排水トンネルのイメージ



他ダムの事例
仮排水トンネル吐口(出口)側

令和3・4年度の主な実施内容(設計等業務)

付替道路設計、工事用道路設計、残土処理場測量設計等

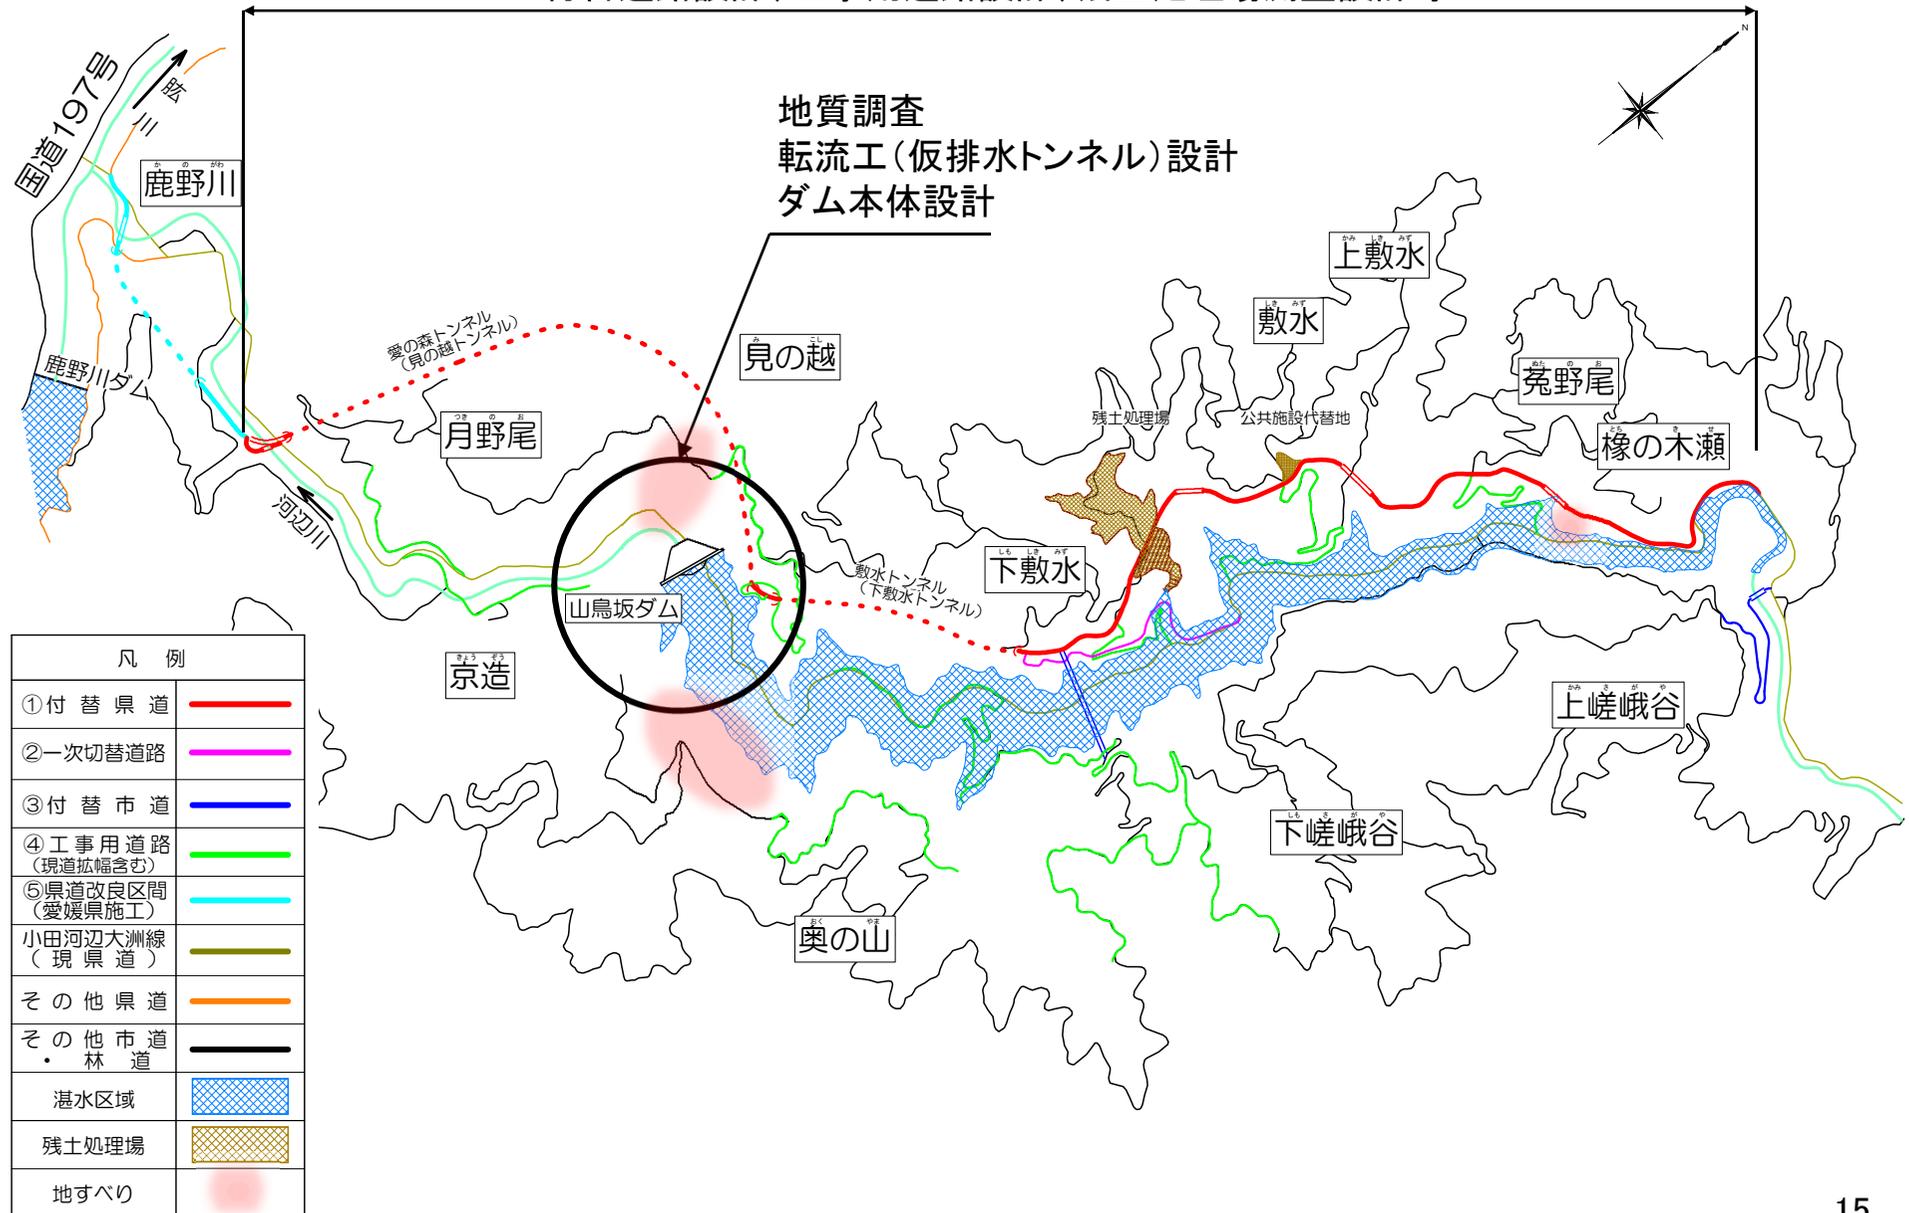

令和3・4年度の主な実施内容 (環境調査・基礎調査等)

- 事業実施にむけて必要な情報を収集・整理するため、環境調査・地すべり観測・水文水質調査・地質調査等を継続的に実施

環境調査(動物・植物)	各種自然環境について現地調査を継続的に実施し、モニタリング・保全対策を実施
地すべり観測	孔内傾斜計を設置し継続的に観測
水理水文観測	水位・流量・雨量等を継続的に観測
地下水調査	地下水変動を継続的に観測
水質調査	水質を継続的に観測
地質調査	ダムサイト周辺の地質調査を実施

環境調査(猛禽類)



地すべり観測(孔内傾斜計観測状況)



地質調査(ボーリング調査)





コスト縮減

前回資料の再掲

付替市道の計画見直し(▲9.5億円)

- ダム貯水池上昇で洪水時にのみ一時的に水没、かつ洪水時に利用が想定されない施設で、水没による損傷等に対し、堰堤維持費等での実損額の補填又は災害復旧事業で対応。
- 上記により、付替市道の整備延長を0.8km縮減。
- ※「ダム建設の合理化に関する堰堤維持事業等の拡充制度」(平成31年3月29日付 国水環第222号 国水治第197号)を活用する。

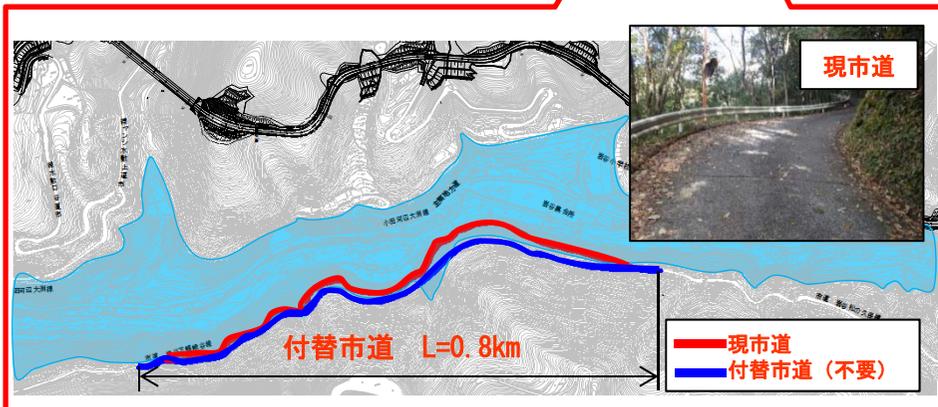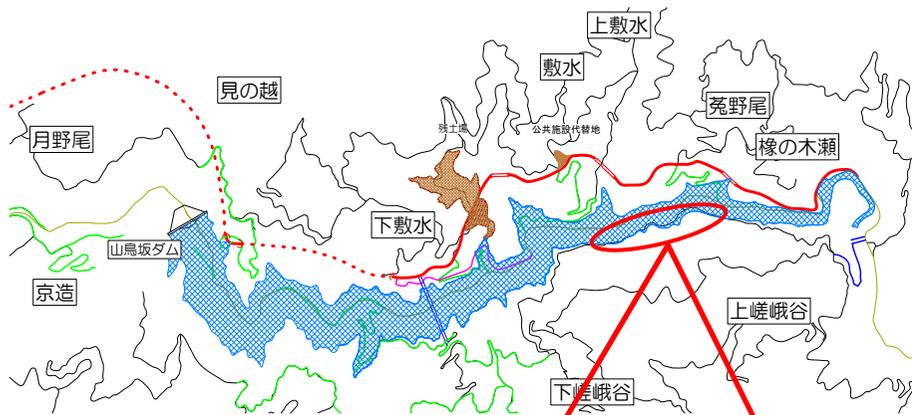

新技術・新工法の活用(▲10.5億円)



- 付替道路(工事用進入路を含む)に関して、設計の見直し・構造の工夫、施工方法の工夫、新技術の活用等によりコスト縮減。

事例) SqCピア工法の採用 ・ 安全性の確保と工期を短縮

現行: 従来工法




①導材設置 ⇒ ②削孔根固打設 ⇒ ③足場設置・杭頭処理 ⇒ ④プレス・水平材～上部工設置



見直し: SqCピア工法




①パネルセット ⇒ ②削孔 ⇒ ③支持杭建込・根固打設 ⇒ ④上部工設置



新工法の採用によるコスト縮減

CASE-1 ; 従来工法 (切土+法面保護)

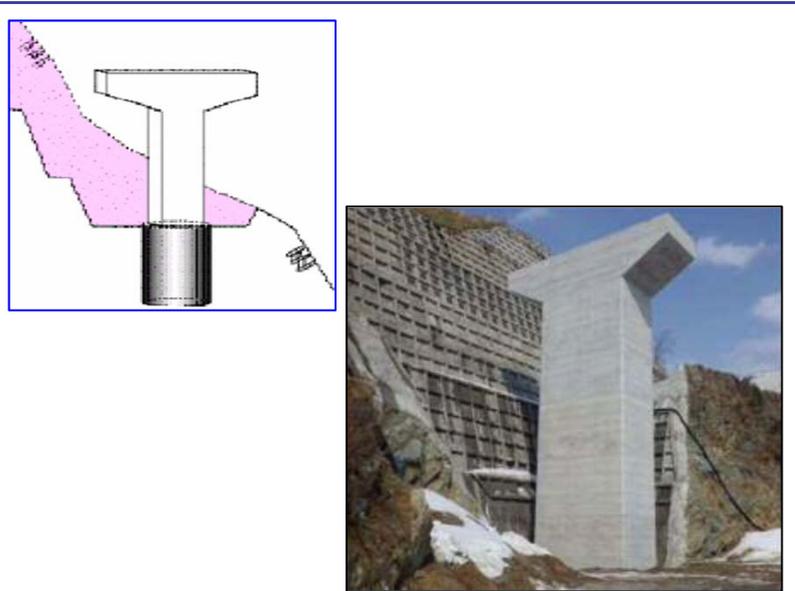

※写真は他事業の事例

工事費 ; 約200百万円



CASE-2 ; 新工法 (竹割土留工法)





採用

※写真は他事業の事例

工事費 ; 約189百万円

新工法である「竹割土留工法」を採用し、切土や法面保護の費用を縮減。
今回、約11百万円のコスト縮減となることに加えて、地山の掘削面積を抑制したことにより環境に与える影響の縮小を図る。

坑口・橋台一体化構造によるコスト縮減

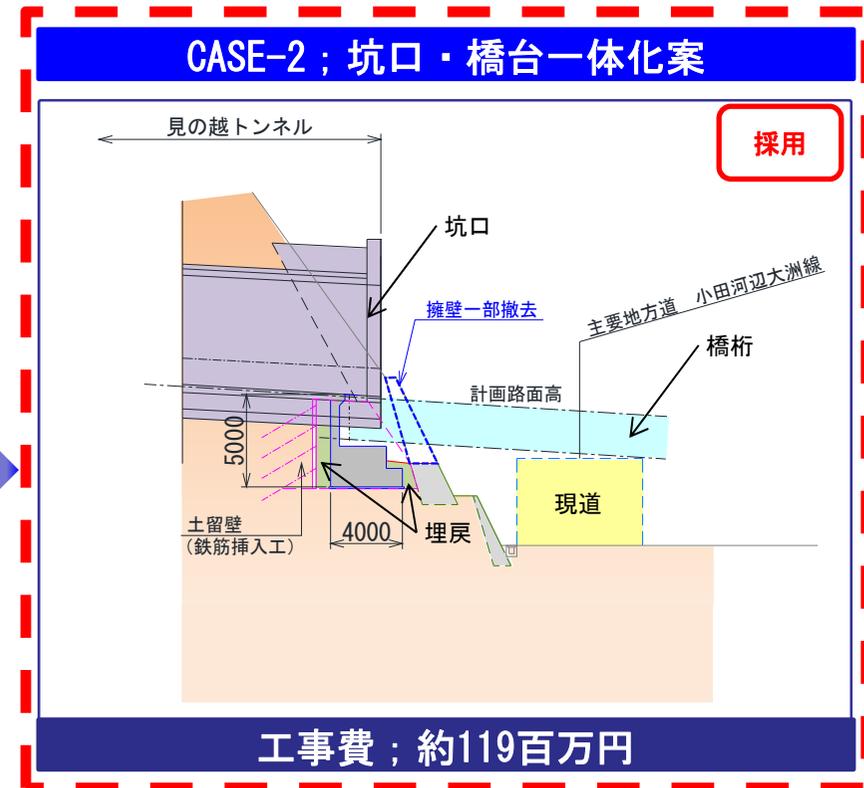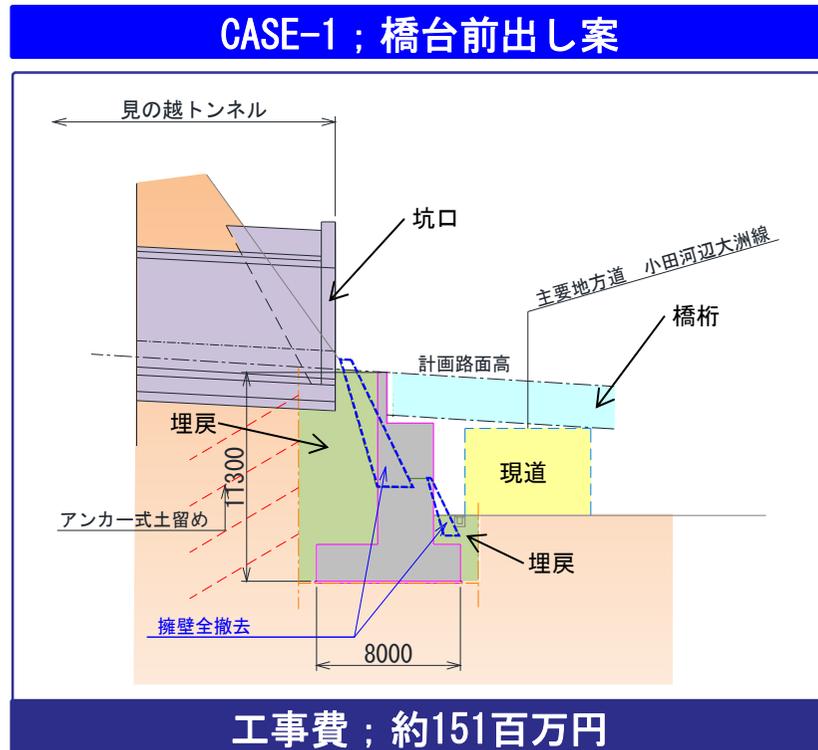

橋台とトンネル坑口部を一体化することで、橋台掘削の影響が小さくなり、橋台背面の土留め工やA1の橋台規模が縮小され約32百万円のコスト縮減になるとともに、施工中の現道交通の安全性が向上する。

○まとめ

- 令和7年度のダム本体基礎掘削着手までに、仮排水トンネルにより河辺川の流れを迂回させる必要があるため、令和5年度に工事着手を予定。
- 付替県道の一次切替についても、令和7年度のダム本体基礎掘削着手までに完成する必要があるため、工事を確実に進捗させる。また、一次切替以外の付替道路については、試験湛水開始予定である令和13年度までに完成させる必要があり、計画的に工事を進める。
- 令和7年度のダム本体基礎掘削着手に向け、ダム本体設計を進める。
- 急峻な地形・脆弱な地質で設計・施工面において非常に厳しい現場状況であるが、ダム本体基礎掘削着手に向け、引き続き安全に配慮しつつコスト縮減及び工期短縮に努める。
