



H29-30年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設(その3)工事

R元年5月 呑口部仮設構台撤去および吐口部減勢工の躯体コンクリート打設

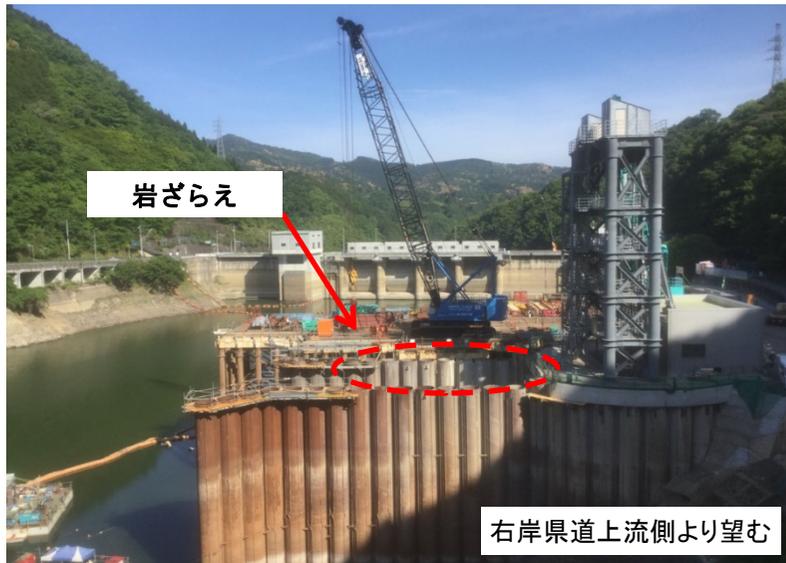

5月13日 呑口仮設A構台撤去、型枠組立、岩ざらえ

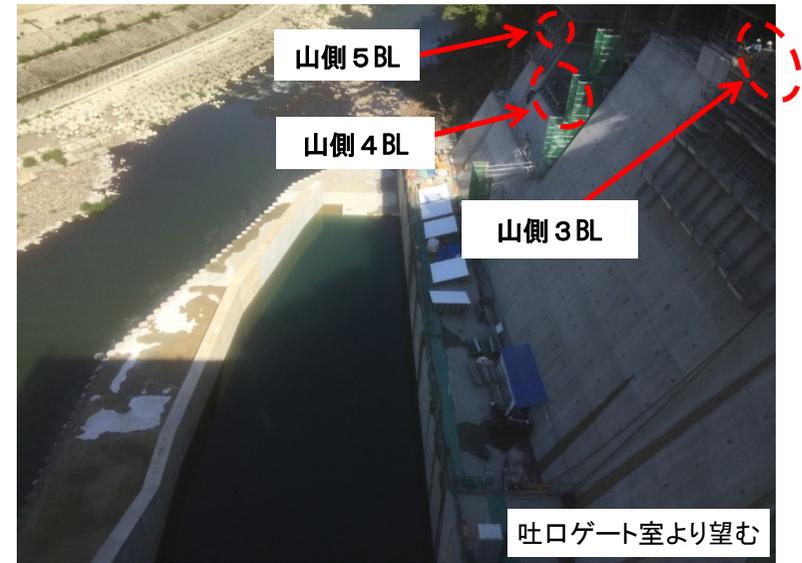

5月13日 山側2BL・4BL型枠組立、山側5BL打設準備



5月20日 呑口仮設A構台撤去、コンクリート打設



5月20日 山側4BL型枠組立て・打設準備、山側5BL
コンクリート打設

H29-30年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設(その3)工事

R元年5月 呑口部杭頭連結支保工組立および吐口部減勢工の躯体コンクリート打設



5月27日 呑口杭頭連結支保工組立



5月27日 山側4BL型枠組立、鉄筋組立
