

平成14年7月31日 10:30

一般国道56号 宇和島道路宇和島別当IC法面崩落災害  
(第5報)

1. 路線名 : 一般国道56号 宇和島道路
2. 発生場所 : 宇和島別当IC 南行き下り口ランプ付近  
(愛媛県宇和島市坂下津)
3. 発生日時 : 平成14年7月30日 午前8時06分頃
4. 災害概要 : 宇和島道路の別当OFFランプ付近において逆Y擁壁が崩落  
幅 約70m  
高さ 約20m  
崩落土砂 約1500m<sup>3</sup>
5. 対応措置等 : 8時6分 崩落発生  
8時20分 現地確認  
8時40分 宇和島道路全面通行止め  
建設用重機械を使用し土砂を除去作業  
18時44分 被災者無しを確認  
20時30分 崩落土砂撤去完了  
仮防護柵の施工を引き続き継続施工  
7/31 13時00分 検討委員会実施予定(大洲工事事務所にて)  
8/1 夕方 宇和島道路本線通行可能予定  
ランプは引き続き通行止め
6. 気象状況 : 晴れ 気象注意報等発令なし
7. 通行規制 : 午前8時40分より宇和島道路全面通行止め  
現在も継続中
8. 被災者の有無 : なし
9. 被災箇所の  
整備状況 : 平成9年度の改良工事にて擁壁施工。
10. 図面等 : 別添資料有り
11. その他 : 次回は午後4時頃に大洲工事事務所においてその後の状況等の記者発表を行う予定。

## 今後の復旧見込みと取り組みについて

- ・ 昨日午前8時40分の宇和島道路通行止め以降、ダンプトラック、パワーショベル等建設機械を延べ31台、人員延べ100人以上を投入し、24時間体制で整備局を挙げて復旧作業を行っています。

## 本日午前9時時点での復旧状況

- ・ 昨日（30日）午後8時30分に崩壊した土砂の撤去を完了しました。
- ・ その後、引き続き通行止め解除のための「仮設防護柵」の設置作業を行っています。

## 通行止め解除の予定

- ・ 現在実施している通行止めは、「仮設防護柵」を設置し、現地の安全が確認出来次第解除する予定で、明日（8月1日）の夕方を目標に作業を行っています。
- ・ なお、今後の復旧作業のため、通行止め解除は本線のみとし、「宇和島別当IC」のオフランプは当分の間使用できません。

## 原因調査及び今後の復旧工法

- ・原因調査及び今後の本復旧方法については、本日開催される「宇和島道路法面崩壊調査委員会」の提言を受けて今後、対応していきます。

## 現在の規制状況

- ・別添資料参照

## 「宇和島道路法面崩壊調査委員会」

### メンバー

やたべ りゅういち  
矢田部 龍一

愛媛大学 工学部教授

むろ たつろう  
室 達朗

愛媛大学 工学部教授

おおが みたお  
大賀 水田生

愛媛大学 工学部教授

まつお おさむ  
松尾 修

国土技術政策総合研究所 危機管理技術研究センター

地震災害研究官

きのした たけし  
木下 武志

独立行政法人土木研究所 施工技術主席研究員

### 役割


のり面崩壊の原因調査

全面通行止めの早期解除を行うための応急復旧工法  
背後斜面を恒久的に安定させるための対策

## 大洲道路における逆Y型擁壁の点検結果

- ・ 昨日（30日）大洲道路で施工している全ての逆Y型擁壁の点検を実施した結果、異常ありませんでした。

# 宇和島道路法面崩落災害に伴う交通規制図

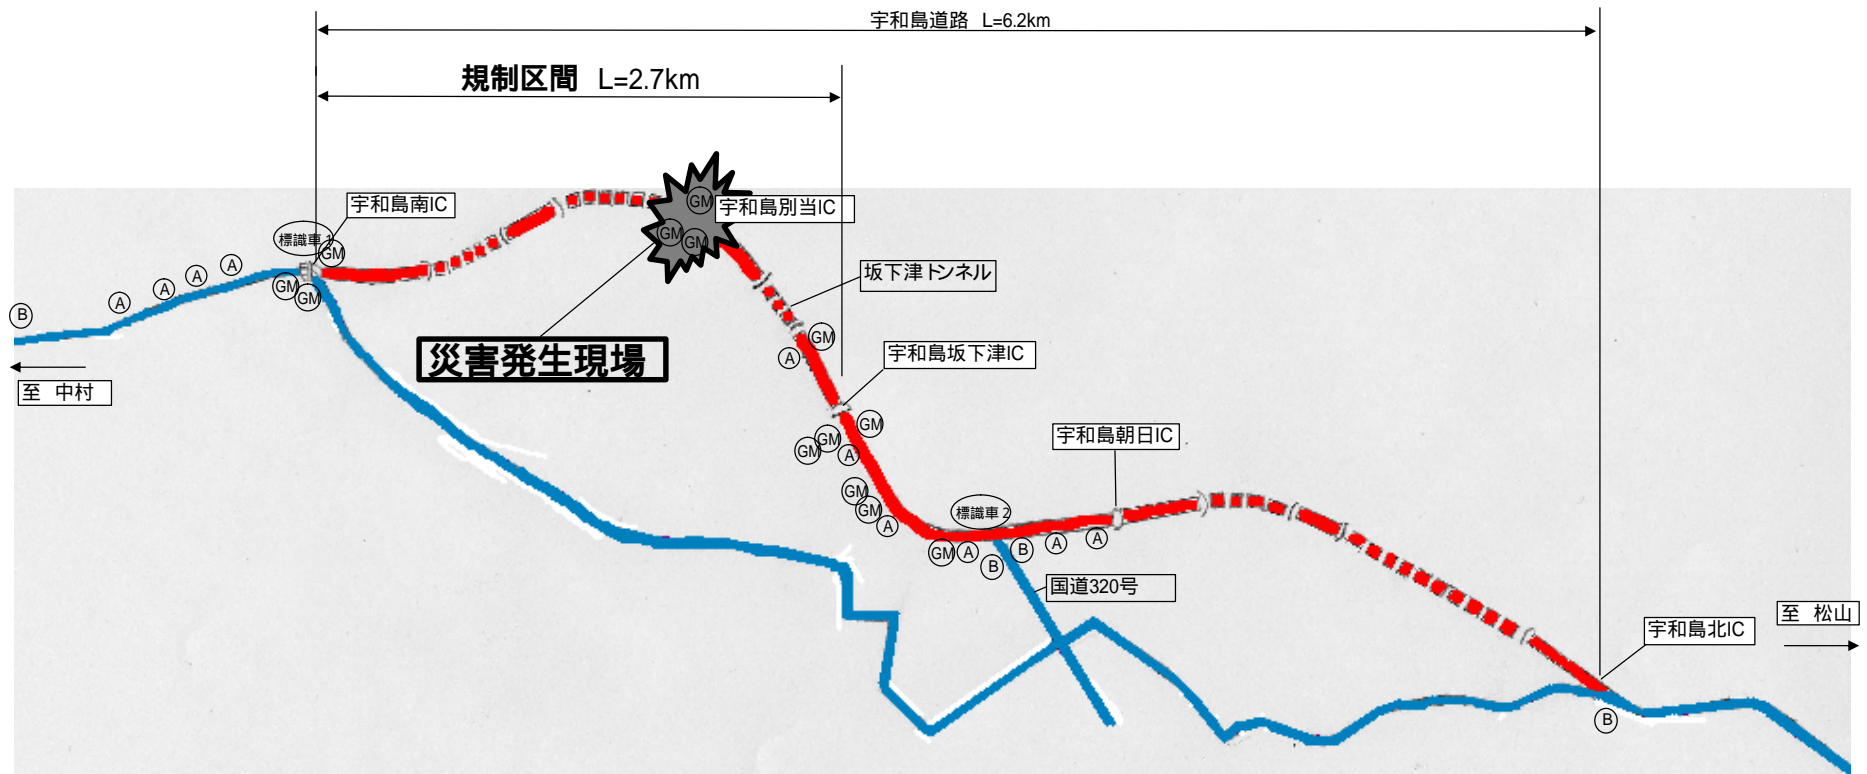

## 表示板 表示内容

上り  
宇和島市高串  
宇和町伊賀上  
宇和町大江

下り  
宇和島市高串

表示内容 宇和島道路 寄松～坂下津 通行止

## ラジオ再放送

松尾トンネル、藤江トンネル

放送内容  
国土交通省からお知らせします。  
現在宇和島通行止めのため、渋滞しています。  
注意して走行してください。

## 通行止看板

- (A) 通行止看板  
宇和島道路通行止
- (B) 通行止看板  
宇和島道路通行止 (坂下津～寄松)

## 標識車

- 標識車  
標識車1  
災害により宇和島道路全面通行止
- 標識車  
標識車2  
通行止 崩落 500m先

(GM) 交通整理人
