

一般国道56号宇和島道路宇和島別当IC法面崩落災害
現在の状況及び今後の予定について

平成14年7月30日に法面崩落のあった「宇和島道路宇和島別当ICの法面崩落災害」のその後の状況及び今後の調査内容についてお知らせします。

平成14年8月8日

国土交通省大洲工事事務所

問合わせ先

国土交通省

大洲工事事務所

TEL (0893) 24 - 5185

事業対策官

かわたのぶお
川田信夫

(内線208)

副所長(道路担当)

せいけもとや
清家基哉

(内線205)

現在の状況及び今後の予定

1、応急対策工事の状況

工事内容

- ・別紙 - 1 参照

目的

- ・斜面全体の安定 : 押え盛土
- ・法面の小崩落の防止 : 崩壊法面の整形、一部逆 Y 型擁壁の撤去
- ・側面部崩壊防止 : モルタル吹き付け
- ・雨水進入防止対策 : シート布設

進捗状況

- ・進捗率約 60 %

完了予定

- ・平成 14 年 8 月 13 日

施工業者

- ・亀岡建設(株)

応急復旧工事完了後の監視体制

- ・カメラ

カメラ 3 台で行っている 24 時間監視を 2 台で継続。

- ・巡視員

現地で行っている 24 時間監視を、1 日 2 回の巡回監視に変更。

- ・伸縮計

中央部も追加し 2 箇所を観測。設置位置は別紙 - 2

2、今後の調査予定

調査内容

- ・調査ボーリング (位置は別紙 - 3 参照)
- ・泥岩のスレーキング試験
- ・背面盛土材の土質試験
- ・トレンチによる調査 (位置は別紙 - 3 参照)
- ・廃棄物土の特性調査
- ・コンクリートの中酸化試験

目的


- ・原因究明及び対策工法検討の資料収集


調査着手予定


- ・平成 14 年 8 月 9 日

調査業者

- ・本日決定予定

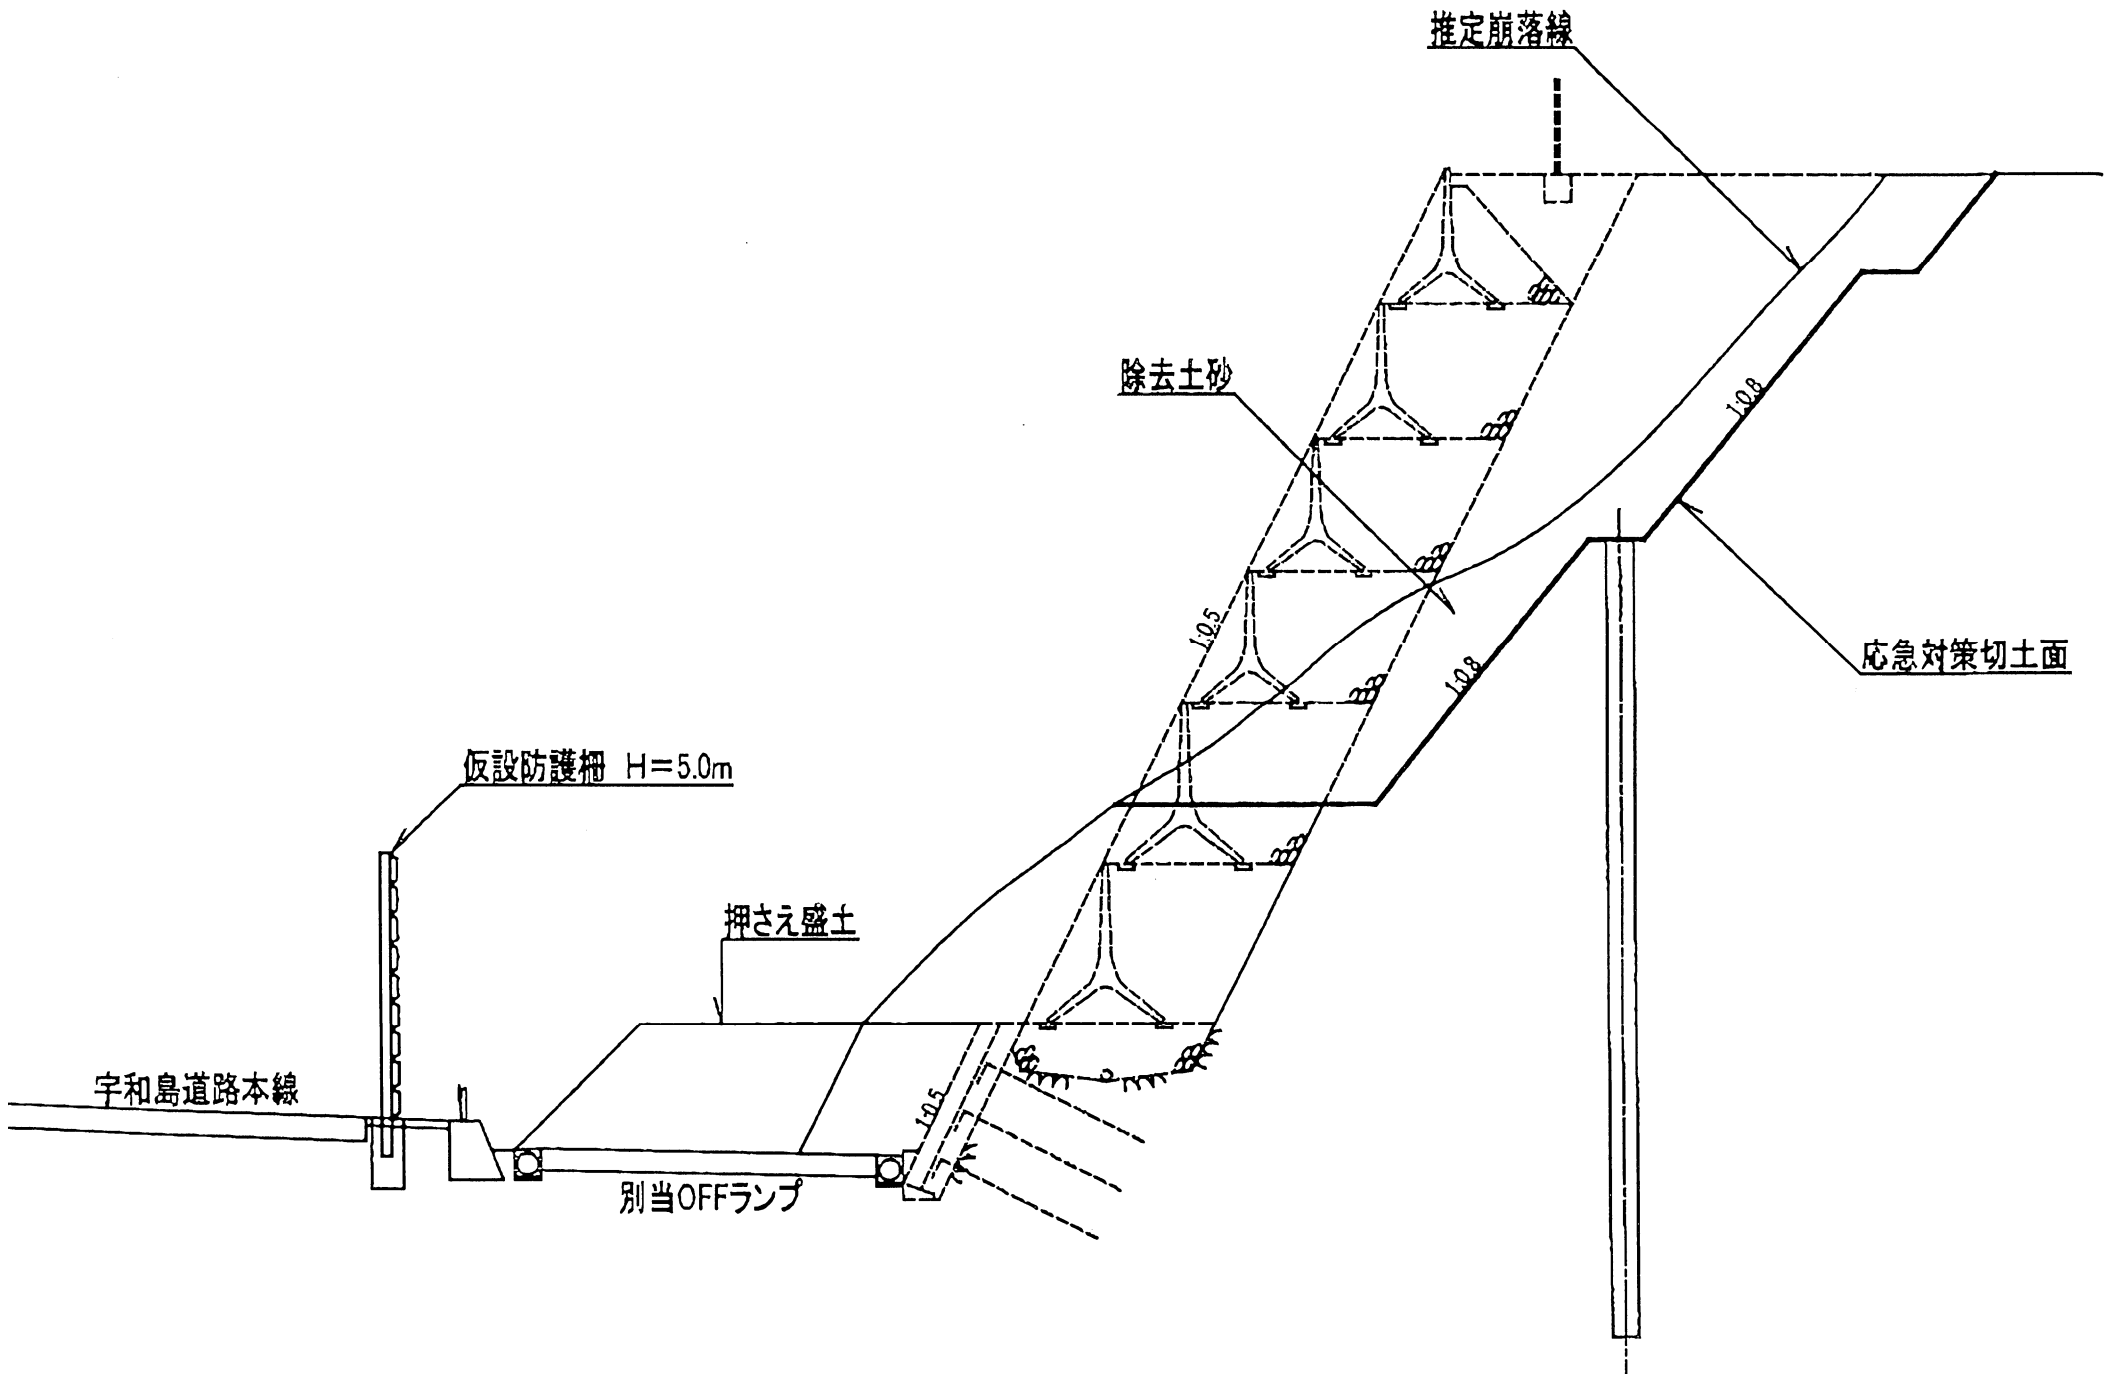

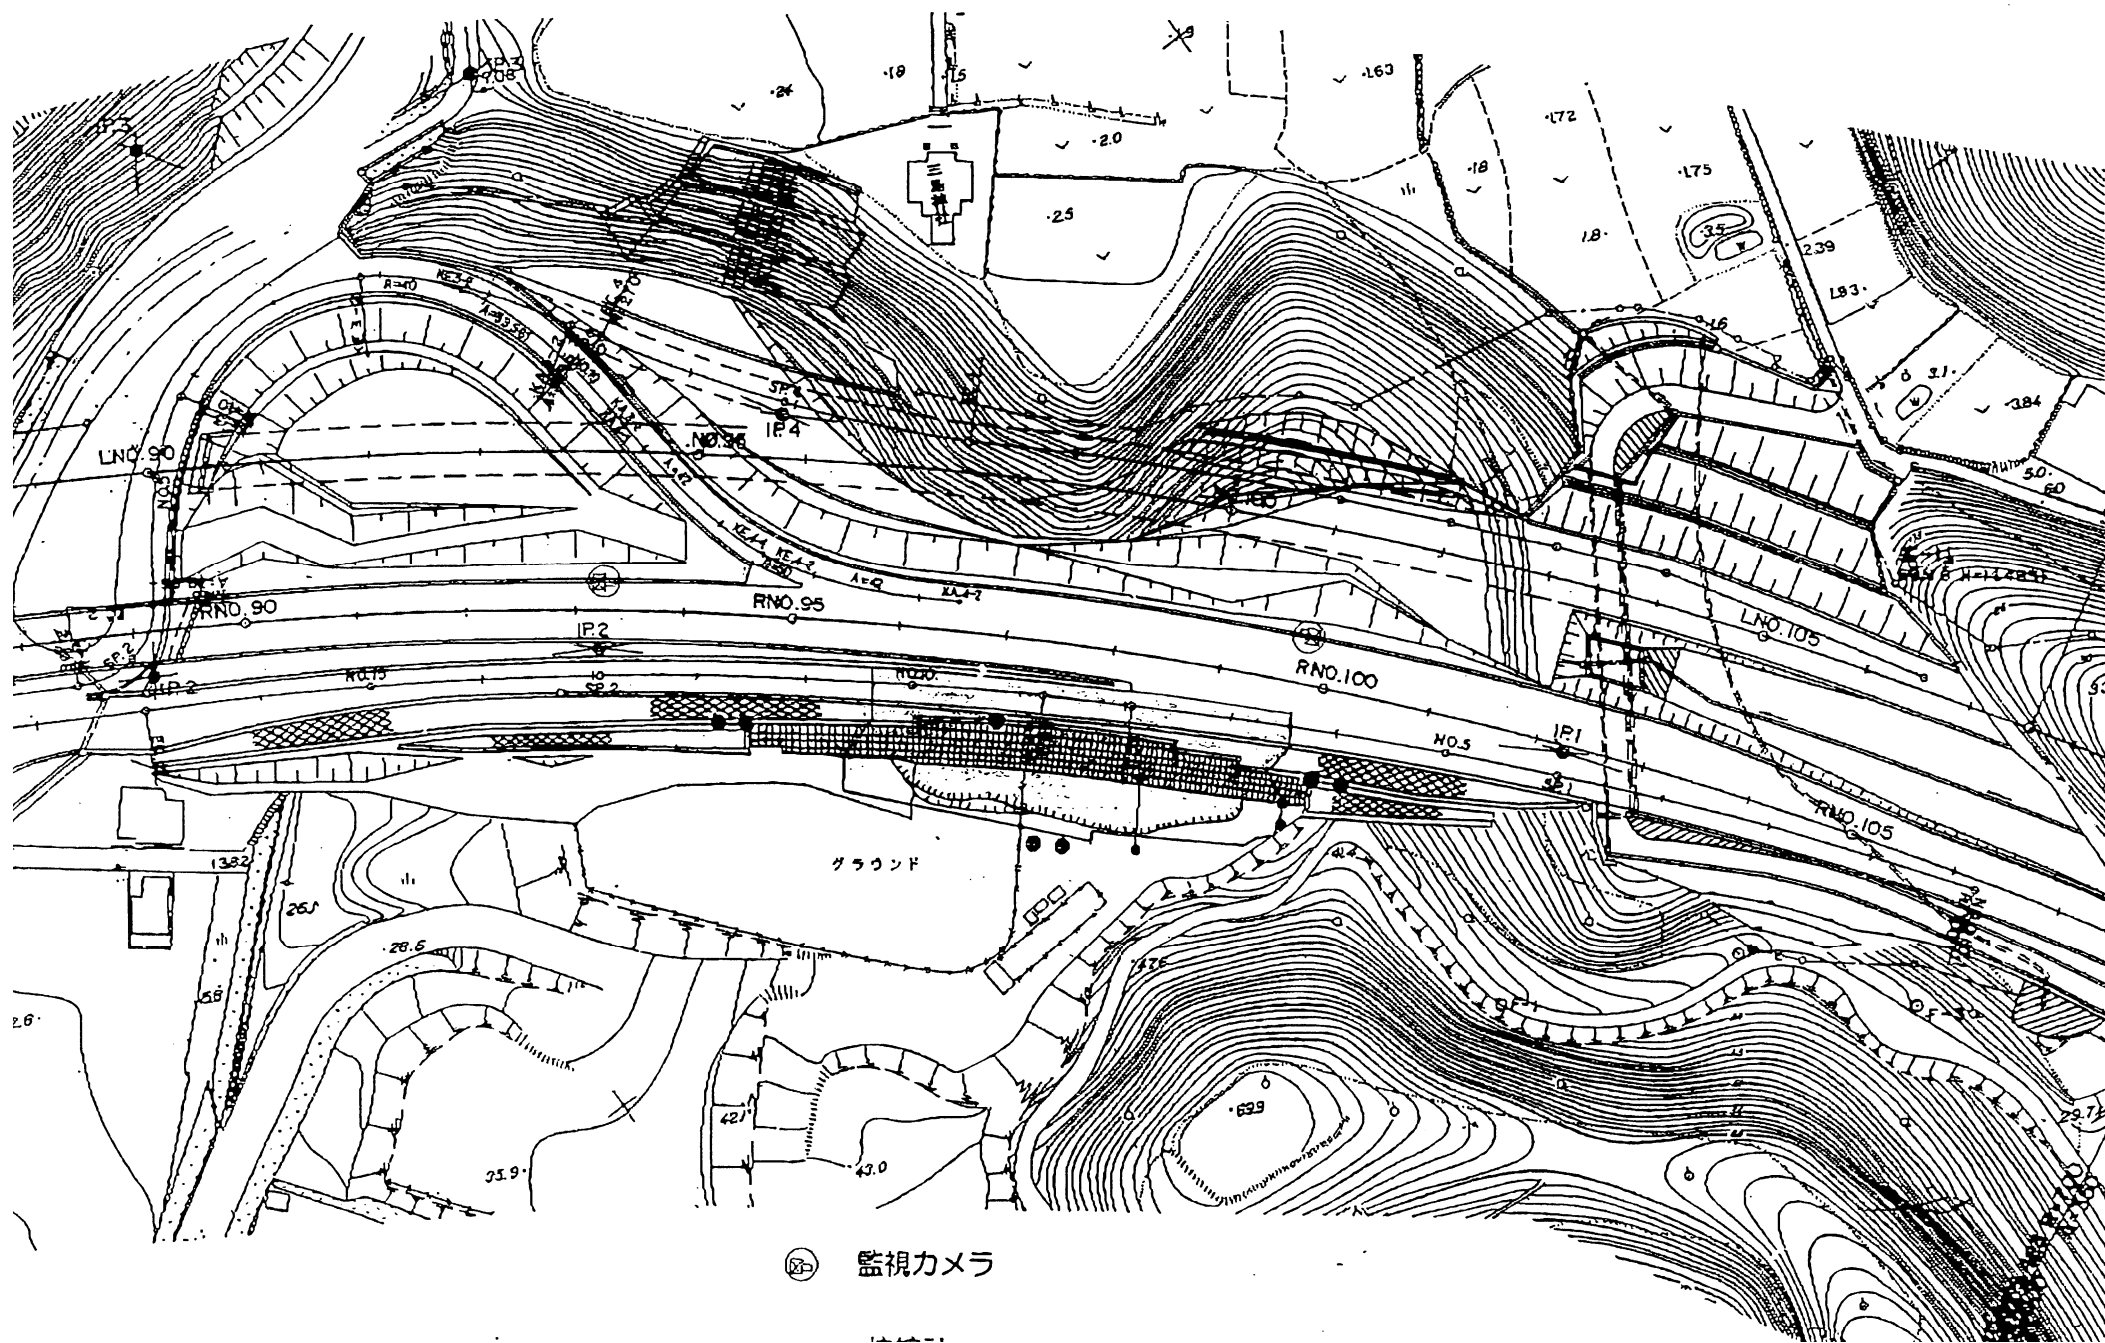

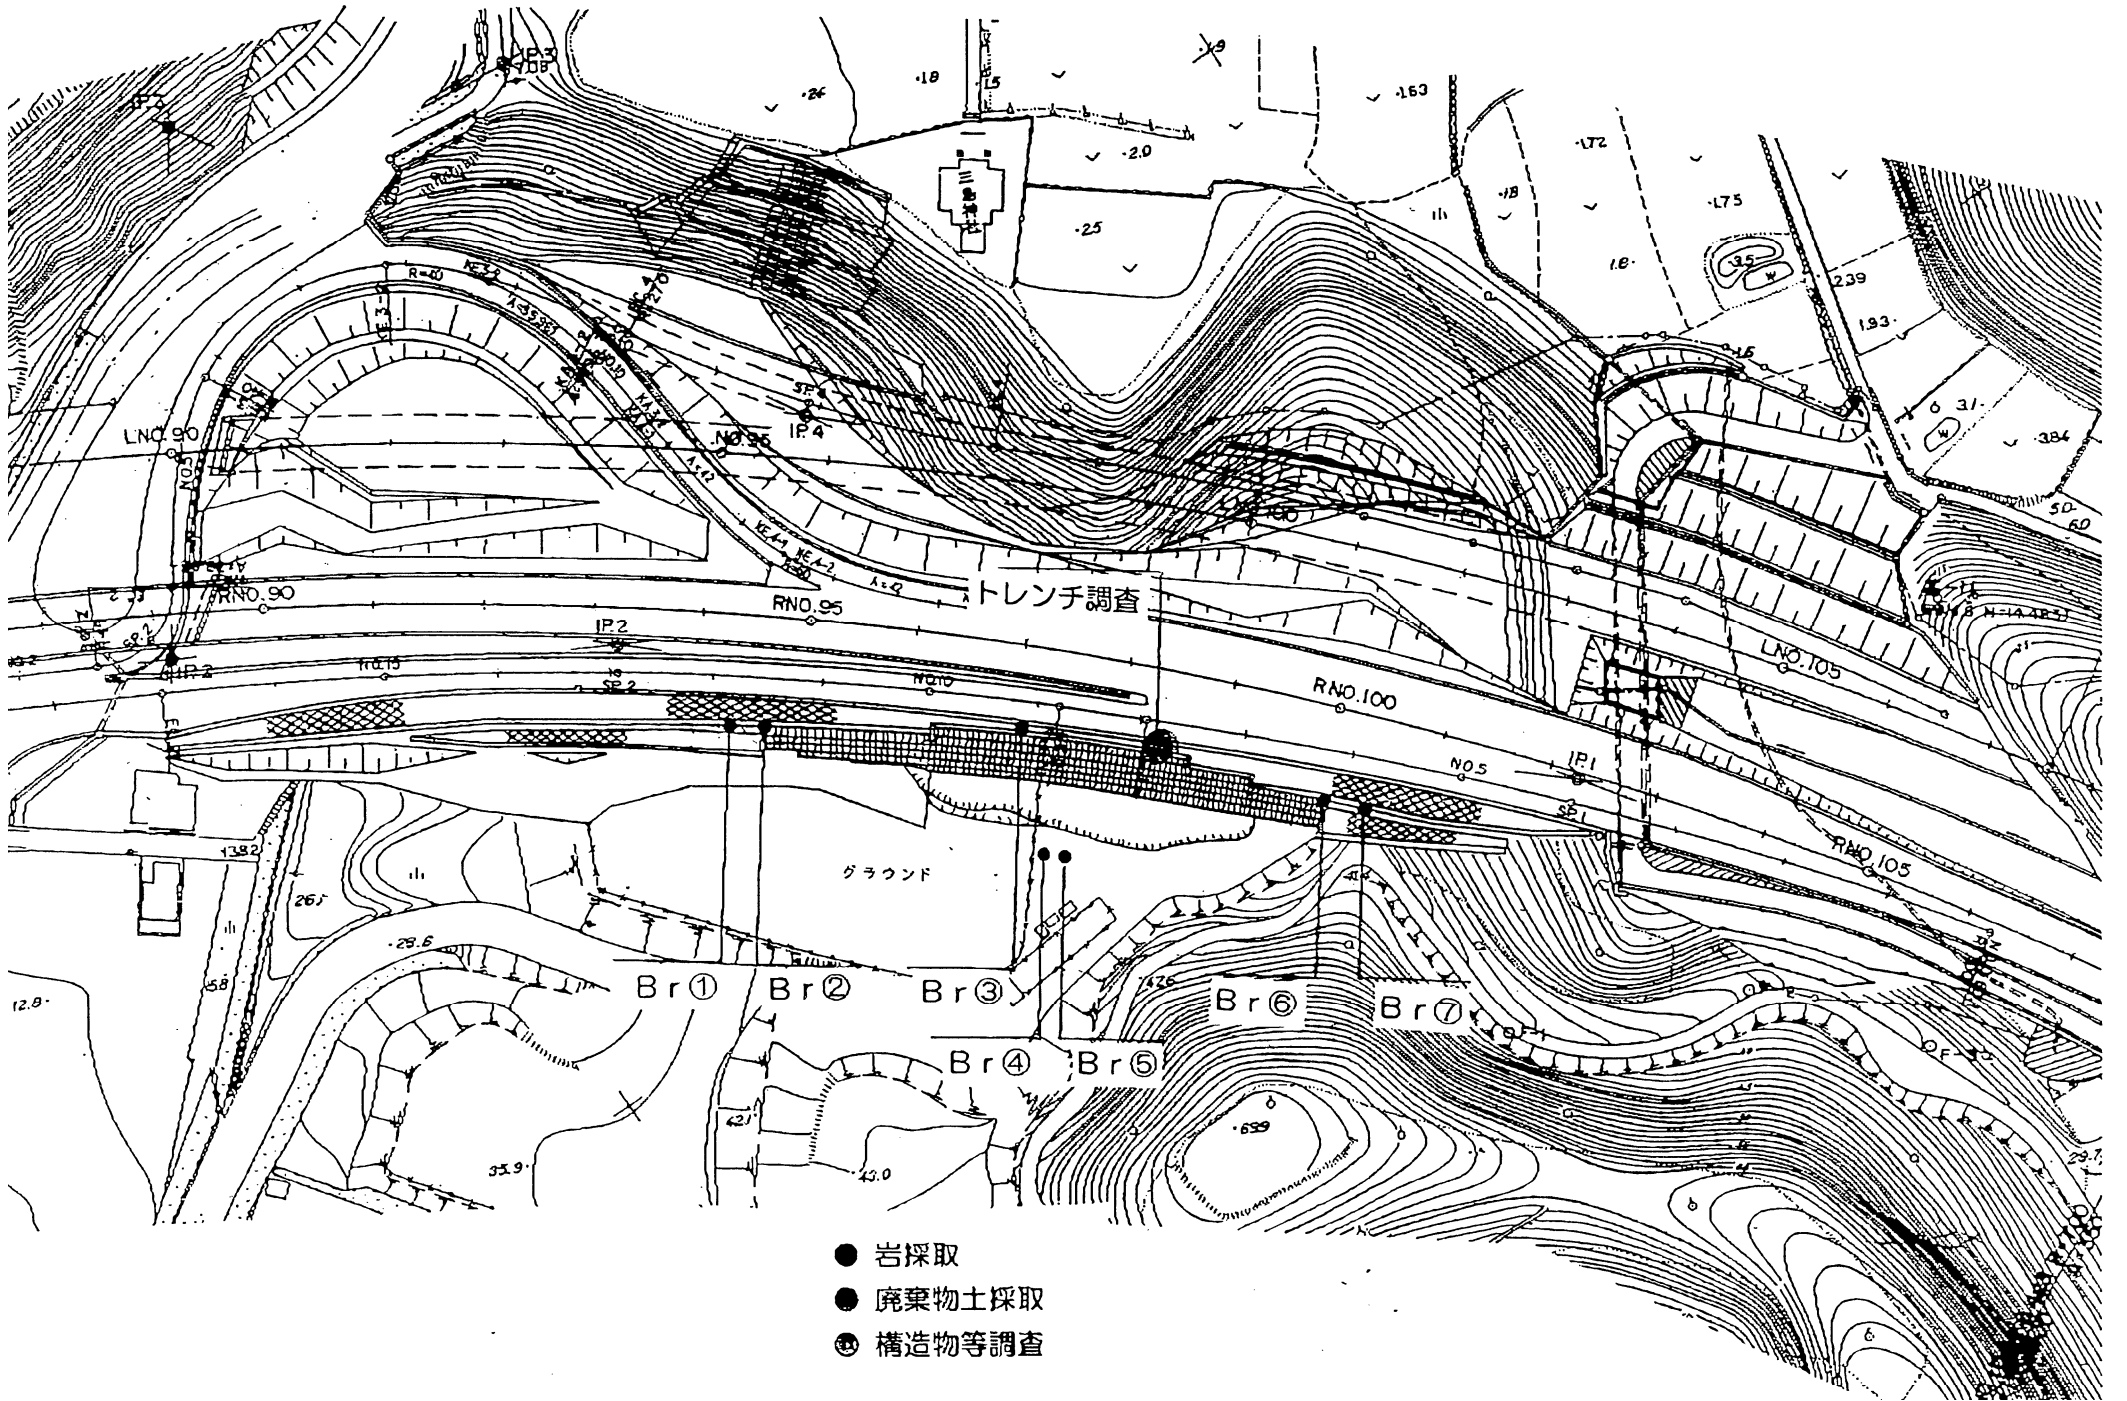

- 岩採取
- 廃棄物土採取
- ⊙ 構造物等調査





