
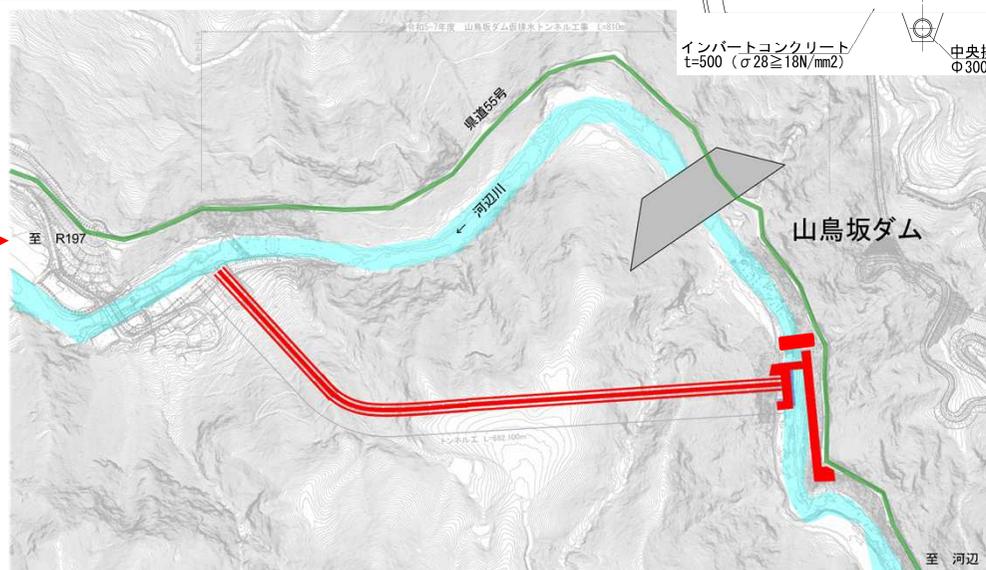


■ 令和5-7年度 山鳥坂ダム仮排水トンネル工事
 工事場所：愛媛県大洲市山鳥坂 工期：R5.7.25 ~ R8.3.31

工事概要

工事延長 L=810m
 道路土工 一式 トンネル工(発破工法) 一式 インバート工 一式 坑内付帯工 一式
 坑門工 一式 掘削補助工 一式 上流一次締切 一式 上流二次締切 一式
 道路附属物工 一式 構造物撤去工 一式 仮排水路閉塞設備 一式 仮設工 一式

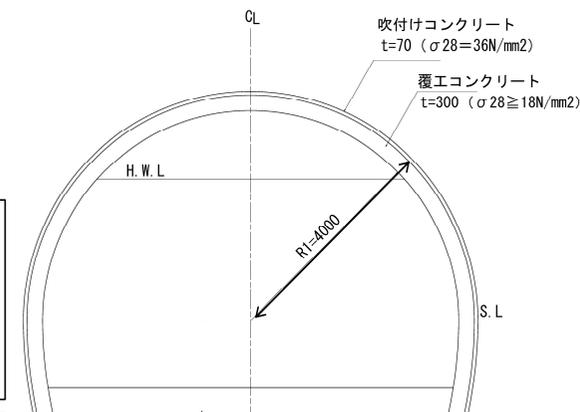

第三者チェックの該当項目

変更見込額の合計が当初の請負金額以上となるもの

工事変更の内容

インバート工増 坑内付帯工増 坑門工増 仮設工増
 仮排水路閉塞設備追加

工事変更の理由

- ・現地伐採後の現場状況による事故予防安全対策として工法変更
- ・河川水の濁水流出防止のため、当初の計画に加え水替え工追加
- ・ダム湛水開始方法の計画変更による水密性確保のため同時施工の必要性による追加

等による変更



トンネル内作業状況
