


■ 令和4～7年度 野村ダム施設改良工事  
 工事場所：愛媛県西予市野村町野村 工期：R5.2.10～R8.3.27

## 工事概要

工事延長 L=170m  
 土工 一式 右岸下流法面工 一式 増設放流設備工 一式 増設放流管充填工 一式  
 主ゲート基礎工 一式 予備ゲート基礎工 一式 増設減勢工 一式 施工設備仮設工 一式  
 作業構台工 一式 電気設備工 一式 仮設工 一式



右岸下流法面作業状況

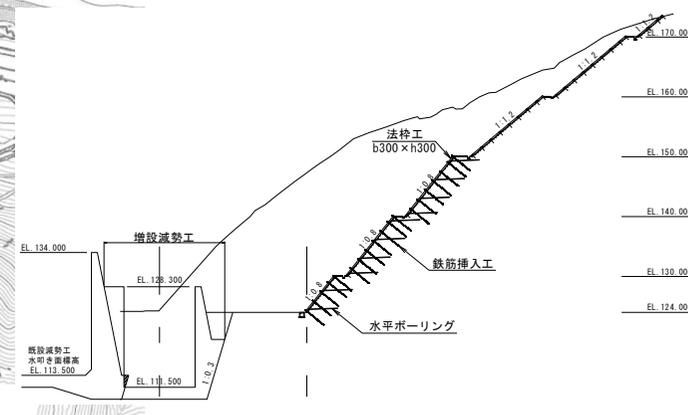

第三者チェックの該当項目	変更見込額の合計が当初の請負金額以上となるもの
工事変更の内容	残土処分量増 右岸下流法面工追加
工事変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当初予定していた残土処分場に搬出する予定であったが、減勢工の設計変更等により掘削量が増大し、遠方の処分場へ搬出する必要が生じたため。</li> <li>・右岸下流掘削法面において、亀裂を伴うゆるみが確認され、安全確保のために鉄筋挿入工を追加することとしたため。</li> </ul>
