

どきがわ
土器川直轄河川改修事業

事業再評価（案）

令和2年11月12日

国土交通省 四国地方整備局

目 次

| | |
|---------------------|----|
| 1. 事業の概要 | 1 |
| 1.1 流域の概要 | 1 |
| 1.2 事業経緯 | 2 |
| 1.2.1 河川整備基本方針 | 2 |
| 1.2.2 河川整備計画 | 2 |
| 1.3 事業概要 | 3 |
| 2. 事業の必要性等 | 7 |
| 2.1 事業を巡る社会経済情勢等の変化 | 7 |
| 2.1.1 災害発生時の影響 | 7 |
| 2.1.2 過去の災害実績 | 9 |
| 2.1.3 災害発生の影響度 | 10 |
| 2.1.4 地域開発の状況 | 11 |
| 2.1.5 地域の協力体制 | 12 |
| 2.1.6 関連事業との整合性 | 12 |
| 2.2 事業の投資効果 | 13 |
| 2.2.1 費用対効果分析 | 13 |
| 2.2.2 感度分析 | 17 |
| 2.3 事業の進捗状況 | 19 |
| 3. 事業の進捗の見込み | 20 |
| 3.1 全体事業 | 20 |
| 3.2 当面の対策 | 20 |
| 4. コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 23 |
| 5. 環境への取り組み | 24 |
| 6. 被害指標分析の実施（試行） | 25 |
| 7. 対応方針（原案） | 27 |

1. 事業の概要

1.1 流域の概要

土器川は、香川県中央部に位置する幹川流路延長 33km、流域面積 127km² の一級河川である。その流路は、香川県仲多度郡まんのう町勝浦の讃岐山脈を水源とし、明神川を合流後に北西に流れ、まんのう町炭所西常包にて讃岐平野に出る。その後、大柞川、古子川、清水川等を合わせ、丸亀市において瀬戸内海に注ぐ。

その流域は、南北に長く帯状を呈し、香川県の丸亀市、まんのう町の1市1町からなり、流域内の拠点都市である丸亀市は、人口や資産が集中する香川県第二の都市である。また、この地域は、扇状地を形成する讃岐平野に水稲や畑作を中心とする田園地帯が広がり、臨海部では第二次産業の集積が見られるなど、この地域における社会・経済・文化の基盤をなしている。

表 1.1 土器川流域の概要

| 項目 | 内容 |
|-------------|--------------------------|
| 流域面積（集水面積） | 127km ² |
| 流路延長 | 33km（うち直轄管理区間 18.85km） |
| 流域内市町村 | 丸亀市、まんのう町 |
| 流域内人口 | 約 3.9 万人（平成 22 年河川現況調査） |
| 想定氾濫危険区域内人口 | 約 12.1 万人（平成 22 年河川現況調査） |
| 年平均降雨量 | 約 1,200mm 程度 |
| 流域の主な産業 | 農業、製造業 |

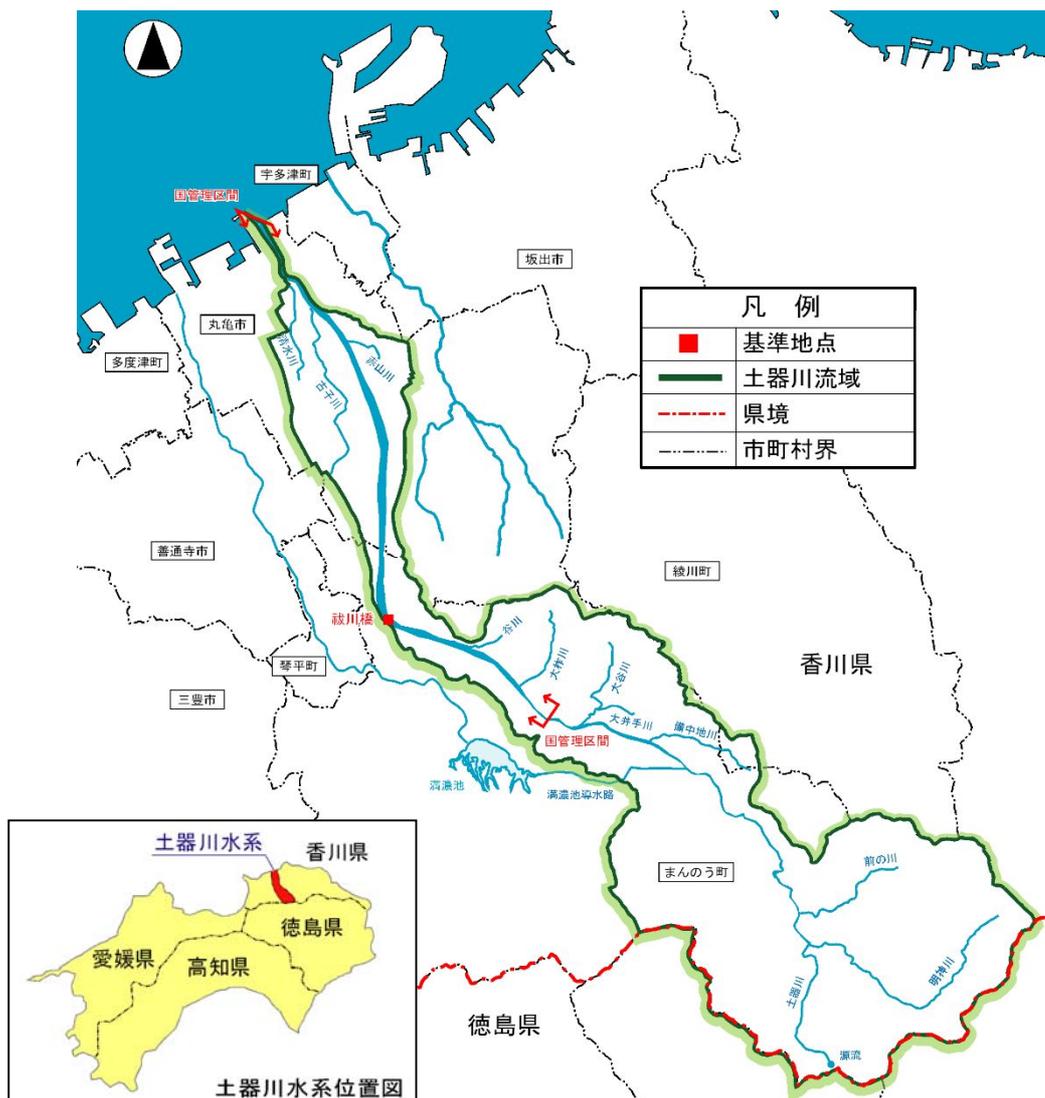


図 1.1 土器川流域図

1.2 事業経緯

土器川水系では、平成 19 年 8 月に河川整備基本方針が策定され、これに基づき、「安全で、安心できる川づくり／地域と一体となった土器川の河川環境の保全／人々が憩い・楽しむ・学べる川づくり」の 3 つを基本理念として、今後概ね 30 年程度の間実施する具体的な河川整備の内容を定める「土器川水系河川整備計画（国管理区間）」を平成 24 年 9 月 4 日に策定した。

1.2.1 河川整備基本方針

土器川水系河川整備基本方針は、平成 19 年 8 月に策定された。この中で基本高水ピーク流量は、基準地点祓川橋において $1,700\text{m}^3/\text{s}$ とし、これを河道に配分するとしている。

表 1.2 基本高水のピーク流量等一覧表

| 河川名 | 基準地点 | 基本高水のピーク流量 (m^3/s) | 高水調節施設による調節流量 (m^3/s) | 河道への配分流量 (m^3/s) |
|-----|--------------|---|--|---------------------------------------|
| 土器川 | はらいかわ 祓川橋 | 1,700 | 0 | 1,700 |



図 1.2 土器川水系計画高水流量配分図

1.2.2 河川整備計画

土器川水系河川整備計画は、平成 24 年 9 月に策定され、概ね 30 年間で実施する河川整備と維持管理の内容について定められた。この中で、戦後最大流量を記録した平成 16 年 10 月の台風 23 号と同規模の洪水を安全に流下させるとともに、上下流の治水安全度のバランスを確保し、基準地点祓川橋より下流において $1,250\text{m}^3/\text{s}$ の洪水を安全に流下させるとしている。

表 1.3 河川整備において目標とする流量

| 河川名 | 基準地点 | 基本高水のピーク流量 (m^3/s) | 高水調節施設による調節流量 (m^3/s) | 河道への配分流量 (m^3/s) |
|-----|------|---|--|---------------------------------------|
| 土器川 | 祓川橋 | 1,250 | 0 | 1,250 |

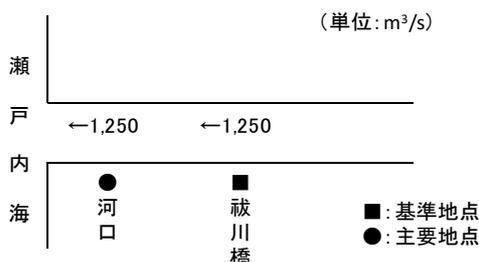


図 1.3 土器川水系河道目標流量配分図

1.3 事業概要

土器川水系河川整備計画では、河川整備基本方針で定めた目標に向けて、上下流の治水安全度のバランスを確保しつつ段階的かつ着実に整備を進め、洪水による被害に対する安全性の向上を図る。

- ・安全な洪水流下への対応として、引堤、河道掘削、堤防拡幅、河岸掘削、樹木伐開等の整備を実施する。
- ・局所的な深掘れ及び河岸侵食への対応として、低水路拡幅、水衝部の根固等による対策を実施する。
- ・浸透に対する堤防補強対策、大規模地震に対する河川構造物の対策等を必要に応じて対応する。
- ・治水対策により、戦後最大流量を記録した平成 16 年 10 月の台風 23 号と同規模の洪水を安全に流下させるとともに、上下流の治水安全度のバランスを確保し、基準地点祓川橋より下流において 1,250m³/s の洪水を安全に流下させる。

【土器川水系河川整備計画諸元等】

- ・河道整備流量 1,250m³/s（祓川橋地点）
- ・対象区間 国管理区間（河口～18.85km）
- ・事業期間 平成 21 年度～令和 22 年度（32 年間）
- ・総事業費 約 156 億円
- ・主な工種 引堤（橋梁架替含む）、河道掘削、堤防整備（堤防拡幅、堤防強化）、局所洗掘対策、河床安定化対策、河岸掘削、樹木伐開 等



図1.4 事業実施箇所の位置図

(1) 対象事業の概要

1) 洪水を安全に流下させるための対策

下流部に位置する資産集積地区の河道湾曲区間は、中流部に比べて川幅が狭いため、相対的に下流部の治水安全度が低い。このため、河川整備基本方針の目標に向けた整備段階における下流への流量増大の負担を回避し、上下流の治水安全度のバランスを図るため、引堤とそれに伴う橋梁改築及び河道掘削による整備を進める。

また、沿川に人口・資産が集中している下流域の一部区間の堤防は、洪水を安全に流下させるために必要な堤防の断面幅が不足しているため、堤防が決壊した場合には甚大な被害が想定されることから、堤防整備を進める。

中流域の固定堰により洪水流下を阻害している箇所では、洪水を安全に流下させるために必要な流下断面を確保するための対策を進める。

さらに、国管理区間上流の掘込河道部は、現在も改修が未着手のため、近年でも水があふれ（溢水氾濫）住民の自主避難実績もあることから、河岸掘削及び樹木抜開により流下断面を確保するための整備を進める。

①引堤とそれに伴う橋梁改築及び河道掘削の実施

下流部に位置する資産集積地区の河道湾曲区間は、中流部に比べて川幅が狭いため、相対的に下流部の治水安全度が低い。このため、河川整備基本方針の目標に向けた整備段階における下流への流量増大の負担を回避し、上下流の治水安全度のバランスを図るため、引堤とそれに伴う橋梁改築及び河道掘削による整備を進め、河道整備流量 1,250m³/s を安全に流下させるための整備を実施する。

②河岸掘削及び樹木伐開の実施

国管理区間上流の掘込河道部は、現在も改修が未着手のため、近年でも水があふれ（溢水氾濫）住民の自主避難実績もあることから、河岸掘削による河道拡幅及び樹木伐開を実施する。

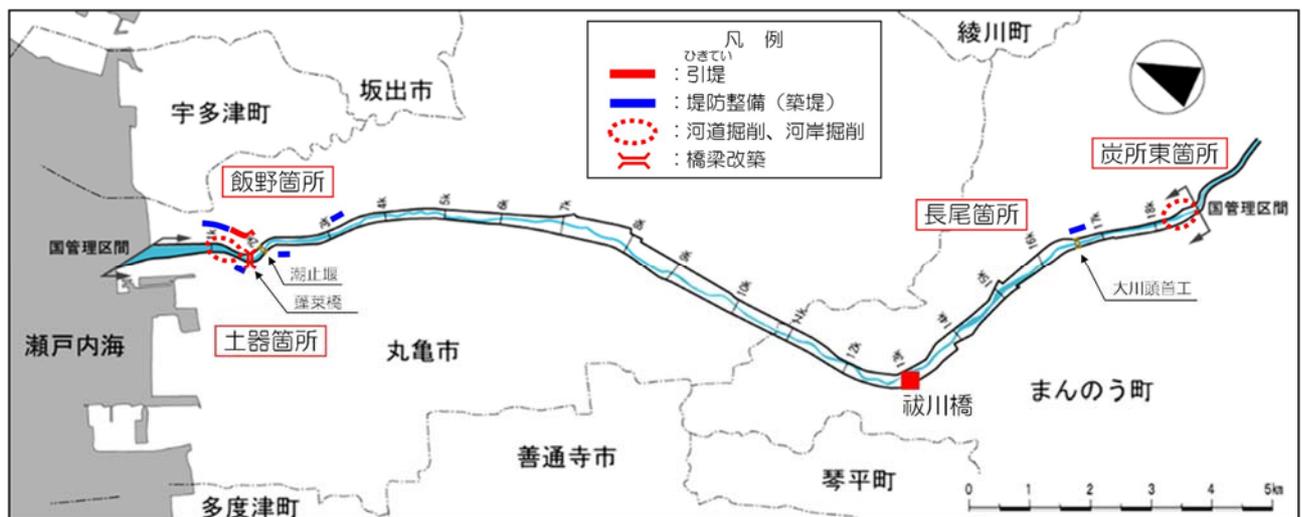


図 1.5 洪水を安全に流下させるための対策を実施する箇所

③堤防整備（築堤）

沿川に人口・資産が集中している下流域の一部区間の堤防は、洪水を安全に流下させるために必要な堤防の断面幅が不足しているため、堤防が決壊した場合には甚大な被害が想定されることから、堤防整備を進める。

また、長尾箇所の大川頭首工右岸側の堤防は、洪水を流下させるために必要な堤防断面幅が不足しているため、堤防断面の拡幅を実施する。なお、固定堰の大川頭首工は、洪水を流下させるために必要な流下断面を阻害しているため、施設管理者（香川県）と改善に向けた調整を行う。




図 1.6 堤防整備（築堤）イメージ図

2) 局所的な深掘れ及び河岸侵食対策

局所的な深掘れや河岸侵食に対して著しく安全性が低い区間については、危険性の解消に向けた対策及び低水路拡幅によって緩和するとともに、水衝部の根固等の工法を適切に組み合わせた整備を計画的に実施し、堤防の決壊にともなう甚大な浸水被害を防止する。

また、土器川の特徴である洪水規模の大小に関わらず至る所で発生する河岸侵食や堤防侵食に対しては、発生状況を注視し、危険性が高いと判断される箇所は、必要に応じて対策を実施する。

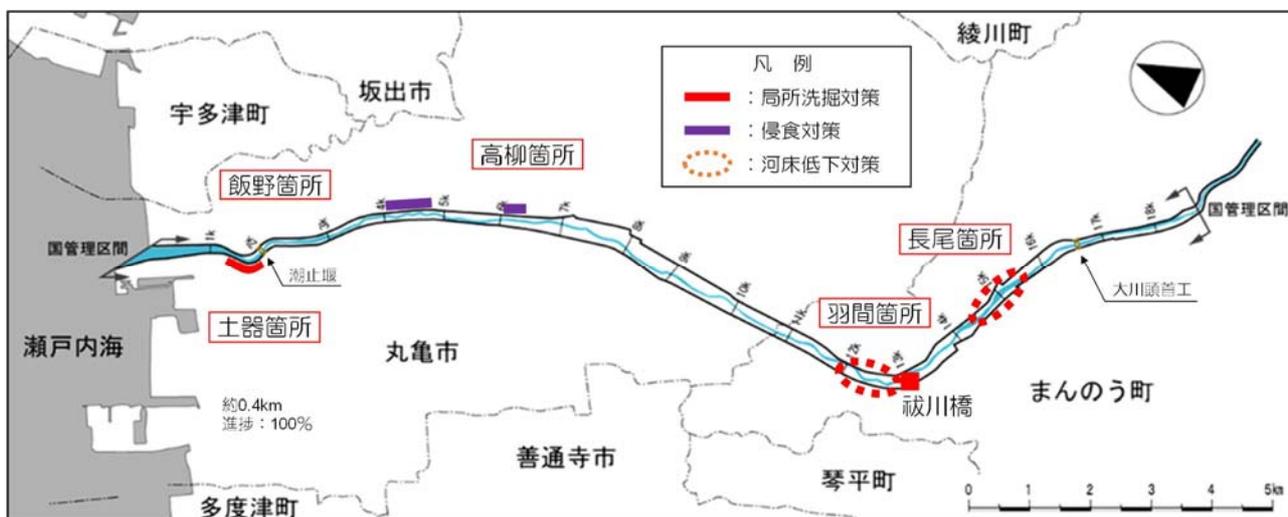


図 1.7 局所的な深掘れ及び河岸侵食対策を実施する箇所




図 1.8 河岸侵食対策イメージ図

3) 安全性が不足する堤防への対応

①堤防強化対策（浸透・パイピング対策）

堤防整備区間において、洪水時の雨水や河川水の堤防への浸透に対する安全性の点検の結果を踏まえ、堤防の安全性が不足する箇所については、危険性の解消に向けた堤防補強等の対策を必要に応じて実施し、堤防の決壊にとまなう甚大な浸水被害を防止する。

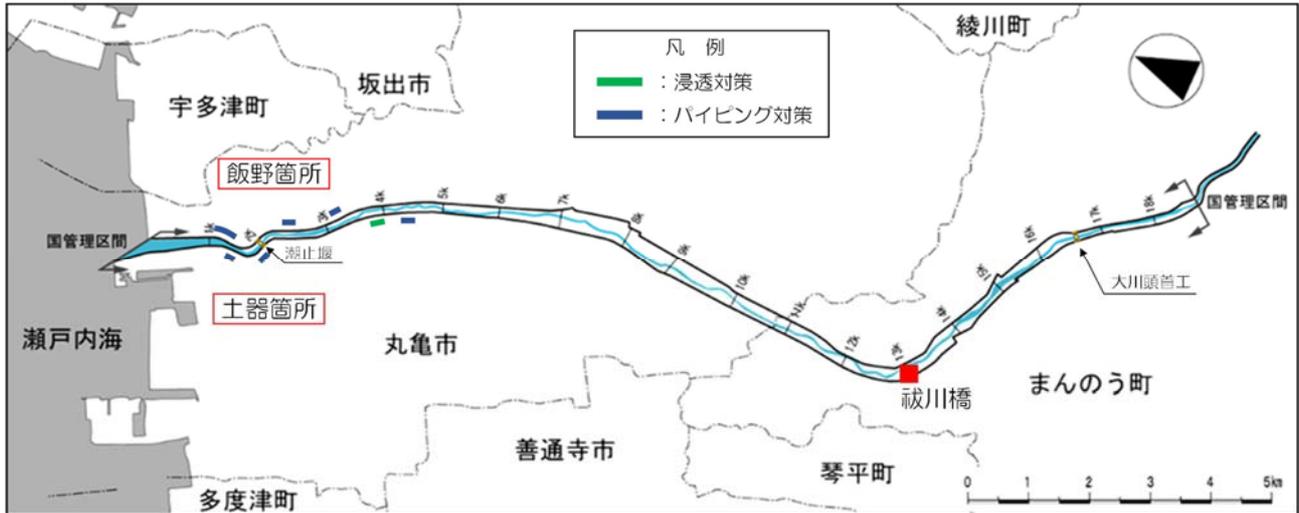


図 1.9 堤防の浸透・パイピング対策を実施する箇所

②施設の能力を上回る洪水等を想定した対策（危機管理型ハード対策）

施設の能力を上回る洪水が発生し堤防の決壊等により氾濫が生じた場合でも、被害の最小化を図るため、危機管理型ハード対策として、越水等が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する対策を実施する。

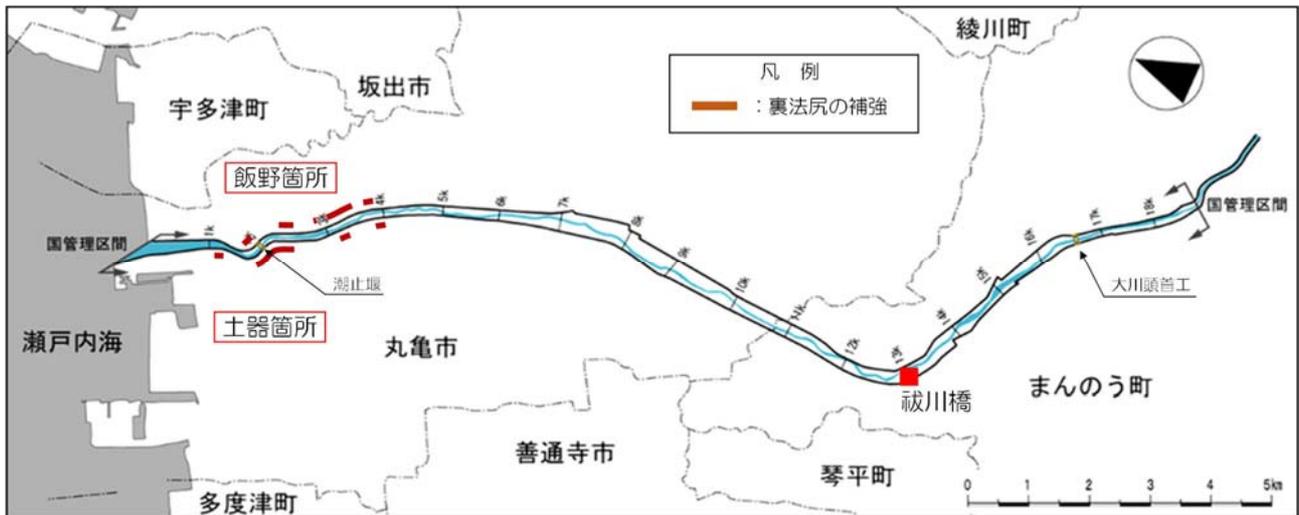


図 1.10 危機管理型ハード対策を実施する箇所

4) 大規模地震への対応

今世紀前半に発生する可能性が高いとされる東南海・南海地震等のプレート境界型の地震等も含めた現在から将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震動も想定に加え、保持すべき機能に応じてある程度の損傷を許容するなどの考え方を踏まえて、地震時における河川構造物への影響を検討する。その結果、地震後の津波や洪水等により甚大な浸水被害の発生が予想される河川構造物については、必要な対策を実施する。

2. 事業の必要性等

2.1 事業を巡る社会経済情勢等の変化

2.1.1 災害発生時の影響

土器川国管理区間下流部に広がる扇状地は、地盤高が土器川の計画規模の洪水時における水面より低く、想定氾濫区域が流域界を越えて人口・資産が集中している丸亀市や宇多津町の中心市街までおよぶ。そのため、堤防の決壊時に想定される被害は甚大である。

しかし、資産集積地区の下流部は、中流部に比べて川幅が狭く洪水の流下断面が不足しているため、相対的に治水安全度が低くなっていると同時に、下流部の堤防は、洪水を安全に流下させるために必要な堤防の高さや断面幅が大きく不足している箇所があり、治水安全度向上の治水対策が必要である。

また、国管理区間上流端の掘込河道区間は、川幅が著しく狭い上に河道内樹木の繁茂により、洪水の流下断面が不足し、過去に溢水氾濫を繰り返しているため、治水安全度向上の治水対策が必要である。

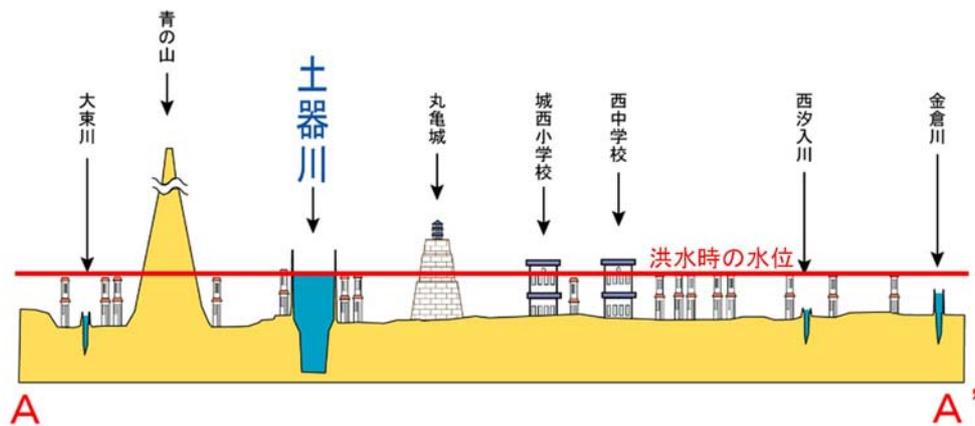


図 2.1 土器川の氾濫域の概略横断面図

2.1.2 過去の災害実績

土器川では、戦後、計画高水流量規模を越える大規模な洪水は発生していないが、戦後最大規模（祓川橋地点で約1,000m³/s 超過）の洪水が3度発生しているとともに、流量規模を問わず、いたる所で護岸崩壊、河岸侵食等の被害が頻発し、災害復旧を繰り返している。

特に、土器川の国管理区間は、扇状地における有堤区間のため、堤防決壊が生じた場合の氾濫被害は広範囲に拡散し、被害ポテンシャルは大きい。また、国管理区間の上流端の掘込河道区間は川幅が著しく狭いため、現在も溢水氾濫を繰り返している。

表 2.1 過去の浸水被害実績

| 洪水発生年月日 | 発生原因 | 祓川橋地点 | 川奥地点 | 被害状況 |
|-----------------|--------|------------------------------|-------------------|--|
| | | ピーク流量 (m ³ /s) | 6時間雨量 (mm/6hr) | |
| 昭和24年 7月28日 | ヘスター台風 | — | — | 県下：床上浸水 10戸、床下浸水 243戸 |
| 昭和29年 9月13日 | 台風13号 | — | — | 県下：死者 1人、被災者 2,180人 |
| 昭和47年 9月16日 | 台風20号 | — | 155 | 土器川：護岸崩壊 7カ所 県下：床上浸水 1,344戸、床下浸水 8,764戸 |
| 昭和50年 8月23日 | 台風 6号 | 約1,020 (戦後第2位) | 211 | 土器川：護岸崩壊 23カ所（内、河岸侵食 7ヶ所） 溢水はん濫：2ha、乙井橋流出 県下：床上浸水 168戸、床下浸水 2,308戸 |
| 昭和51年 9月12日 | 台風17号 | 約 480 | 73 | 土器川：護岸崩壊 12カ所（内、堤防侵食 1ヶ所） ・右岸14k/9付近の堤防断面の約50%が侵食 県下：床上浸水 4,513戸、床下浸水 16,864戸 |
| 昭和54年 9月30日 | 台風16号 | 約 800 | 239 | 土器川：護岸崩壊 2カ所、局所洗掘 1ヶ所 県下：床上浸水 33戸、床下浸水 2,178戸 |
| 昭和54年 10月19日 | 台風20号 | 約 420 | 74 | 土器川：河岸侵食 県下：床上浸水 2戸、床下浸水 748戸 |
| 昭和62年 10月17日 | 台風19号 | 約 450 | 134 | 土器川：護岸崩壊 13カ所 県下：床上浸水 3,458戸、床下浸水 15,007戸 |
| 平成 2年 9月19日 | 台風19号 | 約1,010 (戦後第3位) | 232 | 土器川：護岸崩壊 8カ所 溢水はん濫 2ha、野津床止護床工被災 支 川：床上浸水 79戸、床下浸水 160戸 県下：床上浸水 116戸、床下浸水 1,748戸 |
| 平成 9年 7月26日 | 台風 9号 | 約 590 | 151 | 土器川：護岸崩壊 4カ所 県下：床下浸水 5戸 |
| 平成13年 8月21日 | 台風11号 | 約 630 | 122 | 土器川：護岸崩壊 8カ所 県下：床下浸水 1戸 |
| 平成16年 9月30日 | 台風21号 | 約 590 | 121 | 土器川：護岸崩壊 2カ所 県下：床上浸水 46戸、床下浸水 240戸 |
| 平成16年 10月20日 | 台風23号 | 約1,040 (戦後最大) | 171 | 土器川：護岸崩壊 2カ所 溢水はん濫 0.2ha、満濃大橋橋脚周辺洗掘 支 川：床上浸水 75戸、床下浸水 142戸 県下：床上浸水 294戸、床下浸水 1,486戸 |
| 平成17年 7月2日 | 梅雨前線 | 約 670 | 162 | 土器川：護岸崩壊 2カ所 県下：床上浸水 7戸、床下浸水 436戸 |
| 平成23年 9月2日 | 台風12号 | 約 640 | 59 | 県下：床上浸水 18戸、床下浸水 372戸 |
| 平成29年 9月17日 | 台風18号 | 約 530 | 150 | 土器川：河岸侵食・根固流失 3カ所 |



昭和 50 年 8 月乙井橋流失(本村箇所)



平成 2 年 9 月野津床止被災(長尾箇所)



平成 16 年 10 月溢水浸水(炭所西箇所)

図 2.3 過去の洪水での被害状況写真

2.1.3 災害発生の影響度

土器川では、河川整備計画目標流量規模相当（平成 16 年 10 月洪水規模，祓川橋 1,250m³/s）が発生した場合、事業実施前では、浸水面積約 560ha、浸水家屋数約 8,700 戸等の被害が想定されるが、河川整備計画に計上されている事業の完成後には、浸水面積約 0ha、浸水家屋数 0 戸と大幅に軽減される。


＜土器川水系河川整備計画の目標＞

- ・戦後最大流量を記録した平成 16 年 10 月の台風 23 号と同規模の洪水を流下させるとともに、上下流の治水安全度のバランスを確保する

＜想定される被害状況＞

表 2.2 河川整備計画目標流量による氾濫被害

| | 【事業実施前】 平成 21 年河道状況 | 【事業実施後】 整備計画河道 |
|-----------|------------------------|-------------------|
| 浸水面積 | 556 ha | 0 ha |
| 浸水家屋数（床上） | 6,328 戸 | 0 戸 |
| 浸水家屋数（床下） | 2,348 戸 | 0 戸 |

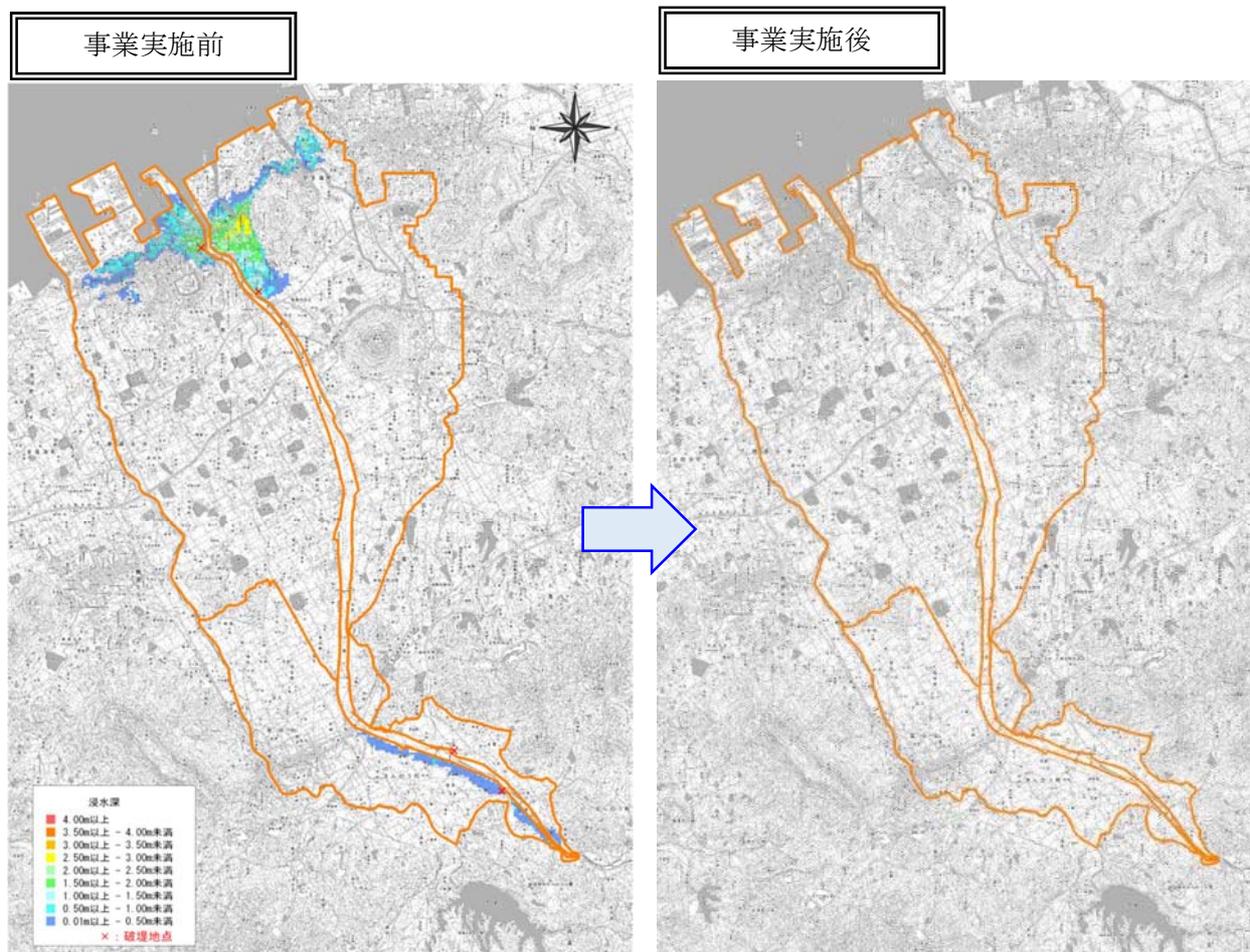

整備計画目標流量規模の被害

※最大被害となる氾濫ブロック内 1 破堤ケースを集計

図 2.4 河川整備計画目標流量（H16.10 洪水台風 23 号と同規模）での事業効果

2.1.4 地域開発の状況

国管理区間の氾濫区域は、中讃地区の中心を担う丸亀市があり、国道11号や国道32号、本州四国連絡橋の瀬戸大橋、高松自動車道に加え、JR予讃線、JR土讃線、瀬戸大橋線が連結し、四国の交通拠点かつ四国と本州とを結ぶ重要な要所となっている。また、沿岸部には、国内外でトップシェアを誇る企業の工場が立地している。

流域内人口は、約3.9万人（平成22年時点）と近年の推移は横ばいにあるが、想定氾濫区域内人口は流域内人口の約3倍の約12万人（平成22年時点）で増加傾向にある。また、流域及び想定氾濫区域の土地利用は、農地が減少している一方、市街地が増加している。

これらにより、今後も氾濫域内の高度化（宅地開発、企業誘致、市街地化）が見込まれ、土器川の治水整備の重要性はさらに高まるものと考えられる。

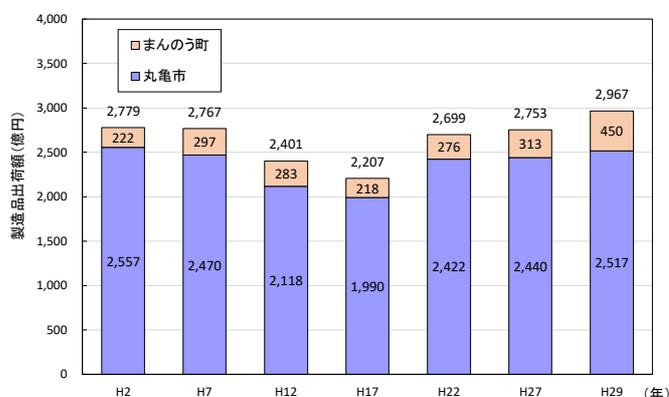
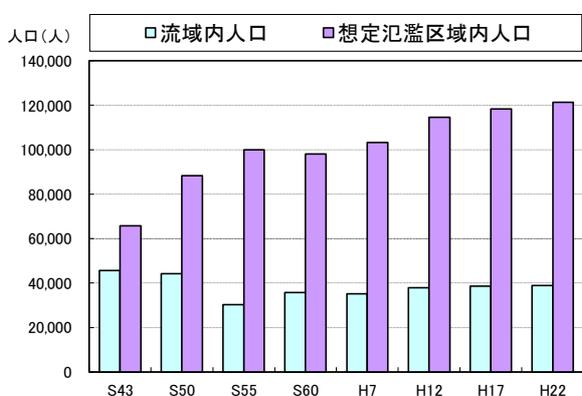


図 2.5 流域及び想定氾濫区域内の人口の推移 図 2.6 丸亀市、まんのう町の製造品出荷額の推移

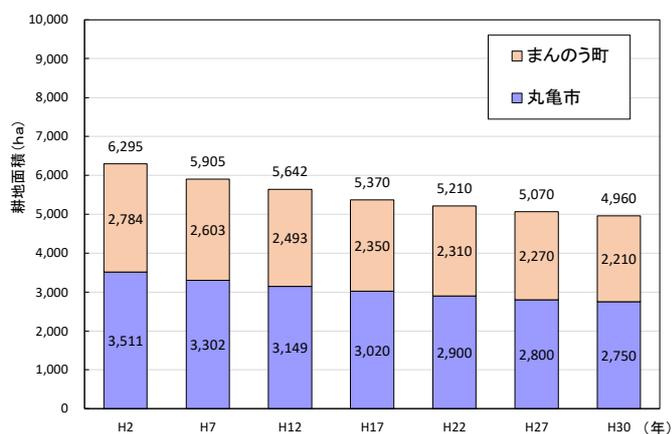


図 2.7 丸亀市、まんのう町の耕地面積の推移

表 2.3 土器川流域の代表的な工業製品

| 主な製品 | シェア等 |
|------------------------------|--------|
| フェンス（立入防止柵、落石防止柵、一般家庭用フェンス等） | 国内一生産量 |
| 不溶性硫黄、タフエース | 国内一生産量 |
| 工業用ゴムホース | 国内一生産量 |
| 電柱 | 四国一生産量 |

2.1.5 地域の協力体制

地元沿川自治体による「土器川改修期成同盟会（S43～）」から毎年、土器川の改修の促進の要望があり、これまでも、香川県、沿川の関係市町と協議して事業を進めている。

<地域との連携>

地域住民と協力して河川管理を推進するため、河川愛護モニターや「リフレッシュ「香の川」パートナーシップ」の関係団体、河川協力団体制度により指定した団体等を通じて、地域の人々へ河川に関する様々な情報を発信し、地域の取り組みと連携した河川整備・管理等を行い、事業に対する理解・協力を得ている。



図 2.8 河川清掃活動の様子



図 2.9 河川愛護モニター会議

2.1.6 関連事業との整合性

「水防災意識社会再構築ビジョン（水ビジョン）」に基づき、「土器川大規模氾濫に関する減災対策協議会」を平成 28 年 6 月に設立し、「土器川の減災に係る取組方針」を平成 28 年 8 月に策定している。

国、香川県、気象台、関係自治体 3 市 4 町の関係機関と連携し、減災のための取組項目の具体的な実施に向けて、ハード対策とソフト対策を一体的・計画的に継続して推進している。



図 2.10 土器川大規模氾濫に関する減災対策協議会の様子

2.2 事業の投資効果

2.2.1 費用便益分析

河川改修事業の費用対効果は、ダム改造による便益を除く河川改修による便益（洪水被害軽減額）と改修に要する費用（建設費と建設中及び建設後の維持管理費）を比較している。

洪水被害による便益は、「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」に基づき、河川改修により軽減される洪水規模ごとの被害額から年平均被害軽減期待額を算出している。

◇費用対効果算定期間

評価基準年度 令和2年度

事業整備期間 平成21年度～令和22年度（32年間）

評価対象期間

総費用算定期間：平成21年度～令和72年度（整備期間＋整備完了後50年間）

総便益算定期間：平成21年度～令和72年度（整備期間＋整備完了後50年間）

◇河川改修事業の総費用

①総事業費 156億円（税込）

残事業費 82億円（税込）

②事業費 152.1億円：①の過去の費用をデフレーターにより実質価値化した後、社会的割引率（4%）により現在価値化したもの

③維持管理費 1.7億円：現在価値化したもの

④総費用【C】 153.8億円：現在価値化したもの④＝②＋③

◇河川改修事業の総便益

⑤便益 2,971.6億円：現在価値化したもの

⑥残存価値 2.4億円：現在価値化したもの

⑦総便益【B】 2,974.0億円：現在価値化したもの⑦＝⑤＋⑥

●土器川直轄河川改修事業

全体事業：B/C=2,974.0億円/153.8億円=19.3・・・事業全体（対象期間：H21～R22）

残事業：B/C=1,575.2億円/56.7億円=27.8・・・事業全体（対象期間：R3～R22）

●マニュアルおよび技術指針に基づき事業の投資効率性を算出した結果は下表のとおり。

表 2.4 事業の投資効率性

| 項目 | 細別 | | 全体事業 (H21-R22) | 残事業 (R3-R22) | 摘要 |
|----------------|--------------|-------|-------------------|-----------------|----------------|
| 総費用 | 事業費[現在価値化] | ① | 152.1億円 | 55.1億円 | |
| | 維持管理費[現在価値化] | ② | 1.7億円 | 1.6億円 | 整備期間中の維持管理費を含む |
| | 総費用(C) | ③=①+② | 153.8億円 | 56.7億円 | |
| 総便益 | 便益[現在価値化] | ④ | 2,971.6億円 | 1,573.0億円 | |
| | 残存価値[現在価値化] | ⑤ | 2.4億円 | 2.2億円 | |
| | 総便益(B) | ⑥=④+⑤ | 2,974.0億円 | 1,575.2億円 | |
| 費用便益比(CBR) B/C | | | 19.3 | 27.8 | |
| 純現在価値(NPV) B-C | | | 2,820.2億円 | 1,518.5億円 | |
| 経済的内部収益率(EIRR) | | | 34% | 32% | |


●前回再評価時からの変化

表 2.5 前回評価時（H24年度）との費用対効果の比較


| 項目 | 前回再評価時(H24) | 今回再評価時(R2) | 備考 |
|----------------|-------------------|--------------------|--|
| | 全体事業 (H21-R22) | 全体事業 (H21-R22) | |
| 総費用(C) | 62億円 【98億円】 | 153.8億円 【156億円】 | ・費用の見直し ・整備スケジュールの変更 ・評価基準年の変更 等 |
| 総便益(B) | 1,531億円 | 2,974.0億円 | ・資産額の時点更新 ・便益算定条件の変更 ・評価基準年の変更 等 |
| 費用便益比 (B/C) | 24.6 | 19.3 | |

※総費用の上段は、基準年における「現在価値化」した総事業費（消費税を含まず）を示し、
下段【 】内は、「現在価値化」していない維持管理費を含まない総事業費（消費税含む）
を示す。

※総便益は、基準年における「現在価値化」したものを示す。

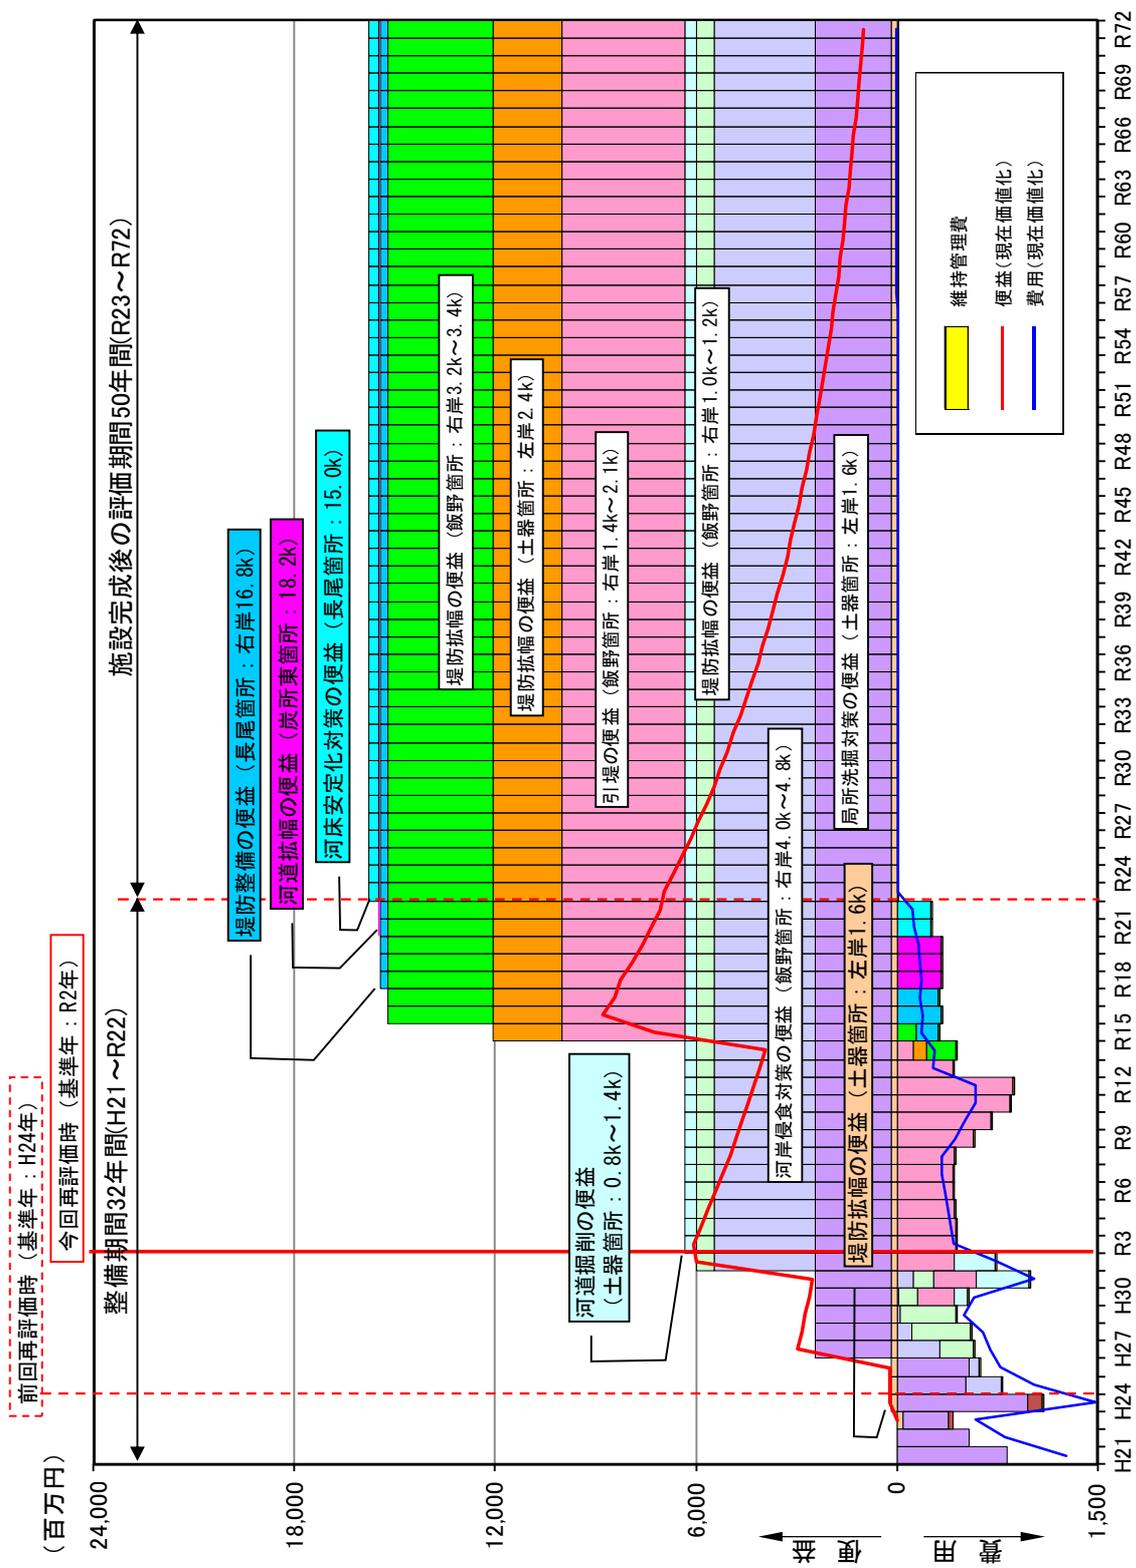

※平成28年度より便益の計上期間は、各対策後から整備計画完了まで計上 (前回は、各対策後50年間まで計上)
 図.11 土器川直轄河川改修事業の費用対効果分析結果 (全体事業) (年)

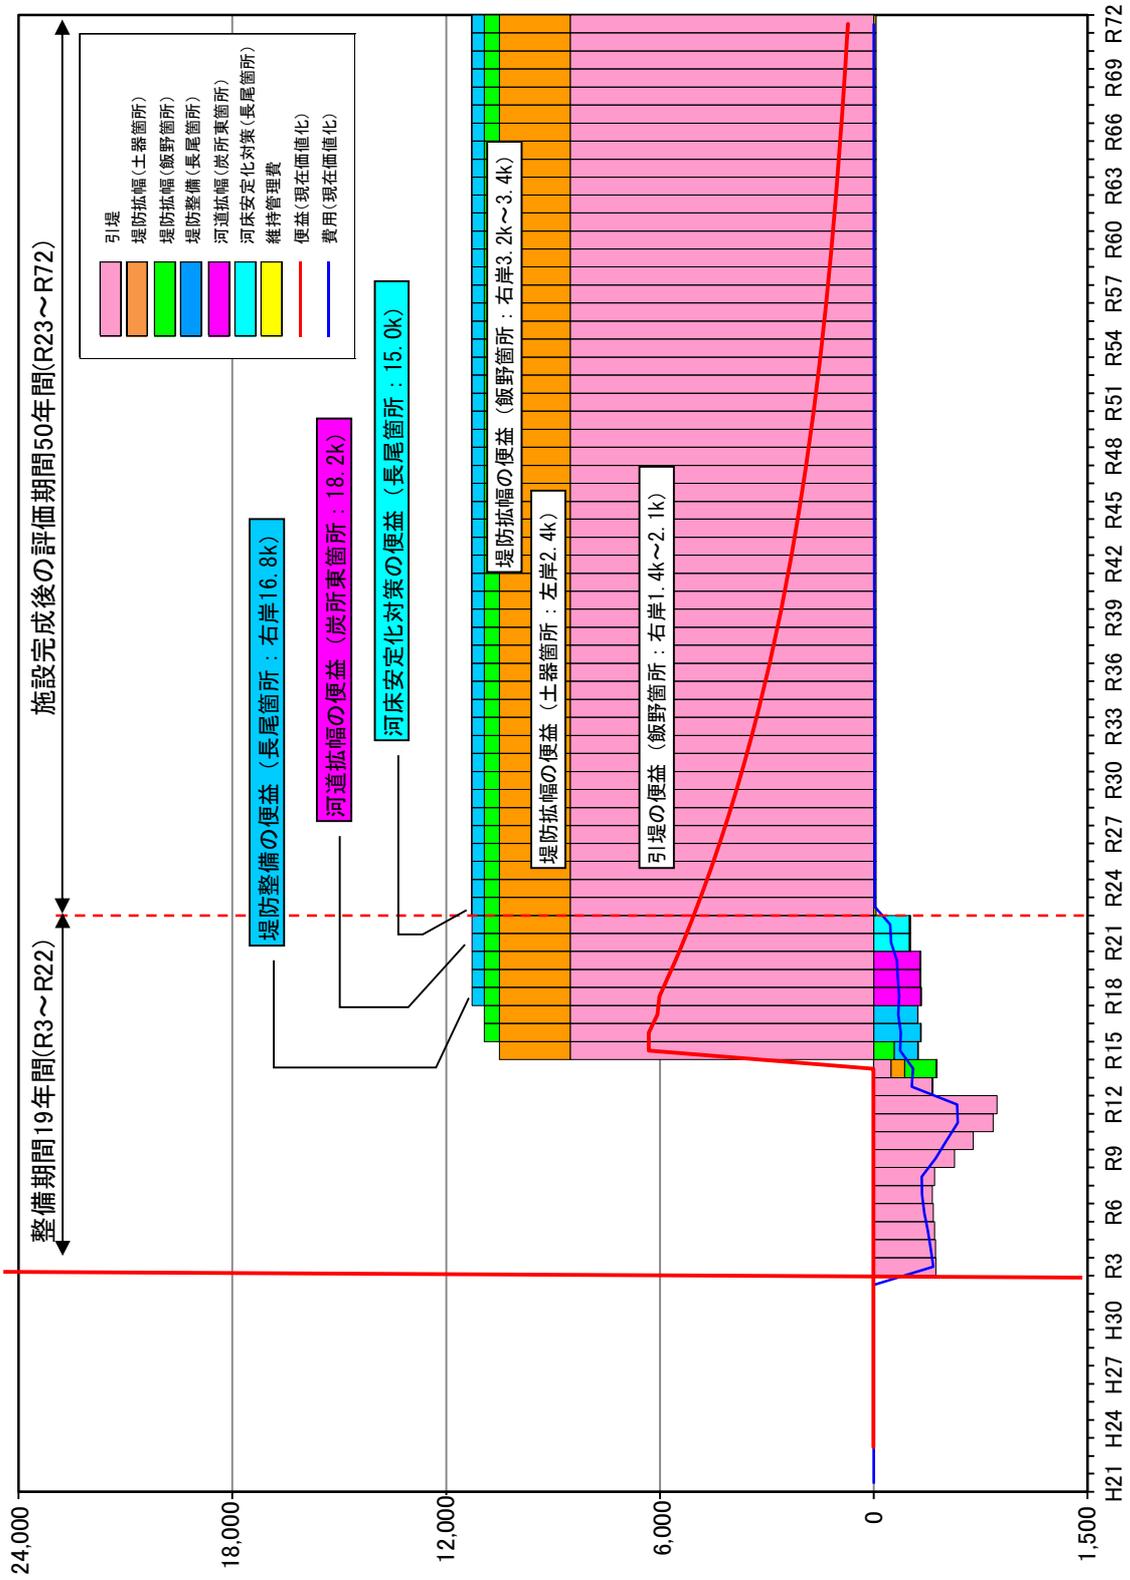

※平成28年度より便益の計上期間は、各対策後から整備計画完了まで計上(前回は、各対策後50年間まで計上)

図2.12 土器川直轄河川改修事業の費用対効果分析結果(残事業)

2.2.2 感度分析


社会経済状況の変化を想定し、要因別感度分析を実施した。

変動要因と変動幅は、事業費を±10%、工期を±10%、資産を±10%とした。

(1) 全体事業

表 2.6 費用対効果の感度分析結果（全体事業）

| 項目 | 総コスト (百万円) | 総便益 (百万円) | 費用便益比 B/C |
|---------|---------------|--------------|--------------|
| 基本ケース | 15,376 | 297,402 | 19.3 |
| 事業費+10% | 15,994 | 297,426 | 18.6 |
| 事業費-10% | 14,761 | 297,378 | 20.1 |
| 資産 +10% | 15,375 | 325,489 | 21.2 |
| 資産 -10% | 15,375 | 269,339 | 17.5 |
| 工期 +10% | 15,210 | 288,409 | 19.0 |
| 工期 -10% | 15,564 | 309,439 | 19.9 |

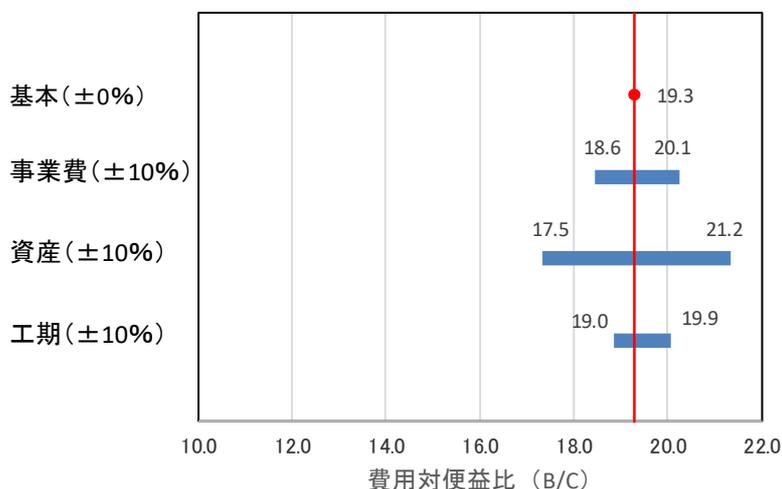

※事業費、資産の基準値は現在価値化

残事業費、残工期、資産を個別に±10%変動させて費用便益比を算定し、感度分析を行う。

[残事業費]

※1：残事業費について、毎年度の額を±10%変動する。維持管理費の変動は行わない。

[残工期]

※2：期間設定

<+10%のケース>残工期の10%を小数点第一位で四捨五入し、残工期に加算する。

<-10%のケース>残工期の10%を小数点第一位で四捨五入し、残工期に減算する。

※3：配分方法

基本ケースの各年度の事業費を変更したケースの年数で分割し、基本ケースの年数分を残工期の初年度から各年度に配分する。

残事業費の配分の変更に伴い発現する便益については、基本ケースと同様の考え方で計上する。


[資産]

※4：治水事業については、「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」様式5における一般資産被害額、農作物被害額、公共土木被害額を±10%し、被害額を算定する。

(2) 残事業

表 2.7 費用対効果の感度分析結果（残事業）

| 項目 | 総コスト (百万円) | 総便益 (百万円) | 費用便益比 B/C |
|---------|---------------|--------------|--------------|
| 基本ケース | 5,673 | 157,523 | 27.8 |
| 事業費+10% | 6,225 | 157,545 | 25.3 |
| 事業費-10% | 5,122 | 157,501 | 30.7 |
| 資産 +10% | 5,673 | 172,391 | 30.4 |
| 資産 -10% | 5,673 | 142,643 | 25.1 |
| 工期 +10% | 5,508 | 145,638 | 26.4 |
| 工期 -10% | 5,867 | 170,378 | 29.0 |

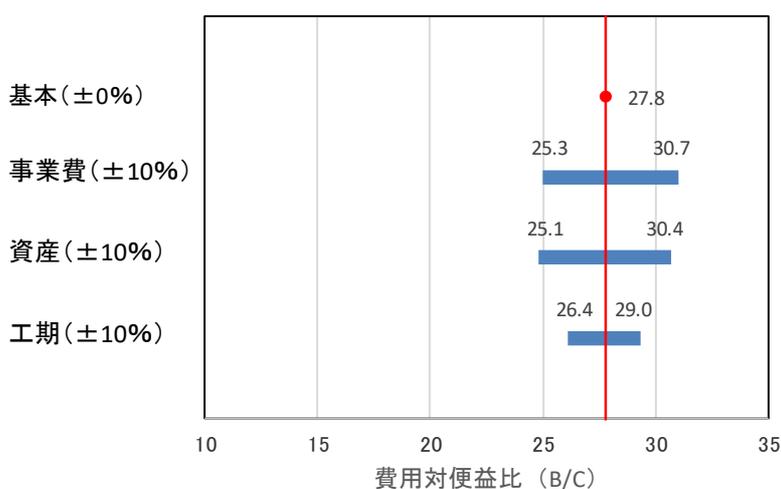

※事業費、資産の基準値は現在価値化

残事業費、残工期、資産を個別に±10%変動させて費用便益比を算定し、感度分析を行う。

[残事業費]

※1：残事業費について、毎年度の額を±10%変動する。維持管理費の変動は行わない。

[残工期]

※2：期間設定

<+10%のケース>残工期の10%を小数点第一位で四捨五入し、残工期に加算する。

<-10%のケース>残工期の10%を小数点第一位で四捨五入し、残工期に減算する。

※3：配分方法

基本ケースの各年度の事業費を変更したケースの年数で分割し、基本ケースの年数分を残工期の初年度から各年度に配分する。

残事業費の配分の変更に伴い発現する便益については、基本ケースと同様の考え方で計上する。

[資産]

※4：治水事業については、「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」様式5における一般資産被害額、農作物被害額、公共土木被害額を±10%し、被害額を算定する。

2.3 事業の進捗状況

下流部土器箇所での局所洗掘対策、堤防拡幅が平成 26 年度に完了、清水川水門の耐震点検結果より耐震補強対策を平成 24 年度に完了している。堤防の緊急点検に伴う追加対策箇所として、飯野箇所（右岸 4.2k 付近）、高柳箇所（右岸 6.0k 付近）の侵食対策が平成 27 年度に完了している。また、飯野箇所（右岸 1.0k 付近）の堤防整備（堤防断面拡幅）を令和元年度に完了している。

現在、飯野箇所の河道掘削及び右岸引堤を平成 30 年度から実施している。



図 2.13 堤防整備（土器箇所、左岸 1k/6 付近）



図 2.14 清水川水門の耐震補強対策



図 2.15 低水護岸整備（飯野箇所、右岸 4k/2 付近）



図 2.16 堤防整備（飯野箇所、右岸 1k/2 付近）

3. 事業の進捗の見込み

3.1 全体事業

河川整備計画流量 1,250m³/s (1/30 規模) を安全に流下させるため、堤防整備や河道拡幅の河川改修については、現状の整備状況を踏まえ、上下流の治水安全度のバランスに配慮しつつ、実施中の事業は早期に完成させ、未着手の事業についても段階的かつ着実に整備を進めて完了させる。

- ・飯野箇所での河道掘削の実施 (令和2年度完了)
- ・飯野箇所の右岸引堤の実施
- ・土器、飯野箇所の堤防整備の実施
- ・長尾箇所の堤防整備の実施
- ・炭所箇所の掘込河道部の河岸掘削を実施
- ・河床安定化対策は、現状対策のモニタリングを継続し、必要に応じて対策を実施

3.2 当面の対策

当面の対策として、下流部の河道掘削を令和2年度に完了させるとともに、右岸引堤事業を推進する。

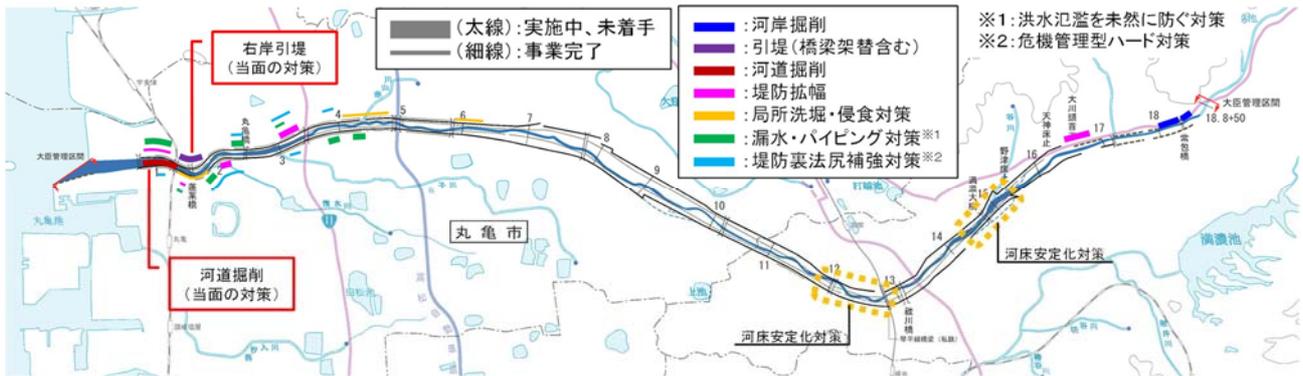


図 3.1 今後の整備内容

表 3.1 今後のスケジュール

| 整備メニュー | 当面の対策 (令和2年～令和8年) | 以降の対策 (令和9年～令和22年) |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 河道掘削 | ■ | |
| 引堤 | ■ | ■ |
| 堤防整備(下流) | | ■ |
| 堤防整備(上流) | | ■ |
| 河岸掘削(掘込区間) | | ■ |
| 河床安定化対策 | | ■ |


令和8年度を目途に実施する当面の対策についての、費用便益分析を実施した。

●土器川直轄河川改修事業

当面の対策： $B/C=58.4 \text{ 億円}/26.4 \text{ 億円} = 2.2 \dots$ 事業全体（対象期間：R2～R8）

表 3.2 事業の投資効率性

| 項目 | 細別 | | 当面事業 | 摘要 |
|----------------|--------------|-------|---------|----|
| 総費用 | 事業費[現在価値化] | ① | 26.4 億円 | |
| | 維持管理費[現在価値化] | ② | 0 億円 | |
| | 総費用(C) | ③=①+② | 26.4 億円 | |
| 総便益 | 便益[現在価値化] | ④ | 56.7 億円 | |
| | 残存価値[現在価値化] | ⑤ | 1.7 億円 | |
| | 総便益(B) | ⑥=④+⑤ | 58.4 億円 | |
| 費用便益比(CBR) B/C | | | 2.2 | |
| 純現在価値(NPV) B-C | | | 32.0 億円 | |
| 経済的内部収益率(EIRR) | | | 11% | |

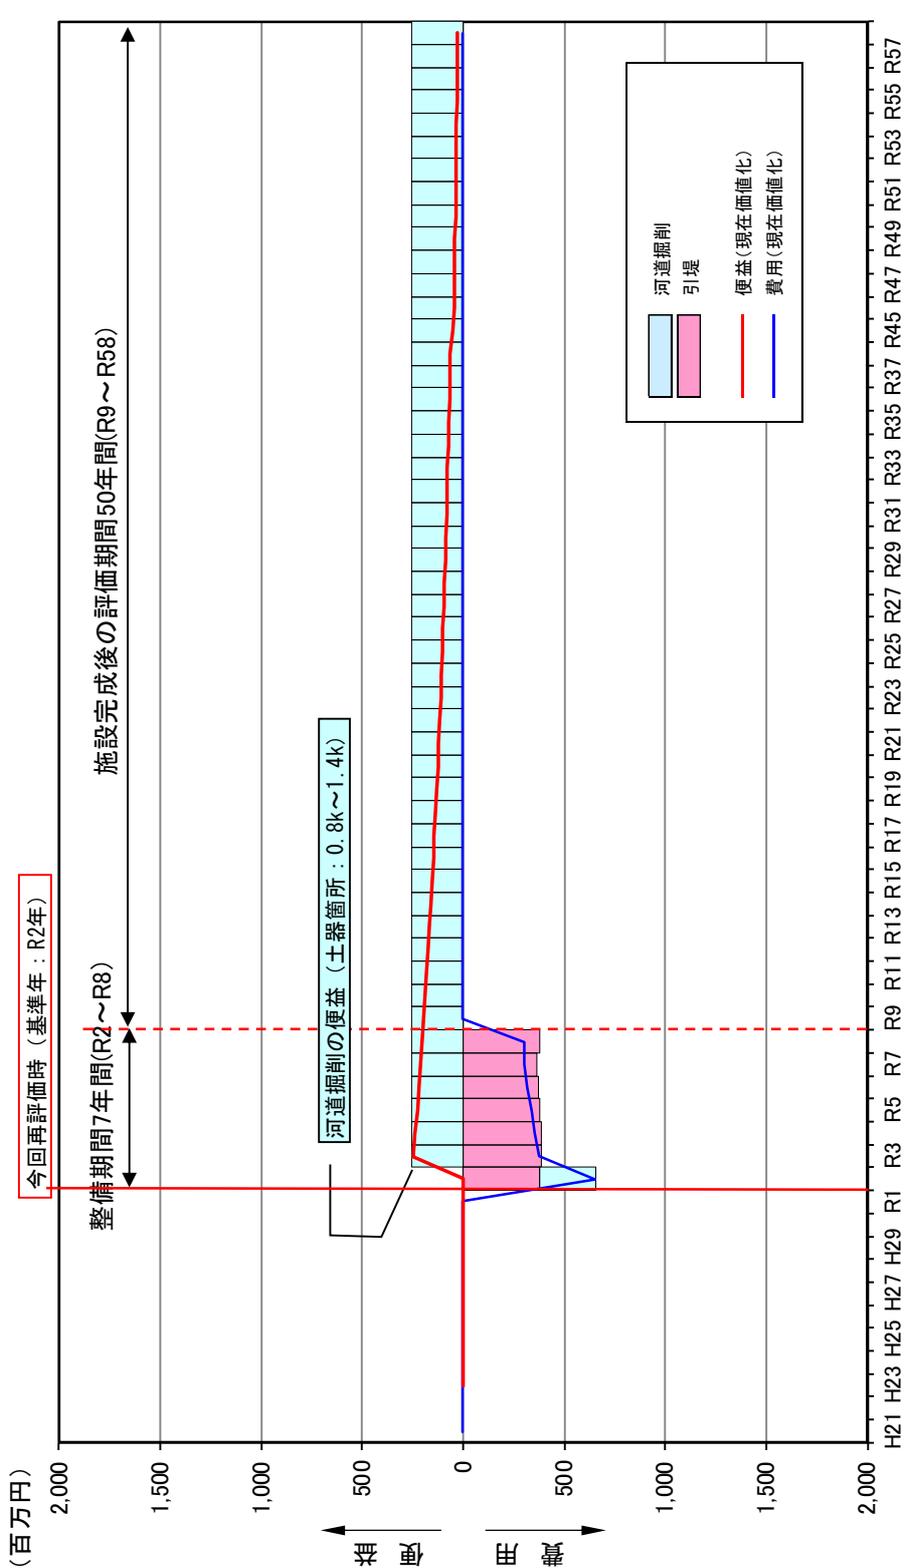

※平成28年度より便益の計上期間は、各対策後から整備計画完了まで計上 (前回は、各対策後50年間まで計上)

図3.2 土器川直轄河川改修事業の費用対効果分析結果 (当面の対策)

4. コスト縮減や代替案立案等の可能性

各事業の設計・実施段階で、施工方法の工夫による工法変更、掘削土の有効活用、新技術の採用等を適切に行うことによりコスト縮減に努めることとする。

①低水護岸工法の変更

感潮区間の低水護岸施工にあたり、従来の突込式基礎では朔望平均干潮位以下の施工となるため、鋼矢板による仮設（仮締切）が必要となる。このため、仮設（仮締切）を小規模にし、施工性を重視した矢板基礎式矢板護岸への変更を行い、約0.2億円のコスト縮減を図っている。

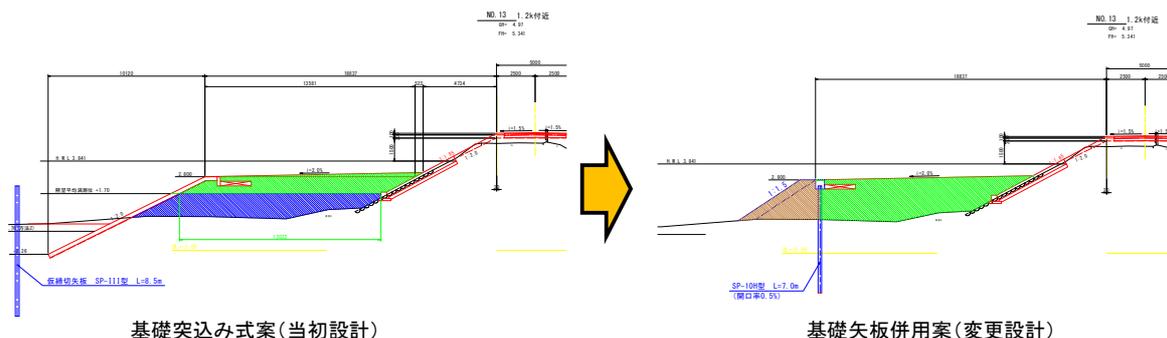


図 4.1 低水護岸工法の変更断面図

②河道掘削発生土の盛土利用

河道掘削による建設発生土を、高水敷盛土及び築堤盛土に利用することで、残土処理費や土砂購入費を軽減し、約0.4億円のコスト縮減を図っている。

③蓬莱橋架け替え施工方法の工夫による橋梁形式の変更

既設2橋梁の撤去方法として、関係機関（警察、道路管理者、占用各者等）との度重なる調整・協力により、1橋ごとの撤去から2橋同時撤去の施工方法への工夫を図ったことによる橋梁設計の自由度拡大に伴い橋梁形式の変更（鋼3径間連続鋼床版箱桁橋から鋼4径間連続非合成鈹桁橋へ変更）を行い、約7億円のコスト縮減を図っている。

【当初の撤去方針】
橋面から1橋ごと、
各橋側から撤去する。



【今回の撤去方針】
河川内から
2橋同時撤去する。

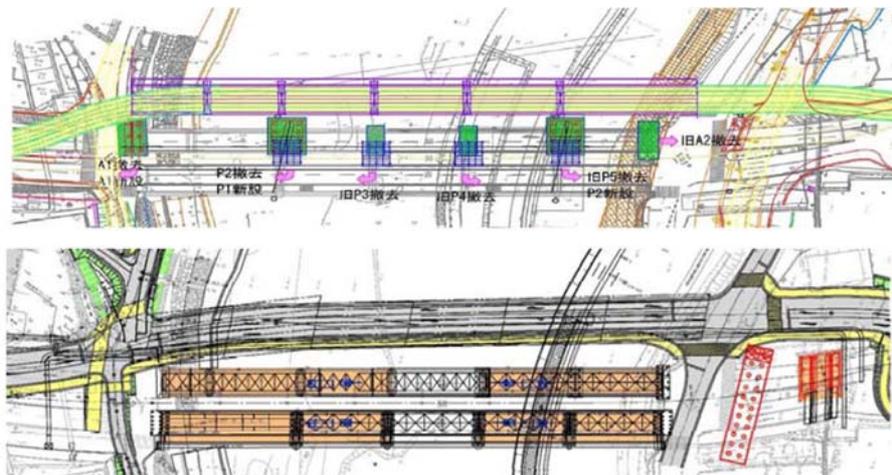


図 4.2 低水護岸工法の変更断面図

5. 環境への取り組み

①河川溪流環境アドバイザー

土器川の改修事業による環境への影響について、河川・溪流環境アドバイザー会議（年一回）を開催し、前年度実施した環境調査結果や事業実施箇所の状況報告等を行い、適切な指導、助言のもと検討を行い、次年度以降の調査・施工計画に反映している。また、状況に応じて、現地への立ち会いを頂き、重要種等の配慮すべき生物や環境等について適切な指導を頂いている。

②河川工事の実施における河川環境への配慮

土器川は、瀬切れが頻発し水の少ない厳しい河川環境にあつて、区間毎に特徴的な河川環境を形成しており、この特徴的な環境に依存する動植物が生息・生育・繁殖している。

このため、河川工事の実施に際しては、現状の河川環境の保全に配慮し、環境影響を最小限に抑えるよう配慮する。

下流部の右岸引堤区間は、汽水域で干潟、エコトーンの形成やヨシ原が自生し、多様な生物が生息する河川環境であるため、右岸引堤に伴う低水路拡幅の河川工事にあたり、潮間帯の範囲内で河道掘削面の緩傾斜化を図り、エコトーンの早期形成・回復及びヨシ原の復元・保全を図る。

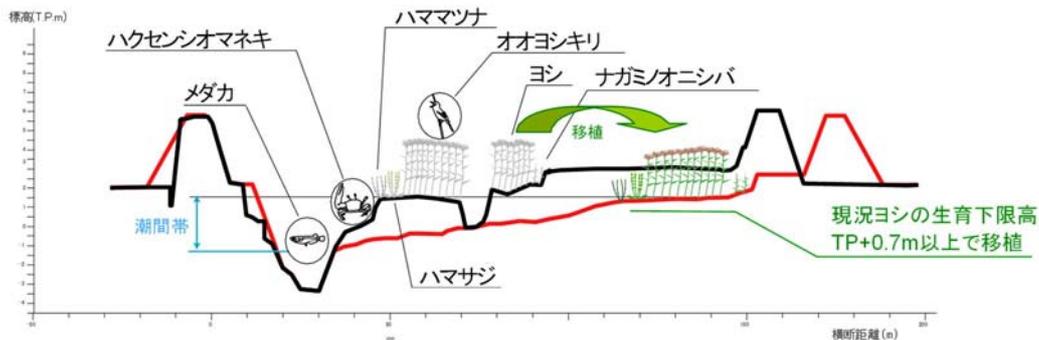


図 5.1 下流部の改修断面イメージ図（土器川 1.6k 付近）

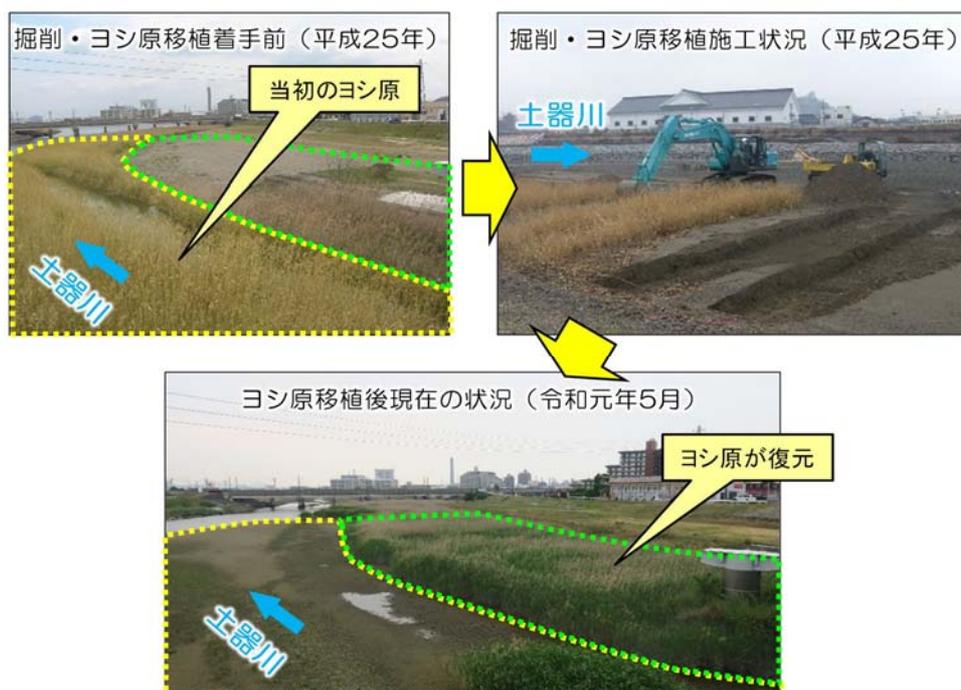


図 5.2 ヨシ原移植の試験施工状況（平成 25 年実施）

6. 被害指標分析の実施（試行）

費用便益分析において、現在計上している便益は、治水事業の様々な効果のうち、貨幣換算が可能な項目を被害軽減額として算出したものであり、治水事業効果の一部となっている。このため、「水害の被害指標分析の手引き（H25 試行版）H25.7 国土交通省 水管理・国土保全局」に準じ、貨幣換算の困難な指標について、定量化を図り事業の効果分析を実施した。

土器川において、河川整備計画規模の洪水が発生した場合、浸水区域内の最大孤立者数（避難率 40%）は約 6,100 人、災害時要援護者数は約 3,100 人、電力停止による影響人口は約 9,800 人と想定されるが、事業実施により解消される。

本河川整備計画（年超過確率 1/30）は、将来計画である河川整備基本方針（年超過確率 1/100）に向け、段階的に治水安全度を向上させる河川整備を実施する計画であり、計画規模を上回る洪水が発生した場合、相当の被害の発生が想定される。

気候変動に伴い頻発・激甚化する水害・土砂災害に対し、本河川整備計画における堤防浸透対策や侵食対策は、①洪水時の堤防破堤を遅らせ、避難のためのリードタイムを確保、②ハードソフト一体的に関係機関との連携した、逃げ遅れゼロ、社会経済被害の最小化の実現という大規模氾濫に対する減災対策に寄与するものである。

表 6.1 河川整備計画規模洪水（祓川橋 1,250m³/s）が発生した場合の効果

| 指標 | | 事業実施前 | 事業実施後 |
|----------|---------|------------|-------|
| 最大孤立者数 | 避難率 80% | 約 2,000 人 | 0 人 |
| | 避難率 40% | 約 6,100 人 | 0 人 |
| | 避難率 0% | 約 10,200 人 | 0 人 |
| 災害時要援護者数 | | 約 6,900 人 | 0 人 |
| 電力停止影響人口 | | 約 9,800 人 | 0 人 |

<対象人口の設定方法> 出典：「水害の被害指標分析の手引き（H25 試行版）」

- ・孤立者：歩行困難な浸水深 50cm 以上の浸水区域内人口（要援護者は 30cm 以上の浸水区域内人口）
- ・要援護者：高齢者（65 歳以上人口）、障がい者（65 歳以下人口の 4%）、乳幼児（7 歳未満人口）、妊婦（年平均妊婦数の 1/4）
- ・電力停止影響人口：「住宅の建て方、階数」に対する浸水深別の停電住宅（階層別人口）

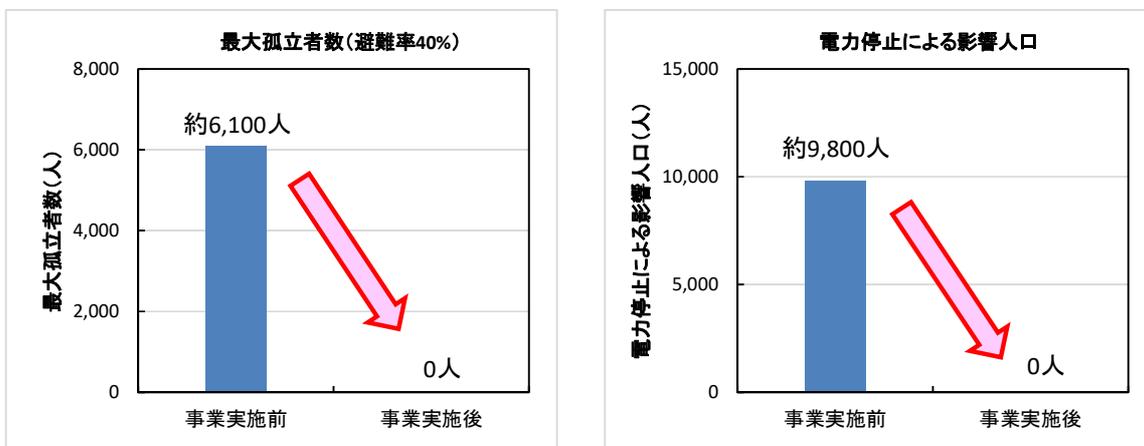


図 6.1 事業実施による被害軽減効果（河川整備計画規模）

表 6.2 河川整備基本方針洪水（祓川橋 1,700m³/s）が発生した場合の効果

| 指標 | | 事業実施前 | 事業実施後 |
|----------|---------|------------|----------|
| 最大孤立者数 | 避難率 80% | 約 3,600 人 | 3,400 人 |
| | 避難率 40% | 約 10,700 人 | 10,100 人 |
| | 避難率 0% | 約 17,900 人 | 16,800 人 |
| 災害時要援護者数 | | 約 11,500 人 | 9,500 人 |
| 電力停止影響人口 | | 約 17,500 人 | 16,100 人 |

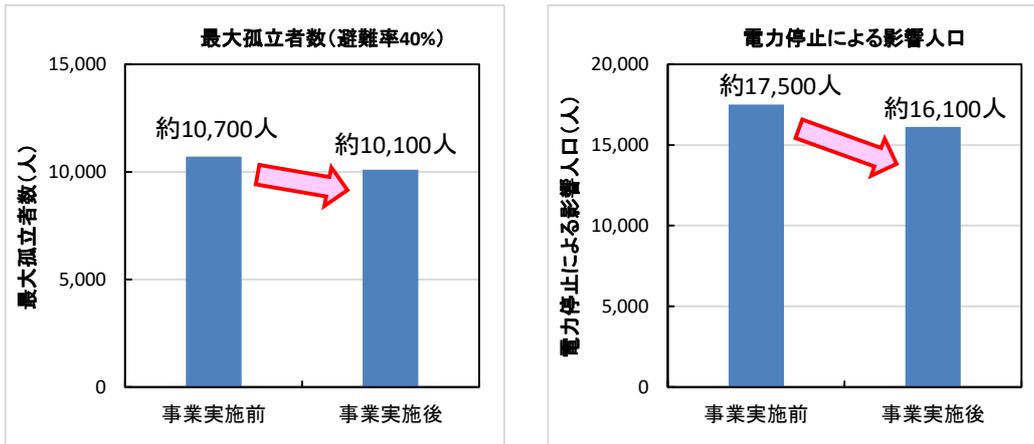


図 6.2 事業実施による被害軽減効果（河川整備基本方針規模）

7. 対応方針（案）

①再評価の視点

（1）事業の必要性に関する視点

事業を巡る社会情勢等の変化

- 土器川国管理区間下流部の扇状地は、地盤高が土器川の計画規模の洪水時における水面より低く、堤防決壊時の想定される被害は甚大。
- 一方で、資産集積地区の下流部は川幅が狭く、堤防断面不足区間が残り、中流部に比べ治水安全度が相対的に低く、さらに河道湾曲区間で局所洗掘が進行しているなど、治水対策が必要。
- 上流部では、頭首工による洪水流下阻害や河床低下進行区間が存在し、上流掘込河道区間は、著しく川幅が狭く、近年も溢水氾濫が発生するなど洪水流下断面が不足している状況にあり、治水対策が必要。
- 想定氾濫域内には丸亀市街があり、人口・資産が集積。四国と本州を結ぶ交通の要衝。
- 自治体等及び地域住民から要望あり。

事業の投資効果

- 事業完成後の河川整備計画目標流量流下時（堤防決壊防止）の被害軽減額：0億円
- 費用便益比（B/C） [事業全体] 19.3 [残事業] 27.8 [当面事業] 2.2

事業の進捗状況

- 平成19年8月河川整備基本方針策定。
- 平成24年9月河川整備計画策定。

（2）事業進捗の見込みの視点

今後のスケジュール

- 当面7ヶ年では、下流部の河道掘削と右岸引堤事業を推進する。

事業進捗の見込み

- 河川整備計画は、地域住民から計画に対する肯定的な意見と早期対策実施の要望を受けている。

（3）コスト縮減や代替案等の可能性の視点

コスト縮減や代替案等の可能性

- 各事業の設計・実施段階で、施工方法の工夫による工法変更、掘削土の有効活用、新技術の採用等を適切に行うことによりコスト縮減に努める。

②地方公共団体の意見

- 「対応方針（原案）」案の事業継続について、異議ありません。
- 事業の実施に際してはその内容を事前に説明いただくとともに、事業の計画的な推進とより一層のコスト縮減に努めていただくようお願いします。



【今後の対応方針（原案）】

以上のことから、土器川直轄河川改修事業を継続する。

県への意見照会と回答

国四整河計第40号
令和2年10月30日

香川県知事 殿

四国地方整備局長



土器川流域学識者会議に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について

平素より国土交通省直轄河川事業、ダム事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄河川事業、ダム事業においては、国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るべく、土器川流域学識者会議において、再評価に係る対応方針（原案）について審議しております。

このたび、令和2年11月12日に土器川流域学識者会議を開催することとなりましたので、実施要領に基づき、土器川流域学識者会議に諮る対応方針（原案）の作成にあたり、令和2年11月10日までに、別紙について貴職のご意見を承りたく依頼いたします。

※問い合わせ先

四国地方整備局 河川部 河川計画課
電話 087-811-8317
FAX 087-811-8417

(再評価)

【河川事業】


| 事業名 | 「対応方針（原案）」案※ | 備考 |
|-------------|--------------|----|
| 土器川直轄河川改修事業 | 継続 | |

※貴県の意見を踏まえ、土器川流域学識者会議へ諮る対応方針（原案）を作成するためのものです。

2技企第46190号
令和2年11月10日

四国地方整備局長 殿

香川県知事 浜田 恵造




土器川流域学識者会議に諮る対応方針(原案)の作成に係る
意見照会について (回答)


令和2年10月30日付け国四整河計第40号について意見照会のありました
このことについて、下記のとおり回答します。

記

- 1 土器川直轄河川改修事業についての意見
「対応方針(原案)」案の事業継続について、異議ありません。
事業の実施に際してはその内容を事前に説明いただくとともに、事業の計
画的な推進とより一層のコスト縮減に努めていただくようお願いいたします。



費用便益比算出資料

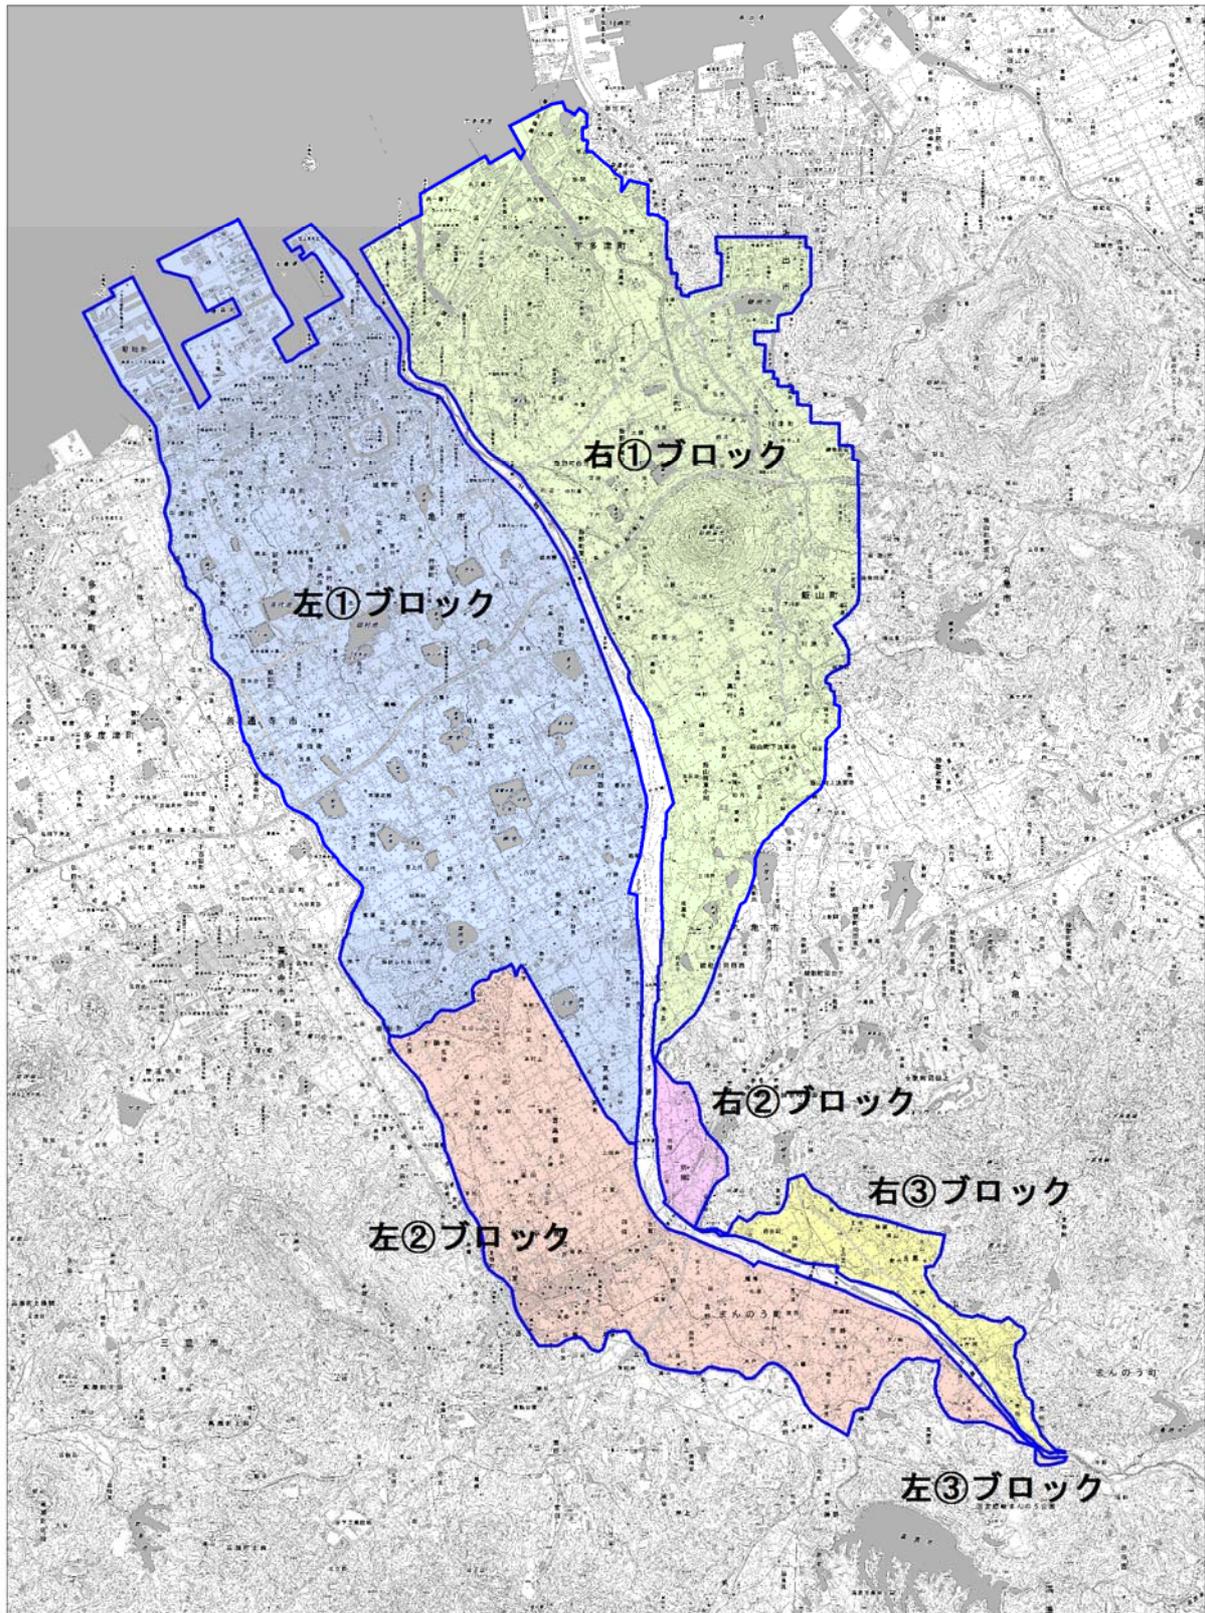

「この地図は、国土地理院発行の2万5千分1地形図を使用したものである。」

様式一2 (資産データ)

| 汎用ブロック | ブロック面積 (ha) | 一般資産等基礎数量 | | | | | | | 一般資産被書額 (百万円) | | | | | | | 農作物被書額 (百万円) | | | 備考 | |
|--------|-------------|-----------|----------|----------------------|-----------|------------------------|----------|----------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|-------|-----------|--------------|-----|-------|-----------|--------------|
| | | 人口 (人) | 世帯数 (世帯) | 従業者数 (産業分類別に算出) (世帯) | 農漁家数 (世帯) | 延床面積 (m ²) | 水田積 (ha) | 畑面積 (ha) | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 償却 | 在庫 | 農漁家資産 償却 | 在庫 | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | 一般資産 額等合計 |
| L1 | 3,960 | 73,217 | 26,850 | 30,614 | 635 | 5,338,898 | 1,073 | 13 | 1,084,330 | 365,113 | 110,270 | 53,733 | 1,282 | 568 | 1,615,296 | 1,206 | 33 | 1,239 | 1,616,536 | |
| L2 | 1,432 | 14,167 | 5,209 | 5,111 | 370 | 1,408,979 | 759 | 0 | 286,164 | 69,151 | 15,294 | 8,169 | 746 | 331 | 379,855 | 853 | 0 | 853 | 380,709 | |
| L3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| R1 | 2,862 | 51,788 | 17,899 | 20,259 | 510 | 3,432,044 | 885 | 70 | 697,048 | 249,143 | 64,613 | 36,322 | 1,029 | 456 | 1,048,611 | 995 | 184 | 1,179 | 1,049,790 | |
| R2 | 133 | 650 | 226 | 170 | 27 | 62,594 | 45 | 4 | 12,713 | 2,993 | 571 | 399 | 55 | 24 | 16,755 | 50 | 10 | 60 | 16,816 | |
| R3 | 326 | 1,272 | 422 | 534 | 58 | 164,160 | 183 | 9 | 33,341 | 5,593 | 1,805 | 1,527 | 117 | 52 | 42,435 | 205 | 23 | 228 | 42,663 | |
| 合計 | 8,718 | 141,094 | 50,606 | 56,688 | 1,600 | 10,406,675 | 2,947 | 96 | 2,113,596 | 691,993 | 192,553 | 100,150 | 3,229 | 1,431 | 3,102,952 | 3,311 | 250 | 3,561 | 3,106,516 | |

様式－3（被害額）

被害額算定の整備河道時点一覧表

| 時点 | 整備段階 | 全体事業 | 残事業 | 当面事業 |
|----------|---------------------------|------|-----|------|
| H21 時点 | 事業着手 | ① | | |
| H23 時点 | 土器箇所：堤防拡幅（左岸 1.6k） | ② | | |
| H25 時点 | 土器箇所：局所洗堀対策（左岸 1.6k） | ③ | | |
| R1-1 時点 | 飯野箇所：侵食対策（右岸 4.2k＋他） | ④ | | |
| R1-2 時点 | 高柳箇所：侵食対策（右岸 6.0k＋他） | ⑤ | | |
| R1-3 時点 | 飯野箇所：堤防拡幅（右岸 1.0k～1.2k） | ⑥ | | |
| R2 時点 | 飯野箇所：河道掘削（0.8k～1.4k） | ⑦ | ⑦ | ⑦ |
| R14-1 時点 | 飯野箇所：引堤（右岸 1.4k～2.0k） | ⑧ | ⑧ | |
| R14-2 時点 | 土器箇所：堤防拡幅（左岸 2.4k） | ⑨ | ⑨ | |
| R15 時点 | 飯野箇所：堤防拡幅（右岸 3.2k～3.4k） | ⑩ | ⑩ | |
| R17 時点 | 長尾箇所：堤防整備（右岸 16.5k～16.9k） | ⑪ | ⑪ | |
| R20 時点 | 炭所箇所：河岸掘削（18.0k～18.8k） | ⑫ | ⑫ | |
| R22 時点 | 整備計画完成（長尾箇所：河床安定化対策） | ⑬ | ⑬ | |

様式-3 (被害額: 全体事業): H21 時点① 事業着手

様式-3 被害額 (事業実施前: H21時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/10 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|----|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|-------|---------|--|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 9,795 | 4,806 | 644 | 365 | 5 | 4 | 15,819 | 0 | 0 | 0 | 11,739 | 593 | 380 | 251 | 631 | 169 | 299 | 0 | 1,692 | 29,250 | |
| L2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 25,479 | 17,461 | 2,294 | 1,163 | 14 | 10 | 46,421 | 21 | 0 | 21 | 35,545 | 1,307 | 1,189 | 780 | 1,969 | 350 | 1,088 | 0 | 4,714 | 86,701 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 134 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 258 | |
| 合計 | 35,389 | 22,297 | 3,140 | 1,529 | 19 | 14 | 62,388 | 23 | 0 | 23 | 47,506 | 1,903 | 1,574 | 1,034 | 2,608 | 520 | 1,389 | 0 | 6,420 | 116,337 | |

様式-3 被害額 (事業実施前: H21時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/20 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|--|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 22,783 | 12,546 | 2,566 | 1,038 | 14 | 11 | 38,958 | 0 | 0 | 0 | 28,923 | 1,308 | 830 | 554 | 1,384 | 389 | 782 | 0 | 3,863 | 71,744 | |
| L2 | 816 | 79 | 29 | 14 | 0 | 0 | 938 | 12 | 0 | 12 | 1,465 | 43 | 38 | 20 | 58 | 11 | 5 | 0 | 117 | 2,532 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 35,271 | 23,558 | 3,428 | 1,788 | 21 | 14 | 64,080 | 24 | 0 | 24 | 48,758 | 1,902 | 1,656 | 1,029 | 2,685 | 535 | 1,468 | 0 | 6,590 | 119,452 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 296 | |
| 合計 | 58,953 | 36,211 | 6,025 | 2,841 | 35 | 25 | 104,090 | 37 | 0 | 37 | 79,317 | 3,255 | 2,527 | 1,605 | 4,132 | 936 | 2,257 | 0 | 10,580 | 194,024 | |

様式-3 被害額 (事業実施前: H21時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/30 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|--|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 28,464 | 15,902 | 3,499 | 1,443 | 17 | 12 | 49,337 | 1 | 0 | 1 | 36,643 | 1,758 | 1,010 | 670 | 1,680 | 489 | 991 | 0 | 4,918 | 90,899 | |
| L2 | 405 | 63 | 16 | 6 | 0 | 0 | 490 | 4 | 0 | 4 | 584 | 21 | 17 | 9 | 26 | 6 | 4 | 0 | 57 | 1,135 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 42,984 | 28,883 | 4,088 | 2,003 | 23 | 15 | 77,996 | 3 | 0 | 3 | 58,004 | 2,521 | 2,199 | 1,267 | 3,466 | 815 | 1,799 | 0 | 8,601 | 144,604 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,141 | 241 | 125 | 79 | 3 | 2 | 1,591 | 15 | 0 | 15 | 2,040 | 66 | 29 | 17 | 46 | 12 | 15 | 0 | 139 | 3,785 | |
| 合計 | 72,994 | 45,089 | 7,728 | 3,531 | 43 | 29 | 129,414 | 23 | 0 | 23 | 97,271 | 4,366 | 3,255 | 1,963 | 5,218 | 1,322 | 2,809 | 0 | 13,715 | 240,423 | |

様式-3 被害額 (事業実施前: H21時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/50 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|--|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 38,904 | 22,040 | 3,612 | 1,527 | 19 | 14 | 66,116 | 1 | 0 | 1 | 49,103 | 1,984 | 1,416 | 915 | 2,331 | 616 | 1,373 | 0 | 6,304 | 121,524 | |
| L2 | 3,533 | 612 | 158 | 87 | 1 | 1 | 4,392 | 32 | 0 | 32 | 5,307 | 185 | 162 | 87 | 249 | 50 | 38 | 0 | 522 | 10,253 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 59,579 | 38,277 | 6,803 | 3,379 | 34 | 19 | 108,091 | 5 | 0 | 5 | 80,440 | 4,471 | 3,251 | 1,782 | 5,033 | 1,344 | 2,385 | 0 | 13,233 | 201,769 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,378 | 310 | 148 | 98 | 3 | 2 | 1,939 | 16 | 0 | 16 | 2,357 | 73 | 32 | 19 | 51 | 13 | 19 | 0 | 156 | 4,468 | |
| 合計 | 103,394 | 61,239 | 10,721 | 5,091 | 57 | 36 | 180,538 | 54 | 0 | 54 | 137,219 | 6,713 | 4,861 | 2,803 | 7,664 | 2,023 | 3,815 | 0 | 20,215 | 338,026 | |

様式-3 被害額 (事業実施前: H21時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/70 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|--|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 48,335 | 26,061 | 4,093 | 1,746 | 26 | 19 | 80,280 | 11 | 0 | 11 | 60,140 | 2,247 | 1,646 | 1,061 | 2,707 | 725 | 1,624 | 0 | 7,303 | 147,734 | |
| L2 | 4,873 | 1,011 | 220 | 124 | 3 | 2 | 6,233 | 41 | 0 | 41 | 7,218 | 228 | 210 | 116 | 326 | 64 | 63 | 0 | 681 | 14,173 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 67,908 | 43,164 | 8,292 | 4,055 | 40 | 22 | 123,481 | 7 | 0 | 7 | 91,950 | 5,464 | 3,804 | 2,054 | 5,858 | 1,643 | 2,689 | 0 | 15,654 | 231,092 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,512 | 365 | 184 | 129 | 4 | 3 | 2,197 | 17 | 0 | 17 | 2,633 | 79 | 33 | 20 | 53 | 14 | 23 | 0 | 169 | 5,016 | |
| 合計 | 122,628 | 70,601 | 12,789 | 6,054 | 73 | 46 | 212,191 | 76 | 0 | 76 | 161,953 | 8,018 | 5,693 | 3,251 | 8,944 | 2,446 | 4,399 | 0 | 23,807 | 398,027 | |

様式-3 被害額 (事業実施前: H21時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/100 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|--|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,736 | 30,410 | 5,046 | 2,113 | 30 | 21 | 93,356 | 12 | 0 | 12 | 69,877 | 2,675 | 1,912 | 1,209 | 3,121 | 875 | 1,895 | 0 | 8,566 | 171,811 | |
| L2 | 5,692 | 1,224 | 257 | 145 | 3 | 3 | 7,324 | 50 | 0 | 50 | 8,625 | 256 | 244 | 135 | 379 | 72 | 76 | 0 | 783 | 16,782 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 76,808 | 47,933 | 9,692 | 4,728 | 46 | 24 | 139,231 | 11 | 0 | 11 | 103,878 | 6,454 | 4,410 | 2,350 | 6,760 | 1,946 | 2,986 | 0 | 18,146 | 261,266 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,837 | 494 | 207 | 147 | 5 | 3 | 2,693 | 18 | 0 | 18 | 3,042 | 86 | 35 | 23 | 58 | 15 | 31 | 0 | 190 | 5,943 | |
| 合計 | 140,073 | 80,061 | 15,202 | 7,133 | 84 | 51 | 242,604 | 92 | 0 | 92 | 185,487 | 9,471 | 6,601 | 3,717 | 10,318 | 2,908 | 4,988 | 0 | 27,685 | 455,868 | |

様式-3 (被害額: 全体事業): H23 時点② 土器箇所: 堤防拡幅 (左岸 1.6k)

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後: H23時点) | | | | | | | | | | 水系名: 土器川水系 | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/10 | | | (単位: 百万円) | | | |
|------------|--|--------------------|--------|-------|-------|----|----|--------|----|------------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|------------------|-----|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 汎濫 ブロック | | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 家屋 | 家庭用品 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | 償却 | | | 在庫 | | | | | | | | |
| L1 | | 9,717 | 4,747 | 835 | 362 | 5 | 4 | 15,670 | 0 | 0 | 0 | 11,627 | 585 | 376 | 249 | 625 | 167 | 296 | 0 | 1,673 | 28,970 | | | |
| L2 | | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 | | | |
| L3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R1 | | 25,479 | 17,461 | 2,294 | 1,163 | 14 | 10 | 46,421 | 21 | 0 | 21 | 35,545 | 1,307 | 1,189 | 780 | 1,969 | 350 | 1,088 | 0 | 4,714 | 86,701 | | | |
| R2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R3 | | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 134 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 258 | | | |
| 合計 | | 35,311 | 22,238 | 3,131 | 1,526 | 19 | 14 | 62,239 | 23 | 0 | 23 | 47,394 | 1,895 | 1,570 | 1,032 | 2,602 | 518 | 1,386 | 0 | 6,401 | 116,057 | | | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後: H23時点) | | | | | | | | | | 水系名: 土器川水系 | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/20 | | | (単位: 百万円) | | | |
|------------|--|--------------------|--------|-------|-------|----|----|---------|----|------------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|------------------|-----|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 汎濫 ブロック | | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 家屋 | 家庭用品 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | 償却 | | | 在庫 | | | | | | | | |
| L1 | | 21,882 | 11,848 | 2,394 | 984 | 13 | 10 | 37,131 | 0 | 0 | 0 | 27,569 | 1,258 | 812 | 536 | 1,348 | 373 | 738 | 0 | 3,717 | 68,417 | | | |
| L2 | | 816 | 79 | 29 | 14 | 0 | 0 | 938 | 12 | 0 | 12 | 1,465 | 43 | 38 | 20 | 58 | 11 | 5 | 0 | 117 | 2,532 | | | |
| L3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R1 | | 35,271 | 23,558 | 3,428 | 1,788 | 21 | 14 | 64,080 | 24 | 0 | 24 | 48,758 | 1,902 | 1,656 | 1,029 | 2,685 | 535 | 1,468 | 0 | 6,590 | 119,452 | | | |
| R2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R3 | | 83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 296 | | | |
| 合計 | | 58,062 | 35,513 | 5,853 | 2,787 | 34 | 24 | 102,263 | 37 | 0 | 37 | 77,963 | 3,205 | 2,509 | 1,587 | 4,096 | 920 | 2,213 | 0 | 10,434 | 190,697 | | | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後: H23時点) | | | | | | | | | | 水系名: 土器川水系 | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/30 | | | (単位: 百万円) | | | |
|------------|--|--------------------|--------|-------|-------|----|----|---------|----|------------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|------------------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 汎濫 ブロック | | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 家屋 | 家庭用品 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | 償却 | | | 在庫 | | | | | | | | |
| L1 | | 27,709 | 15,456 | 3,411 | 1,390 | 17 | 12 | 47,995 | 0 | 0 | 0 | 35,641 | 1,711 | 993 | 658 | 1,651 | 480 | 963 | 0 | 4,805 | 88,441 | | | |
| L2 | | 405 | 63 | 16 | 6 | 0 | 0 | 490 | 4 | 0 | 4 | 584 | 21 | 17 | 9 | 26 | 6 | 4 | 0 | 57 | 1,135 | | | |
| L3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R1 | | 42,984 | 28,883 | 4,088 | 2,003 | 23 | 15 | 77,996 | 3 | 0 | 3 | 58,004 | 2,521 | 2,199 | 1,267 | 3,466 | 815 | 1,799 | 0 | 8,601 | 144,604 | | | |
| R2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R3 | | 1,141 | 241 | 125 | 79 | 3 | 2 | 1,591 | 15 | 0 | 15 | 2,040 | 66 | 29 | 17 | 46 | 12 | 15 | 0 | 139 | 3,785 | | | |
| 合計 | | 72,239 | 44,643 | 7,640 | 3,478 | 43 | 29 | 128,072 | 22 | 0 | 22 | 96,269 | 4,319 | 3,238 | 1,951 | 5,189 | 1,313 | 2,781 | 0 | 13,602 | 237,965 | | | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後: H23時点) | | | | | | | | | | 水系名: 土器川水系 | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/50 | | | (単位: 百万円) | | | |
|------------|--|--------------------|--------|--------|-------|----|----|---------|----|------------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|------------------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 汎濫 ブロック | | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 家屋 | 家庭用品 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | 償却 | | | 在庫 | | | | | | | | |
| L1 | | 38,904 | 22,040 | 3,612 | 1,527 | 19 | 14 | 66,116 | 1 | 0 | 1 | 49,103 | 1,984 | 1,416 | 915 | 2,331 | 616 | 1,373 | 0 | 6,304 | 121,524 | | | |
| L2 | | 3,533 | 612 | 158 | 87 | 1 | 1 | 4,392 | 32 | 0 | 32 | 5,307 | 185 | 162 | 87 | 249 | 50 | 38 | 0 | 522 | 10,253 | | | |
| L3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R1 | | 59,579 | 38,277 | 6,803 | 3,379 | 34 | 19 | 108,091 | 5 | 0 | 5 | 80,440 | 4,471 | 3,251 | 1,782 | 5,033 | 1,344 | 2,385 | 0 | 13,233 | 201,769 | | | |
| R2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R3 | | 1,378 | 310 | 148 | 98 | 3 | 2 | 1,939 | 16 | 0 | 16 | 2,357 | 73 | 32 | 19 | 51 | 19 | 0 | 156 | 4,468 | | | | |
| 合計 | | 103,394 | 61,239 | 10,721 | 5,091 | 57 | 36 | 180,538 | 54 | 0 | 54 | 137,219 | 6,713 | 4,861 | 2,803 | 7,664 | 2,023 | 3,815 | 0 | 20,215 | 338,026 | | | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後: H23時点) | | | | | | | | | | 水系名: 土器川水系 | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/70 | | | (単位: 百万円) | | | |
|------------|--|--------------------|--------|--------|-------|----|----|---------|----|------------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|------------------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 汎濫 ブロック | | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 家屋 | 家庭用品 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | 償却 | | | 在庫 | | | | | | | | |
| L1 | | 48,335 | 26,061 | 4,093 | 1,746 | 26 | 19 | 80,280 | 11 | 0 | 11 | 60,140 | 2,247 | 1,646 | 1,061 | 2,707 | 725 | 1,624 | 0 | 7,303 | 147,734 | | | |
| L2 | | 4,873 | 1,011 | 220 | 124 | 3 | 2 | 6,233 | 41 | 0 | 41 | 7,218 | 228 | 210 | 116 | 326 | 64 | 63 | 0 | 681 | 14,173 | | | |
| L3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R1 | | 67,908 | 43,164 | 8,292 | 4,055 | 40 | 22 | 123,481 | 7 | 0 | 7 | 91,950 | 5,464 | 3,804 | 2,054 | 5,858 | 1,643 | 2,689 | 0 | 15,654 | 231,092 | | | |
| R2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R3 | | 1,512 | 365 | 184 | 129 | 4 | 3 | 2,197 | 17 | 0 | 17 | 2,633 | 79 | 33 | 20 | 53 | 14 | 23 | 0 | 169 | 5,016 | | | |
| 合計 | | 122,628 | 70,601 | 12,789 | 6,054 | 73 | 46 | 212,191 | 76 | 0 | 76 | 161,953 | 8,018 | 5,693 | 3,251 | 8,944 | 2,446 | 4,399 | 0 | 23,807 | 398,027 | | | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後: H23時点) | | | | | | | | | | 水系名: 土器川水系 | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/100 | | | (単位: 百万円) | | | |
|------------|--|--------------------|--------|--------|-------|----|----|---------|----|------------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|------------------|-------|-------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 汎濫 ブロック | | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 家屋 | 家庭用品 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | 償却 | | | 在庫 | | | | | | | | |
| L1 | | 55,736 | 30,410 | 5,046 | 2,113 | 30 | 21 | 93,356 | 12 | 0 | 12 | 69,877 | 2,675 | 1,912 | 1,209 | 3,121 | 875 | 1,895 | 0 | 8,566 | 171,811 | | | |
| L2 | | 5,692 | 1,224 | 257 | 145 | 3 | 3 | 7,324 | 50 | 0 | 50 | 8,625 | 256 | 244 | 135 | 379 | 72 | 76 | 0 | 783 | 16,782 | | | |
| L3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R1 | | 76,808 | 47,933 | 9,692 | 4,728 | 46 | 24 | 139,231 | 11 | 0 | 11 | 103,878 | 6,454 | 4,410 | 2,350 | 6,760 | 1,946 | 2,986 | 0 | 18,146 | 261,266 | | | |
| R2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R3 | | 1,837 | 494 | 207 | 147 | 5 | 3 | 2,693 | 18 | 0 | 18 | 3,042 | 86 | 35 | 23 | 58 | 15 | 31 | 0 | 190 | 5,943 | | | |
| 合計 | | 140,073 | 80,061 | 15,202 | 7,133 | 84 | 51 | 242,604 | 92 | 0 | 92 | 185,487 | 9,471 | 6,601 | 3,717 | 10,318 | 2,908 | 4,988 | 0 | 27,685 | 455,868 | | | |

様式-3 (被害額：全体事業)：H25時点③ 土器箇所：局所洗掘対策 (左岸1.6k)

様式-3 被害額 (事業実施後：H25時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/10 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|----|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-----|---------------|--------------------|----------|----|-------|--------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 25,479 | 17,461 | 2,294 | 1,163 | 14 | 10 | 46,421 | 21 | 0 | 21 | 35,545 | 1,307 | 1,189 | 780 | 1,969 | 350 | 1,088 | 0 | 4,714 | 86,701 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 134 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 258 |
| 合計 | 25,594 | 17,491 | 2,296 | 1,164 | 14 | 10 | 46,569 | 23 | 0 | 23 | 35,767 | 1,310 | 1,194 | 783 | 1,977 | 351 | 1,090 | 0 | 4,728 | 87,087 |

様式-3 被害額 (事業実施後：H25時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/20 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|----|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|-------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 13,155 | 7,079 | 1,236 | 556 | 8 | 6 | 22,040 | 0 | 0 | 0 | 16,354 | 774 | 474 | 321 | 795 | 224 | 441 | 0 | 2,234 | 40,628 |
| L2 | 816 | 79 | 29 | 14 | 0 | 0 | 938 | 12 | 0 | 12 | 1,465 | 43 | 38 | 20 | 58 | 11 | 5 | 0 | 117 | 2,532 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 35,271 | 23,558 | 3,428 | 1,788 | 21 | 14 | 64,080 | 24 | 0 | 24 | 48,758 | 1,902 | 1,656 | 1,029 | 2,685 | 535 | 1,468 | 0 | 6,590 | 119,452 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 296 |
| 合計 | 49,325 | 30,744 | 4,695 | 2,359 | 29 | 20 | 87,172 | 37 | 0 | 37 | 66,748 | 2,721 | 2,171 | 1,372 | 3,543 | 771 | 1,916 | 0 | 8,951 | 162,908 |

様式-3 被害額 (事業実施後：H25時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/30 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 22,782 | 12,420 | 2,533 | 1,040 | 14 | 11 | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 28,806 | 1,332 | 837 | 554 | 1,391 | 398 | 774 | 0 | 3,895 | 71,501 |
| L2 | 405 | 63 | 16 | 6 | 0 | 0 | 490 | 4 | 0 | 4 | 584 | 21 | 17 | 9 | 26 | 6 | 4 | 0 | 57 | 1,135 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 42,984 | 28,883 | 4,088 | 2,003 | 23 | 15 | 77,996 | 3 | 0 | 3 | 58,004 | 2,521 | 2,199 | 1,267 | 3,466 | 815 | 1,799 | 0 | 8,601 | 144,604 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,141 | 241 | 125 | 79 | 3 | 2 | 1,591 | 15 | 0 | 15 | 2,040 | 66 | 29 | 17 | 46 | 12 | 15 | 0 | 139 | 3,785 |
| 合計 | 67,312 | 41,607 | 6,762 | 3,128 | 40 | 28 | 118,877 | 22 | 0 | 22 | 89,434 | 3,940 | 3,082 | 1,847 | 4,929 | 1,231 | 2,592 | 0 | 12,692 | 221,025 |

様式-3 被害額 (事業実施後：H25時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/50 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 38,904 | 22,040 | 3,612 | 1,527 | 19 | 14 | 66,116 | 1 | 0 | 1 | 49,103 | 1,984 | 1,416 | 915 | 2,331 | 616 | 1,373 | 0 | 6,304 | 121,524 |
| L2 | 3,533 | 612 | 158 | 87 | 1 | 1 | 4,392 | 32 | 0 | 32 | 5,307 | 185 | 162 | 87 | 249 | 50 | 38 | 0 | 522 | 10,253 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 59,579 | 38,277 | 6,803 | 3,379 | 34 | 19 | 108,091 | 5 | 0 | 5 | 80,440 | 4,471 | 3,251 | 1,782 | 5,033 | 1,344 | 2,385 | 0 | 13,233 | 201,769 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,378 | 310 | 148 | 98 | 3 | 2 | 1,939 | 16 | 0 | 16 | 2,357 | 73 | 32 | 19 | 51 | 13 | 19 | 0 | 156 | 4,468 |
| 合計 | 103,394 | 61,239 | 10,721 | 5,091 | 57 | 36 | 180,538 | 54 | 0 | 54 | 137,219 | 6,713 | 4,861 | 2,803 | 7,664 | 2,023 | 3,815 | 0 | 20,215 | 338,026 |

様式-3 被害額 (事業実施後：H25時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/70 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 48,335 | 26,061 | 4,093 | 1,746 | 26 | 19 | 80,280 | 11 | 0 | 11 | 60,140 | 2,247 | 1,646 | 1,061 | 2,707 | 725 | 1,624 | 0 | 7,303 | 147,734 |
| L2 | 4,873 | 1,011 | 220 | 124 | 3 | 2 | 6,233 | 41 | 0 | 41 | 7,218 | 228 | 210 | 116 | 326 | 64 | 63 | 0 | 681 | 14,173 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 67,908 | 43,164 | 8,292 | 4,055 | 40 | 22 | 123,481 | 7 | 0 | 7 | 91,950 | 5,464 | 3,804 | 2,054 | 5,858 | 1,643 | 2,689 | 0 | 15,654 | 231,092 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,512 | 365 | 184 | 129 | 4 | 3 | 2,197 | 17 | 0 | 17 | 2,633 | 79 | 33 | 20 | 53 | 14 | 23 | 0 | 169 | 5,016 |
| 合計 | 122,628 | 70,601 | 12,789 | 6,054 | 73 | 46 | 212,191 | 76 | 0 | 76 | 161,953 | 8,018 | 5,693 | 3,251 | 8,944 | 2,446 | 4,399 | 0 | 23,807 | 398,027 |

様式-3 被害額 (事業実施後：H25時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/100 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,736 | 30,410 | 5,046 | 2,113 | 30 | 21 | 93,356 | 12 | 0 | 12 | 69,877 | 2,675 | 1,912 | 1,209 | 3,121 | 875 | 1,895 | 0 | 8,566 | 171,811 |
| L2 | 5,692 | 1,224 | 257 | 145 | 3 | 3 | 7,324 | 50 | 0 | 50 | 8,625 | 256 | 244 | 135 | 379 | 72 | 76 | 0 | 783 | 16,782 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 76,808 | 47,933 | 9,692 | 4,728 | 46 | 24 | 139,231 | 11 | 0 | 11 | 103,878 | 6,454 | 4,410 | 2,350 | 6,760 | 1,946 | 2,986 | 0 | 18,146 | 261,266 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,837 | 494 | 207 | 147 | 5 | 3 | 2,693 | 18 | 0 | 18 | 3,042 | 86 | 35 | 23 | 58 | 15 | 31 | 0 | 190 | 5,943 |
| 合計 | 140,073 | 80,061 | 15,202 | 7,133 | 84 | 51 | 242,604 | 92 | 0 | 92 | 185,487 | 9,471 | 6,601 | 3,717 | 10,318 | 2,908 | 4,988 | 0 | 27,685 | 455,868 |

様式-3 (被害額：全体事業)：R01-1 時点④ 飯野箇所：侵食対策 (右岸 4.2k)

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R01時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | | 河川名：土器川 | | | | 流量規模：1/10 | | | | (単位：百万円) | | | |
|--------|--------|-------------------|-------|-----|-------|-----------|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------|----------|-------|--------|---|
| 汎濫ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 15,055 | 11,377 | 1,372 | 606 | 8 | 6 | 28,424 | 1 | 0 | 1 | 21,128 | 818 | 749 | 493 | 1,242 | 244 | 709 | 0 | 3,013 | 52,566 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 134 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 258 | |
| 合計 | 15,170 | 11,407 | 1,374 | 607 | 8 | 6 | 28,572 | 3 | 0 | 3 | 21,350 | 821 | 754 | 496 | 1,250 | 245 | 711 | 0 | 3,027 | 52,952 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：H25時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | | 河川名：土器川 | | | | 流量規模：1/20 | | | | (単位：百万円) | | | |
|--------|--------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------|----------|-------|---------|---|
| 汎濫ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 13,155 | 7,079 | 1,236 | 556 | 8 | 6 | 22,040 | 0 | 0 | 0 | 16,354 | 774 | 474 | 321 | 795 | 224 | 441 | 0 | 2,234 | 40,628 | |
| L2 | 816 | 79 | 29 | 14 | 0 | 0 | 938 | 12 | 0 | 12 | 1,465 | 43 | 38 | 20 | 58 | 11 | 5 | 0 | 117 | 2,532 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 19,412 | 14,193 | 1,796 | 819 | 11 | 8 | 36,239 | 1 | 0 | 1 | 26,938 | 1,044 | 967 | 601 | 1,568 | 336 | 884 | 0 | 3,832 | 67,010 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 296 | |
| 合計 | 33,466 | 21,379 | 3,063 | 1,390 | 19 | 14 | 59,331 | 14 | 0 | 14 | 44,928 | 1,863 | 1,482 | 944 | 2,426 | 572 | 1,332 | 0 | 6,193 | 110,466 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：H25時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | | 河川名：土器川 | | | | 流量規模：1/30 | | | | (単位：百万円) | | | |
|--------|--------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|---------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------|----------|--------|---------|---|
| 汎濫ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 22,782 | 12,420 | 2,533 | 1,040 | 14 | 11 | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 28,806 | 1,332 | 837 | 554 | 1,391 | 398 | 774 | 0 | 3,895 | 71,501 | |
| L2 | 405 | 63 | 16 | 6 | 0 | 0 | 490 | 4 | 0 | 4 | 584 | 21 | 17 | 9 | 26 | 6 | 4 | 0 | 57 | 1,135 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 42,984 | 28,883 | 4,088 | 2,003 | 23 | 15 | 77,996 | 3 | 0 | 3 | 58,004 | 2,521 | 2,199 | 1,267 | 3,466 | 815 | 1,799 | 0 | 8,601 | 144,604 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,141 | 241 | 125 | 79 | 3 | 2 | 1,591 | 15 | 0 | 15 | 2,040 | 66 | 29 | 17 | 46 | 12 | 15 | 0 | 139 | 3,785 | |
| 合計 | 67,312 | 41,607 | 6,762 | 3,128 | 40 | 28 | 118,877 | 22 | 0 | 22 | 89,434 | 3,940 | 3,082 | 1,847 | 4,929 | 1,231 | 2,592 | 0 | 12,692 | 221,025 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：H25時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | | 河川名：土器川 | | | | 流量規模：1/50 | | | | (単位：百万円) | | | |
|--------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------|----------|--------|---------|---|
| 汎濫ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 38,904 | 22,040 | 3,612 | 1,527 | 19 | 14 | 66,116 | 1 | 0 | 1 | 49,103 | 1,984 | 1,416 | 915 | 2,331 | 616 | 1,373 | 0 | 6,304 | 121,524 | |
| L2 | 3,533 | 612 | 158 | 87 | 1 | 1 | 4,392 | 32 | 0 | 32 | 5,307 | 185 | 162 | 87 | 249 | 50 | 38 | 0 | 522 | 10,253 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 59,579 | 38,277 | 6,803 | 3,379 | 34 | 19 | 108,091 | 5 | 0 | 5 | 80,440 | 4,471 | 3,251 | 1,782 | 5,033 | 1,344 | 2,385 | 0 | 13,233 | 201,769 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,378 | 310 | 148 | 98 | 3 | 2 | 1,939 | 16 | 0 | 16 | 2,357 | 73 | 32 | 19 | 51 | 19 | 0 | 0 | 156 | 4,468 | |
| 合計 | 103,394 | 61,239 | 10,721 | 5,091 | 57 | 36 | 180,538 | 54 | 0 | 54 | 137,219 | 6,713 | 4,861 | 2,803 | 7,664 | 2,023 | 3,815 | 0 | 20,215 | 338,026 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：H25時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | | 河川名：土器川 | | | | 流量規模：1/70 | | | | (単位：百万円) | | | |
|--------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------|----------|--------|---------|---|
| 汎濫ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 48,335 | 26,061 | 4,093 | 1,746 | 26 | 19 | 80,280 | 11 | 0 | 11 | 60,140 | 2,247 | 1,646 | 1,061 | 2,707 | 725 | 1,624 | 0 | 7,303 | 147,734 | |
| L2 | 4,873 | 1,011 | 220 | 124 | 3 | 2 | 6,233 | 41 | 0 | 41 | 7,218 | 228 | 210 | 116 | 326 | 64 | 63 | 0 | 681 | 14,173 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 67,908 | 43,164 | 8,292 | 4,055 | 40 | 22 | 123,481 | 7 | 0 | 7 | 91,950 | 5,464 | 3,804 | 2,054 | 5,858 | 1,643 | 2,689 | 0 | 15,654 | 231,092 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,512 | 365 | 184 | 129 | 4 | 3 | 2,197 | 17 | 0 | 17 | 2,633 | 79 | 33 | 20 | 53 | 14 | 23 | 0 | 169 | 5,016 | |
| 合計 | 122,628 | 70,601 | 12,789 | 6,054 | 73 | 46 | 212,191 | 76 | 0 | 76 | 161,953 | 8,018 | 5,693 | 3,251 | 8,944 | 2,446 | 4,399 | 0 | 23,807 | 398,027 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：H25時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | | 河川名：土器川 | | | | 流量規模：1/100 | | | | (単位：百万円) | | | |
|--------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|------------|---------------|--------------------|----------|----------|--------|---------|--|
| 汎濫ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,736 | 30,410 | 5,046 | 2,113 | 30 | 21 | 93,356 | 12 | 0 | 12 | 69,877 | 2,675 | 1,912 | 1,209 | 3,121 | 875 | 1,895 | 0 | 8,566 | 171,811 | |
| L2 | 5,692 | 1,224 | 257 | 145 | 3 | 3 | 7,324 | 50 | 0 | 50 | 8,625 | 256 | 244 | 135 | 379 | 72 | 76 | 0 | 783 | 16,782 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| R1 | 76,808 | 47,933 | 9,692 | 4,728 | 46 | 24 | 139,231 | 11 | 0 | 11 | 103,878 | 6,454 | 4,410 | 2,350 | 6,760 | 1,946 | 2,986 | 0 | 18,146 | 261,266 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| R3 | 1,837 | 494 | 207 | 147 | 5 | 3 | 2,693 | 18 | 0 | 18 | 3,042 | 86 | 35 | 23 | 58 | 15 | 31 | 0 | 190 | 5,943 | |
| 合計 | 140,073 | 80,061 | 15,202 | 7,133 | 84 | 51 | 242,604 | 92 | 0 | 92 | 185,487 | 9,471 | 6,601 | 3,717 | 10,318 | 2,908 | 4,988 | 0 | 27,685 | 455,868 | |

様式-3 (被害額: 全体事業): R1-3 時点⑥ 飯野箇所: 堤防拡幅 (右岸 1.0k~1.2k)

| 様式-3 被害額 (事業実施後: R01時点) | | 水系名: 土器川水系 | | 河川名: 土器川 | | 流量規模: 1/10 | | (単位: 百万円) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|-------|----------|-------|------------|--------|-----------|----|--------------------|------------|------------------|---------------|-----|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|-------|--------|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被 害額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他 の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃 労働 費対価 | 代替 活動 等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 14,793 | 11,303 | 1,349 | 590 | 7 | 6 | 28,048 | 1 | 0 | 1 | 20,849 | 804 | 740 | 490 | 1,230 | 239 | 704 | 0 | 2,977 | 51,875 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 134 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 258 |
| 合計 | 14,908 | 11,333 | 1,351 | 591 | 7 | 6 | 28,196 | 3 | 0 | 3 | 21,071 | 807 | 745 | 493 | 1,238 | 240 | 706 | 0 | 2,991 | 52,261 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後: H31時点) | | 水系名: 土器川水系 | | 河川名: 土器川 | | 流量規模: 1/20 | | (単位: 百万円) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|-------|----------|-------|------------|--------|-----------|----|--------------------|------------|------------------|---------------|-----|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|-------|--------|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被 害額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他 の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃 労働 費対価 | 代替 活動 等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 13,155 | 7,079 | 1,236 | 556 | 8 | 6 | 22,040 | 0 | 0 | 0 | 16,354 | 774 | 474 | 321 | 795 | 224 | 441 | 0 | 2,234 | 40,628 |
| L2 | 816 | 79 | 29 | 14 | 0 | 0 | 938 | 12 | 0 | 12 | 1,465 | 43 | 38 | 20 | 58 | 11 | 5 | 0 | 117 | 2,532 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 14,793 | 11,303 | 1,349 | 590 | 7 | 6 | 28,048 | 1 | 0 | 1 | 20,849 | 804 | 740 | 490 | 1,230 | 239 | 704 | 0 | 2,977 | 51,875 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 296 |
| 合計 | 28,847 | 18,489 | 2,616 | 1,161 | 15 | 12 | 51,140 | 14 | 0 | 14 | 38,839 | 1,623 | 1,255 | 833 | 2,088 | 475 | 1,152 | 0 | 5,338 | 95,331 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後: H31時点) | | 水系名: 土器川水系 | | 河川名: 土器川 | | 流量規模: 1/30 | | (単位: 百万円) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|-------|----------|-------|------------|---------|-----------|----|--------------------|------------|------------------|---------------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|--------|---------|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被 害額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他 の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃 労働 費対価 | 代替 活動 等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 22,782 | 12,420 | 2,533 | 1,040 | 14 | 11 | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 28,806 | 1,332 | 837 | 554 | 1,391 | 398 | 774 | 0 | 3,895 | 71,501 |
| L2 | 405 | 63 | 16 | 6 | 0 | 0 | 490 | 4 | 0 | 4 | 584 | 21 | 17 | 9 | 26 | 6 | 4 | 0 | 57 | 1,135 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 42,984 | 28,883 | 4,088 | 2,003 | 23 | 15 | 77,996 | 3 | 0 | 3 | 58,004 | 2,521 | 2,199 | 1,267 | 3,466 | 815 | 1,799 | 0 | 8,601 | 144,604 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,141 | 241 | 125 | 79 | 3 | 2 | 1,591 | 15 | 0 | 15 | 2,040 | 66 | 29 | 17 | 46 | 12 | 15 | 0 | 139 | 3,785 |
| 合計 | 67,312 | 41,607 | 6,762 | 3,128 | 40 | 28 | 118,877 | 22 | 0 | 22 | 89,434 | 3,940 | 3,082 | 1,847 | 4,929 | 1,231 | 2,592 | 0 | 12,692 | 221,025 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後: H31時点) | | 水系名: 土器川水系 | | 河川名: 土器川 | | 流量規模: 1/50 | | (単位: 百万円) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------|----------|-------|------------|---------|-----------|----|--------------------|------------|------------------|---------------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|--------|---------|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被 害額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他 の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃 労働 費対価 | 代替 活動 等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 38,904 | 22,040 | 3,612 | 1,527 | 19 | 14 | 66,116 | 1 | 0 | 1 | 49,103 | 1,984 | 1,416 | 915 | 2,331 | 616 | 1,373 | 0 | 6,304 | 121,524 |
| L2 | 3,533 | 612 | 158 | 87 | 1 | 1 | 4,392 | 32 | 0 | 32 | 5,307 | 185 | 162 | 87 | 249 | 50 | 38 | 0 | 522 | 10,253 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 59,579 | 38,277 | 6,803 | 3,379 | 34 | 19 | 108,091 | 5 | 0 | 5 | 80,440 | 4,471 | 3,251 | 1,782 | 5,033 | 1,344 | 2,385 | 0 | 13,233 | 201,769 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,378 | 310 | 148 | 98 | 3 | 2 | 1,939 | 16 | 0 | 16 | 2,357 | 73 | 32 | 19 | 51 | 13 | 19 | 0 | 156 | 4,468 |
| 合計 | 103,394 | 61,239 | 10,721 | 5,091 | 57 | 36 | 180,538 | 54 | 0 | 54 | 137,219 | 6,713 | 4,861 | 2,803 | 7,664 | 2,023 | 3,815 | 0 | 20,215 | 338,026 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後: H31時点) | | 水系名: 土器川水系 | | 河川名: 土器川 | | 流量規模: 1/70 | | (単位: 百万円) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------|----------|-------|------------|---------|-----------|----|--------------------|------------|------------------|---------------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|--------|---------|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被 害額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他 の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃 労働 費対価 | 代替 活動 等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 48,335 | 26,061 | 4,093 | 1,746 | 26 | 19 | 80,280 | 11 | 0 | 11 | 60,140 | 2,247 | 1,646 | 1,061 | 2,707 | 725 | 1,624 | 0 | 7,303 | 147,734 |
| L2 | 4,873 | 1,011 | 220 | 124 | 3 | 2 | 6,233 | 41 | 0 | 41 | 7,218 | 228 | 210 | 116 | 326 | 64 | 63 | 0 | 681 | 14,173 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 67,908 | 43,164 | 8,292 | 4,055 | 40 | 22 | 123,481 | 7 | 0 | 7 | 91,950 | 5,464 | 3,804 | 2,054 | 5,858 | 1,643 | 2,689 | 0 | 15,654 | 231,092 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,512 | 365 | 184 | 129 | 4 | 3 | 2,197 | 17 | 0 | 17 | 2,633 | 79 | 33 | 20 | 53 | 14 | 23 | 0 | 169 | 5,016 |
| 合計 | 122,628 | 70,601 | 12,789 | 6,054 | 73 | 46 | 212,191 | 76 | 0 | 76 | 161,953 | 8,018 | 5,693 | 3,251 | 8,944 | 2,446 | 4,399 | 0 | 23,807 | 398,027 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後: H31時点) | | 水系名: 土器川水系 | | 河川名: 土器川 | | 流量規模: 1/100 | | (単位: 百万円) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------|----------|-------|-------------|---------|-----------|----|--------------------|------------|------------------|---------------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|--------|---------|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被 害額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他 の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃 労働 費対価 | 代替 活動 等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,736 | 30,410 | 5,046 | 2,113 | 30 | 21 | 93,356 | 12 | 0 | 12 | 69,877 | 2,675 | 1,912 | 1,209 | 3,121 | 875 | 1,895 | 0 | 8,566 | 171,811 |
| L2 | 5,692 | 1,224 | 257 | 145 | 3 | 3 | 7,324 | 50 | 0 | 50 | 8,625 | 256 | 244 | 135 | 379 | 72 | 76 | 0 | 783 | 16,782 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 76,808 | 47,933 | 9,692 | 4,728 | 46 | 24 | 139,231 | 11 | 0 | 11 | 103,878 | 6,454 | 4,410 | 2,350 | 6,760 | 1,946 | 2,986 | 0 | 18,146 | 261,266 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,837 | 494 | 207 | 147 | 5 | 3 | 2,693 | 18 | 0 | 18 | 3,042 | 86 | 35 | 23 | 58 | 15 | 31 | 0 | 190 | 5,943 |
| 合計 | 140,073 | 80,061 | 15,202 | 7,133 | 84 | 51 | 242,604 | 92 | 0 | 92 | 185,487 | 9,471 | 6,601 | 3,717 | 10,318 | 2,908 | 4,988 | 0 | 27,685 | 455,868 |

様式-3 (被害額: 全体事業): R2 時点⑦ 飯野箇所: 河道掘削 (0.8k~1.4k)

様式-3 被害額 (事業実施後: R2時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/10 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|-------|-----|-------|----|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-----|---------------|--------------------|----------|----|-------|--------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 14,793 | 11,303 | 1,349 | 590 | 7 | 6 | 28,048 | 1 | 0 | 1 | 20,849 | 804 | 740 | 490 | 1,230 | 239 | 704 | 0 | 2,977 | 51,875 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 134 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 258 |
| 合計 | 14,908 | 11,333 | 1,351 | 591 | 7 | 6 | 28,196 | 3 | 0 | 3 | 21,071 | 807 | 745 | 493 | 1,238 | 240 | 706 | 0 | 2,991 | 52,261 |

様式-3 被害額 (事業実施後: R2時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/20 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|-------|-----|-------|----|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-----|---------------|--------------------|----------|----|-------|--------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 11,893 | 5,628 | 643 | 294 | 3 | 2 | 18,463 | 0 | 0 | 0 | 13,699 | 565 | 512 | 320 | 832 | 131 | 351 | 0 | 1,879 | 34,041 |
| L2 | 816 | 79 | 29 | 14 | 0 | 0 | 938 | 12 | 0 | 12 | 1,465 | 43 | 38 | 20 | 58 | 11 | 5 | 0 | 117 | 2,532 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 14,793 | 11,303 | 1,349 | 590 | 7 | 6 | 28,048 | 1 | 0 | 1 | 20,849 | 804 | 740 | 490 | 1,230 | 239 | 704 | 0 | 2,977 | 51,875 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 296 |
| 合計 | 27,585 | 17,038 | 2,023 | 899 | 10 | 8 | 47,563 | 14 | 0 | 14 | 36,184 | 1,414 | 1,293 | 832 | 2,125 | 382 | 1,062 | 0 | 4,983 | 88,744 |

様式-3 被害額 (事業実施後: R2時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/30 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 20,934 | 11,484 | 1,513 | 654 | 7 | 6 | 34,598 | 0 | 0 | 0 | 25,671 | 1,064 | 794 | 527 | 1,321 | 294 | 715 | 0 | 3,394 | 63,663 |
| L2 | 405 | 63 | 16 | 6 | 0 | 0 | 490 | 4 | 0 | 4 | 584 | 21 | 17 | 9 | 26 | 6 | 4 | 0 | 57 | 1,135 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 42,984 | 28,883 | 4,088 | 2,003 | 23 | 15 | 77,996 | 3 | 0 | 3 | 58,004 | 2,521 | 2,199 | 1,267 | 3,466 | 815 | 1,799 | 0 | 8,601 | 144,604 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,141 | 241 | 125 | 79 | 3 | 2 | 1,591 | 15 | 0 | 15 | 2,040 | 66 | 29 | 17 | 46 | 12 | 15 | 0 | 139 | 3,785 |
| 合計 | 65,464 | 40,671 | 5,742 | 2,742 | 33 | 23 | 114,675 | 22 | 0 | 22 | 86,299 | 3,672 | 3,039 | 1,820 | 4,859 | 1,127 | 2,533 | 0 | 12,191 | 213,187 |

様式-3 被害額 (事業実施後: R2時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/50 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 38,904 | 22,040 | 3,612 | 1,527 | 19 | 14 | 66,116 | 1 | 0 | 1 | 49,103 | 1,984 | 1,416 | 915 | 2,331 | 616 | 1,373 | 0 | 6,304 | 121,524 |
| L2 | 3,533 | 612 | 158 | 87 | 1 | 1 | 4,392 | 32 | 0 | 32 | 5,307 | 185 | 162 | 87 | 249 | 50 | 38 | 0 | 522 | 10,253 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 59,579 | 38,277 | 6,803 | 3,379 | 34 | 19 | 108,091 | 5 | 0 | 5 | 80,440 | 4,471 | 3,251 | 1,782 | 5,033 | 1,344 | 2,385 | 0 | 13,233 | 201,769 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,378 | 310 | 148 | 98 | 3 | 2 | 1,939 | 16 | 0 | 16 | 2,357 | 73 | 32 | 19 | 51 | 19 | 0 | 0 | 156 | 4,468 |
| 合計 | 103,394 | 61,239 | 10,721 | 5,091 | 57 | 36 | 180,538 | 54 | 0 | 54 | 137,219 | 6,713 | 4,861 | 2,803 | 7,664 | 2,023 | 3,815 | 0 | 20,215 | 338,026 |

様式-3 被害額 (事業実施後: R2時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/70 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 48,335 | 26,061 | 4,093 | 1,746 | 26 | 19 | 80,280 | 11 | 0 | 11 | 60,140 | 2,247 | 1,646 | 1,061 | 2,707 | 725 | 1,624 | 0 | 7,303 | 147,734 |
| L2 | 4,873 | 1,011 | 220 | 124 | 3 | 2 | 6,233 | 41 | 0 | 41 | 7,218 | 228 | 210 | 116 | 326 | 64 | 63 | 0 | 681 | 14,173 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 67,908 | 43,164 | 8,292 | 4,055 | 40 | 22 | 123,481 | 7 | 0 | 7 | 91,950 | 5,464 | 3,804 | 2,054 | 5,858 | 1,643 | 2,689 | 0 | 15,654 | 231,092 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,512 | 365 | 184 | 129 | 4 | 3 | 2,197 | 17 | 0 | 17 | 2,633 | 79 | 33 | 20 | 53 | 14 | 23 | 0 | 169 | 5,016 |
| 合計 | 122,628 | 70,601 | 12,789 | 6,054 | 73 | 46 | 212,191 | 76 | 0 | 76 | 161,953 | 8,018 | 5,693 | 3,251 | 8,944 | 2,446 | 4,399 | 0 | 23,807 | 398,027 |

様式-3 被害額 (事業実施後: R2時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/100 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,736 | 30,410 | 5,046 | 2,113 | 30 | 21 | 93,356 | 12 | 0 | 12 | 69,877 | 2,675 | 1,912 | 1,209 | 3,121 | 875 | 1,895 | 0 | 8,566 | 171,811 |
| L2 | 5,692 | 1,224 | 257 | 145 | 3 | 3 | 7,324 | 50 | 0 | 50 | 8,625 | 256 | 244 | 135 | 379 | 72 | 76 | 0 | 783 | 16,782 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| R1 | 76,808 | 47,933 | 9,692 | 4,728 | 46 | 24 | 139,231 | 11 | 0 | 11 | 103,878 | 6,454 | 4,410 | 2,350 | 6,760 | 1,946 | 2,986 | 0 | 18,146 | 261,266 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| R3 | 1,837 | 494 | 207 | 147 | 5 | 3 | 2,693 | 18 | 0 | 18 | 3,042 | 86 | 35 | 23 | 58 | 15 | 31 | 0 | 190 | 5,943 |
| 合計 | 140,073 | 80,061 | 15,202 | 7,133 | 84 | 51 | 242,604 | 92 | 0 | 92 | 185,487 | 9,471 | 6,601 | 3,717 | 10,318 | 2,908 | 4,988 | 0 | 27,685 | 455,868 |

様式-3 (被害額: 全体事業): R14-1 時点⑧ 飯野箇所: 引堤 (右岸 1.4k~2.0k)

| 様式-3 被害額 (事業実施後: R14-1時点) | | 水系名: 土器川水系 | | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/10 | | | | (単位: 百万円) | | | | | | | |
|---------------------------|---------|------------|--------|----|-------|----------|------------|--------|--------------|-----|-----|---------------|--------------------|----------|----|----|----|--------|-------|----|
| 汎濫ブロック | 一般資産被害額 | | 農作物被害額 | | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| L2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 128 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 134 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 258 | |
| 合計 | 115 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 148 | 2 | 0 | 2 | 222 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 386 | |

| 様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点1) | | 水系名: 土器川水系 | | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/20 | | | | (単位: 百万円) | | | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|--------|-----|-------|----------|------------|--------|--------------|-----|--------|---------------|--------------------|----------|-----|-----|-----|--------|-------|--------|
| 汎濫ブロック | 一般資産被害額 | | 農作物被害額 | | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 11,893 | 5,628 | 643 | 294 | 3 | 2 | 18,463 | 0 | 0 | 0 | 13,699 | 565 | 512 | 320 | 832 | 131 | 351 | 0 | 1,879 | 34,041 |
| L2 | 816 | 79 | 29 | 14 | 0 | 0 | 938 | 12 | 0 | 12 | 1,465 | 43 | 38 | 20 | 58 | 11 | 5 | 0 | 117 | 2,532 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 296 |
| 合計 | 12,792 | 5,735 | 674 | 309 | 3 | 2 | 19,515 | 13 | 0 | 13 | 15,335 | 610 | 553 | 342 | 895 | 143 | 358 | 0 | 2,006 | 36,869 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点1) | | 水系名: 土器川水系 | | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/30 | | | | (単位: 百万円) | | | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|--------|-------|-------|----------|------------|--------|--------------|-----|--------|---------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 汎濫ブロック | 一般資産被害額 | | 農作物被害額 | | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 20,934 | 11,484 | 1,513 | 654 | 7 | 6 | 34,598 | 0 | 0 | 0 | 25,671 | 1,064 | 794 | 527 | 1,321 | 294 | 715 | 0 | 3,394 | 63,663 |
| L2 | 405 | 63 | 16 | 6 | 0 | 0 | 490 | 4 | 0 | 4 | 584 | 21 | 17 | 9 | 26 | 6 | 4 | 0 | 57 | 1,135 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 42,984 | 28,883 | 4,088 | 2,003 | 23 | 15 | 77,996 | 3 | 0 | 3 | 58,004 | 2,521 | 2,199 | 1,267 | 3,466 | 815 | 1,799 | 0 | 8,601 | 144,604 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,141 | 241 | 125 | 79 | 3 | 2 | 1,591 | 15 | 0 | 15 | 2,040 | 66 | 29 | 17 | 46 | 12 | 15 | 0 | 139 | 3,785 |
| 合計 | 65,464 | 40,671 | 5,742 | 2,742 | 33 | 23 | 114,675 | 22 | 0 | 22 | 86,299 | 3,672 | 3,039 | 1,820 | 4,859 | 1,127 | 2,533 | 0 | 12,191 | 213,187 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点1) | | 水系名: 土器川水系 | | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/50 | | | | (単位: 百万円) | | | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|--------|-------|-------|----------|------------|--------|--------------|-----|---------|---------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 汎濫ブロック | 一般資産被害額 | | 農作物被害額 | | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 38,904 | 22,040 | 3,612 | 1,527 | 19 | 14 | 66,116 | 1 | 0 | 1 | 49,103 | 1,984 | 1,416 | 915 | 2,331 | 616 | 1,373 | 0 | 6,304 | 121,524 |
| L2 | 3,533 | 612 | 158 | 87 | 1 | 1 | 4,392 | 32 | 0 | 32 | 5,307 | 185 | 162 | 87 | 249 | 50 | 38 | 0 | 522 | 10,253 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 59,579 | 38,277 | 6,803 | 3,379 | 34 | 19 | 108,091 | 5 | 0 | 5 | 80,440 | 4,471 | 3,251 | 1,782 | 5,033 | 1,344 | 2,385 | 0 | 13,233 | 201,769 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,378 | 310 | 148 | 98 | 3 | 2 | 1,939 | 16 | 0 | 16 | 2,357 | 73 | 32 | 19 | 51 | 19 | 19 | 0 | 156 | 4,468 |
| 合計 | 103,394 | 61,239 | 10,721 | 5,091 | 57 | 36 | 180,538 | 54 | 0 | 54 | 137,219 | 6,713 | 4,861 | 2,803 | 7,664 | 2,023 | 3,815 | 0 | 20,215 | 338,026 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点1) | | 水系名: 土器川水系 | | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/70 | | | | (単位: 百万円) | | | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|--------|-------|-------|----------|------------|--------|--------------|-----|---------|---------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 汎濫ブロック | 一般資産被害額 | | 農作物被害額 | | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 48,335 | 26,061 | 4,093 | 1,746 | 26 | 19 | 80,280 | 11 | 0 | 11 | 60,140 | 2,247 | 1,646 | 1,061 | 2,707 | 725 | 1,624 | 0 | 7,303 | 147,734 |
| L2 | 4,873 | 1,011 | 220 | 124 | 3 | 2 | 6,233 | 41 | 0 | 41 | 7,218 | 228 | 210 | 116 | 326 | 64 | 63 | 0 | 681 | 14,173 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 67,908 | 43,164 | 8,292 | 4,055 | 40 | 22 | 123,481 | 7 | 0 | 7 | 91,950 | 5,464 | 3,804 | 2,054 | 5,858 | 1,643 | 2,689 | 0 | 15,654 | 231,092 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,512 | 365 | 184 | 129 | 4 | 3 | 2,197 | 17 | 0 | 17 | 2,633 | 79 | 33 | 20 | 53 | 14 | 23 | 0 | 169 | 5,016 |
| 合計 | 122,628 | 70,601 | 12,789 | 6,054 | 73 | 46 | 212,191 | 76 | 0 | 76 | 161,953 | 8,018 | 5,693 | 3,251 | 8,944 | 2,446 | 4,399 | 0 | 23,807 | 398,027 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点1) | | 水系名: 土器川水系 | | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/100 | | | | (単位: 百万円) | | | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|--------|-------|-------|----------|------------|--------|--------------|-----|---------|---------------|--------------------|----------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 汎濫ブロック | 一般資産被害額 | | 農作物被害額 | | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,736 | 30,410 | 5,046 | 2,113 | 30 | 21 | 93,356 | 12 | 0 | 12 | 69,877 | 2,675 | 1,912 | 1,209 | 3,121 | 875 | 1,895 | 0 | 8,566 | 171,811 |
| L2 | 5,692 | 1,224 | 257 | 145 | 3 | 3 | 7,324 | 50 | 0 | 50 | 8,625 | 256 | 244 | 135 | 379 | 72 | 76 | 0 | 783 | 16,782 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 76,808 | 47,933 | 9,692 | 4,728 | 46 | 24 | 139,231 | 11 | 0 | 11 | 103,878 | 6,454 | 4,410 | 2,350 | 6,760 | 1,946 | 2,986 | 0 | 18,146 | 261,266 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,837 | 494 | 207 | 147 | 5 | 3 | 2,693 | 18 | 0 | 18 | 3,042 | 86 | 35 | 23 | 58 | 15 | 31 | 0 | 190 | 5,943 |
| 合計 | 140,073 | 80,061 | 15,202 | 7,133 | 84 | 51 | 242,604 | 92 | 0 | 92 | 185,487 | 9,471 | 6,601 | 3,717 | 10,318 | 2,908 | 4,988 | 0 | 27,685 | 455,868 |

様式-3 (被害額:全体事業): R14-2 時点⑨ 土器箇所:堤防拡幅(左岸2.4k)

様式-3 被害額(事業実施後:R14-2時点) 水系名:土器川水系 河川名:土器川 流量規模:1/10 (単位:百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|------|-------|----|-------|----|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|----|---------------|--------------------|----------|----|-----|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 128 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 134 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 258 | |
| 合計 | 115 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 148 | 2 | 0 | 2 | 222 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 386 | |

様式-3 被害額(事業実施後:R14時点2) 水系名:土器川水系 河川名:土器川 流量規模:1/20 (単位:百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|------|-------|----|-------|----|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|----|---------------|--------------------|----------|----|-----|-------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 816 | 79 | 29 | 14 | 0 | 0 | 938 | 12 | 0 | 12 | 1,465 | 43 | 38 | 20 | 58 | 11 | 5 | 0 | 117 | 2,532 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 296 |
| 合計 | 899 | 107 | 31 | 15 | 0 | 0 | 1,052 | 13 | 0 | 13 | 1,636 | 45 | 41 | 22 | 63 | 12 | 7 | 0 | 127 | 2,828 |

様式-3 被害額(事業実施後:R14時点2) 水系名:土器川水系 河川名:土器川 流量規模:1/30 (単位:百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|----|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|-------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 405 | 63 | 16 | 6 | 0 | 0 | 490 | 4 | 0 | 4 | 584 | 21 | 17 | 9 | 26 | 6 | 4 | 0 | 57 | 1,135 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 42,984 | 28,883 | 4,088 | 2,003 | 23 | 15 | 77,996 | 3 | 0 | 3 | 58,004 | 2,521 | 2,199 | 1,267 | 3,466 | 815 | 1,799 | 0 | 8,601 | 144,604 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,141 | 241 | 125 | 79 | 3 | 2 | 1,591 | 15 | 0 | 15 | 2,040 | 66 | 29 | 17 | 46 | 12 | 15 | 0 | 139 | 3,785 |
| 合計 | 44,530 | 29,187 | 4,229 | 2,088 | 26 | 17 | 80,077 | 22 | 0 | 22 | 60,628 | 2,608 | 2,245 | 1,293 | 3,538 | 833 | 1,818 | 0 | 8,797 | 149,524 |

様式-3 被害額(事業実施後:R14時点2) 水系名:土器川水系 河川名:土器川 流量規模:1/50 (単位:百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 38,904 | 22,040 | 3,612 | 1,527 | 19 | 14 | 66,116 | 1 | 0 | 1 | 49,103 | 1,984 | 1,416 | 915 | 2,331 | 616 | 1,373 | 0 | 6,304 | 121,524 |
| L2 | 3,533 | 612 | 158 | 87 | 1 | 1 | 4,392 | 32 | 0 | 32 | 5,307 | 185 | 162 | 87 | 249 | 50 | 38 | 0 | 522 | 10,253 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 59,579 | 38,277 | 6,803 | 3,379 | 34 | 19 | 108,091 | 5 | 0 | 5 | 80,440 | 4,471 | 3,251 | 1,782 | 5,033 | 1,344 | 2,385 | 0 | 13,233 | 201,769 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,378 | 310 | 148 | 98 | 3 | 2 | 1,939 | 16 | 0 | 16 | 2,357 | 73 | 32 | 19 | 51 | 13 | 19 | 0 | 156 | 4,468 |
| 合計 | 103,394 | 61,239 | 10,721 | 5,091 | 57 | 36 | 180,538 | 54 | 0 | 54 | 137,219 | 6,713 | 4,861 | 2,803 | 7,664 | 2,023 | 3,815 | 0 | 20,215 | 338,026 |

様式-3 被害額(事業実施後:R14時点2) 水系名:土器川水系 河川名:土器川 流量規模:1/70 (単位:百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 48,335 | 26,061 | 4,093 | 1,746 | 26 | 19 | 80,280 | 11 | 0 | 11 | 60,140 | 2,247 | 1,646 | 1,061 | 2,707 | 725 | 1,624 | 0 | 7,303 | 147,734 |
| L2 | 4,873 | 1,011 | 220 | 124 | 3 | 2 | 6,233 | 41 | 0 | 41 | 7,218 | 228 | 210 | 116 | 326 | 64 | 63 | 0 | 681 | 14,173 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 67,908 | 43,164 | 8,292 | 4,055 | 40 | 22 | 123,481 | 7 | 0 | 7 | 91,950 | 5,464 | 3,804 | 2,054 | 5,858 | 1,643 | 2,689 | 0 | 15,654 | 231,092 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,512 | 365 | 184 | 129 | 4 | 3 | 2,197 | 17 | 0 | 17 | 2,633 | 79 | 33 | 20 | 53 | 14 | 23 | 0 | 169 | 5,016 |
| 合計 | 122,628 | 70,601 | 12,789 | 6,054 | 73 | 46 | 212,191 | 76 | 0 | 76 | 161,953 | 8,018 | 5,693 | 3,251 | 8,944 | 2,446 | 4,399 | 0 | 23,807 | 398,027 |

様式-3 被害額(事業実施後:R14時点2) 水系名:土器川水系 河川名:土器川 流量規模:1/100 (単位:百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|----|------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,736 | 30,410 | 5,046 | 2,113 | 30 | 21 | 93,356 | 12 | 0 | 12 | 69,877 | 2,675 | 1,912 | 1,209 | 3,121 | 875 | 1,895 | 0 | 8,566 | 171,811 |
| L2 | 5,692 | 1,224 | 257 | 145 | 3 | 3 | 7,324 | 50 | 0 | 50 | 8,625 | 256 | 244 | 135 | 379 | 72 | 76 | 0 | 783 | 16,782 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 76,808 | 47,933 | 9,692 | 4,728 | 46 | 24 | 139,231 | 11 | 0 | 11 | 103,878 | 6,454 | 4,410 | 2,350 | 6,760 | 1,946 | 2,986 | 0 | 18,146 | 261,266 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,837 | 494 | 207 | 147 | 5 | 3 | 2,693 | 18 | 0 | 18 | 3,042 | 86 | 35 | 23 | 58 | 15 | 31 | 0 | 190 | 5,943 |
| 合計 | 140,073 | 80,061 | 15,202 | 7,133 | 84 | 51 | 242,604 | 92 | 0 | 92 | 185,487 | 9,471 | 6,601 | 3,717 | 10,318 | 2,908 | 4,988 | 0 | 27,685 | 455,868 |

様式-3 (被害額：全体事業)：R15時点⑩ 飯野箇所：堤防拡幅 (右岸 3.2k~3.4k)

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R15時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/10 | | (単位：百万円) | | | | | | |
|------------|---------|-------------------|-------|----|-------|----|-----|----|-----|----|------------|-----------|----|--------------------|------------|------------------|---|----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|-----|----|-----|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 134 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 258 | 14 | 386 | | |
| 合計 | 115 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 148 | 2 | 0 | 2 | 222 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 14 | 386 | | | | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R15時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/20 | | (単位：百万円) | | | | | | |
|------------|---------|-------------------|-------|----|-------|----|-------|----|-----|----|------------|-----------|----|--------------------|------------|------------------|---|----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 816 | 79 | 29 | 14 | 0 | 0 | 938 | 12 | 0 | 12 | 1,465 | 43 | 38 | 20 | 58 | 11 | 5 | 0 | 117 | 2,532 | | | | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 296 | | | | |
| 合計 | 899 | 107 | 31 | 15 | 0 | 0 | 1,052 | 13 | 0 | 13 | 1,636 | 45 | 41 | 22 | 63 | 12 | 7 | 0 | 127 | 2,828 | | | | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R15時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/30 | | (単位：百万円) | | | | | | |
|------------|---------|-------------------|-------|----|-------|----|-------|----|-----|----|------------|-----------|----|--------------------|------------|------------------|----|----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 405 | 63 | 16 | 6 | 0 | 0 | 490 | 4 | 0 | 4 | 584 | 21 | 17 | 9 | 26 | 6 | 4 | 0 | 57 | 1,135 | | | | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,141 | 241 | 125 | 79 | 3 | 2 | 1,591 | 15 | 0 | 15 | 2,040 | 66 | 29 | 17 | 46 | 12 | 15 | 0 | 139 | 3,785 | | | | |
| 合計 | 1,546 | 304 | 141 | 85 | 3 | 2 | 2,081 | 19 | 0 | 19 | 2,624 | 87 | 46 | 26 | 72 | 18 | 19 | 0 | 196 | 4,920 | | | | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R15時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/50 | | (単位：百万円) | | | | | | |
|------------|---------|-------------------|-------|-------|-------|----|---------|----|-----|----|------------|-----------|-------|--------------------|------------|------------------|-------|----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 38,904 | 22,040 | 3,612 | 1,527 | 19 | 14 | 66,116 | 1 | 0 | 1 | 49,103 | 1,984 | 1,416 | 915 | 2,331 | 616 | 1,373 | 0 | 6,304 | 121,524 | | | | |
| L2 | 3,533 | 612 | 158 | 87 | 1 | 1 | 4,392 | 32 | 0 | 32 | 5,307 | 185 | 162 | 87 | 249 | 50 | 38 | 0 | 522 | 10,253 | | | | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | |
| R1 | 36,045 | 24,387 | 3,454 | 1,699 | 20 | 12 | 65,617 | 2 | 0 | 2 | 48,761 | 2,159 | 1,933 | 1,099 | 3,032 | 696 | 1,519 | 0 | 7,406 | 121,786 | | | | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,378 | 310 | 148 | 98 | 3 | 2 | 1,939 | 16 | 0 | 16 | 2,357 | 73 | 32 | 19 | 51 | 13 | 19 | 0 | 156 | 4,468 | | | | |
| 合計 | 79,860 | 47,349 | 7,372 | 3,411 | 43 | 29 | 138,064 | 51 | 0 | 51 | 105,540 | 4,401 | 3,543 | 2,120 | 5,663 | 1,375 | 2,949 | 0 | 14,388 | 258,043 | | | | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R15時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/70 | | (単位：百万円) | | | | | | |
|------------|---------|-------------------|--------|-------|-------|----|---------|----|-----|----|------------|-----------|-------|--------------------|------------|------------------|-------|----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 48,335 | 26,061 | 4,093 | 1,746 | 26 | 19 | 80,280 | 11 | 0 | 11 | 60,140 | 2,247 | 1,646 | 1,061 | 2,707 | 725 | 1,624 | 0 | 7,303 | 147,734 | | | | |
| L2 | 4,873 | 1,011 | 220 | 124 | 3 | 2 | 6,233 | 41 | 0 | 41 | 7,218 | 228 | 210 | 116 | 326 | 64 | 63 | 0 | 681 | 14,173 | | | | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | |
| R1 | 60,344 | 38,705 | 6,892 | 3,418 | 34 | 19 | 109,412 | 5 | 0 | 5 | 81,434 | 4,520 | 3,282 | 1,797 | 5,079 | 1,360 | 2,411 | 0 | 13,370 | 204,221 | | | | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,512 | 365 | 184 | 129 | 4 | 3 | 2,197 | 17 | 0 | 17 | 2,633 | 79 | 33 | 20 | 53 | 14 | 23 | 0 | 169 | 5,016 | | | | |
| 合計 | 115,064 | 66,142 | 11,389 | 5,417 | 67 | 43 | 198,122 | 74 | 0 | 74 | 151,437 | 7,074 | 5,171 | 2,994 | 8,165 | 2,163 | 4,121 | 0 | 21,523 | 371,156 | | | | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R15時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/100 | | (単位：百万円) | | | | | | |
|------------|---------|-------------------|--------|-------|-------|----|---------|----|-----|----|------------|-----------|-------|--------------------|------------|------------------|-------|----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,736 | 30,410 | 5,046 | 2,113 | 30 | 21 | 93,356 | 12 | 0 | 12 | 69,877 | 2,675 | 1,912 | 1,209 | 3,121 | 875 | 1,895 | 0 | 8,566 | 171,811 | | | | |
| L2 | 5,692 | 1,224 | 257 | 145 | 3 | 3 | 7,324 | 50 | 0 | 50 | 8,625 | 256 | 244 | 135 | 379 | 72 | 76 | 0 | 783 | 16,782 | | | | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | | |
| R1 | 70,022 | 44,330 | 8,556 | 4,189 | 41 | 22 | 127,160 | 8 | 0 | 8 | 94,758 | 5,642 | 3,924 | 2,115 | 6,039 | 1,694 | 2,762 | 0 | 16,137 | 238,063 | | | | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | |
| R3 | 1,837 | 494 | 207 | 147 | 5 | 3 | 2,693 | 18 | 0 | 18 | 3,042 | 86 | 35 | 23 | 58 | 15 | 31 | 0 | 190 | 5,943 | | | | |
| 合計 | 133,287 | 76,458 | 14,066 | 6,594 | 79 | 49 | 230,533 | 89 | 0 | 89 | 176,367 | 8,659 | 6,115 | 3,482 | 9,597 | 2,656 | 4,764 | 0 | 25,676 | 432,665 | | | | |

様式-3 (被害額：全体事業)：R17時点① 長尾箇所：堤防整備 (右岸 16.5k~16.9k)

様式-3 被害額 (事業実施後：R17時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/10 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|------|-------|----|-------|----|----|----|--------|----|--------|------------|--------|--------------|----|---|---------------|--------------------|----------|----|----|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労働対価 | | | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

様式-3 被害額 (事業実施後：R17時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/20 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|------|-------|----|-------|----|-----|----|--------|----|--------|------------|--------|--------------|----|---|---------------|--------------------|----------|----|----|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労働対価 | | | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 185 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 222 | 2 | 0 | 2 | 295 | 14 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 268 | 54 | 11 | 3 | 0 | 0 | 336 | 3 | 0 | 3 | 466 | 16 | 11 | 6 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

様式-3 被害額 (事業実施後：R17時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/30 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|------|-------|----|-------|----|-------|----|--------|----|--------|------------|--------|--------------|----|----|---------------|--------------------|----------|----|----|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労働対価 | | | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 405 | 63 | 16 | 6 | 0 | 0 | 490 | 4 | 0 | 4 | 584 | 21 | 17 | 9 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,141 | 241 | 125 | 79 | 3 | 2 | 1,591 | 15 | 0 | 15 | 2,040 | 66 | 29 | 17 | 46 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1,546 | 304 | 141 | 85 | 3 | 2 | 2,081 | 19 | 0 | 19 | 2,624 | 87 | 46 | 26 | 72 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

様式-3 被害額 (事業実施後：R17時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/50 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|----|---------|----|--------|----|---------|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|----|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労働対価 | | | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 38,904 | 22,040 | 3,612 | 1,527 | 19 | 14 | 66,116 | 1 | 0 | 1 | 49,103 | 1,984 | 1,416 | 915 | 2,331 | 616 | 1,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 656 | 109 | 29 | 12 | 0 | 0 | 806 | 9 | 0 | 9 | 1,180 | 30 | 24 | 14 | 38 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 36,045 | 24,387 | 3,454 | 1,699 | 20 | 12 | 65,617 | 2 | 0 | 2 | 48,761 | 2,159 | 1,933 | 1,099 | 3,032 | 696 | 1,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,378 | 310 | 148 | 98 | 3 | 2 | 1,939 | 16 | 0 | 16 | 2,357 | 73 | 32 | 19 | 51 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 76,983 | 46,846 | 7,243 | 3,336 | 42 | 28 | 134,478 | 28 | 0 | 28 | 101,413 | 4,246 | 3,405 | 2,047 | 5,452 | 1,334 | 2,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

様式-3 被害額 (事業実施後：R17時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/70 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|----|--------|----|---------|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|----|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労働対価 | | | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 48,335 | 26,061 | 4,093 | 1,746 | 26 | 19 | 80,280 | 11 | 0 | 11 | 60,140 | 2,247 | 1,646 | 1,061 | 2,707 | 725 | 1,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 1,069 | 150 | 40 | 18 | 0 | 0 | 1,277 | 13 | 0 | 13 | 1,787 | 50 | 44 | 24 | 68 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 60,344 | 38,705 | 6,892 | 3,418 | 34 | 19 | 109,412 | 5 | 0 | 5 | 81,434 | 4,520 | 3,282 | 1,797 | 5,079 | 1,360 | 2,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,512 | 365 | 184 | 129 | 4 | 3 | 2,197 | 17 | 0 | 17 | 2,633 | 79 | 33 | 20 | 53 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 111,260 | 65,281 | 11,209 | 5,311 | 64 | 41 | 193,166 | 46 | 0 | 46 | 146,006 | 6,896 | 5,005 | 2,902 | 7,907 | 2,113 | 4,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

様式-3 被害額 (事業実施後：R17時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/100 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|----|--------|----|---------|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|----|----|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | 清掃労働対価 | | | 代替活動等 | 小計 | | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,736 | 30,410 | 5,046 | 2,113 | 30 | 21 | 93,356 | 12 | 0 | 12 | 69,877 | 2,675 | 1,912 | 1,209 | 3,121 | 875 | 1,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 1,702 | 318 | 70 | 35 | 0 | 0 | 2,125 | 16 | 0 | 16 | 2,601 | 91 | 66 | 37 | 103 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 70,022 | 44,330 | 8,556 | 4,189 | 41 | 22 | 127,160 | 8 | 0 | 8 | 94,758 | 5,642 | 3,924 | 2,115 | 6,039 | 1,694 | 2,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,837 | 494 | 207 | 147 | 5 | 3 | 2,693 | 18 | 0 | 18 | 3,042 | 86 | 35 | 23 | 58 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 129,297 | 75,552 | 13,879 | 6,484 | 76 | 46 | 225,334 | 55 | 0 | 55 | 170,343 | 8,494 | 5,937 | 3,384 | 9,321 | 2,607 | 4,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

様式-3 (被害額：全体事業)：R20時点⑫ 炭所箇所：河岸掘削 (18.0k~18.8k)

様式-3 被害額 (事業実施後：R20時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/10 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|------|-------|----|-------|----|----|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|----|---------------|--------------------|----------|----|----|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

様式-3 被害額 (事業実施後：R20時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/20 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|------|-------|----|-------|----|-----|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|----|---------------|--------------------|----------|----|-----|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 296 | |
| 合計 | 83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 296 | |

様式-3 被害額 (事業実施後：R20時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/30 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|------|-------|----|-------|----|-------|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|----|---------------|--------------------|----------|-----|-------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,141 | 241 | 125 | 79 | 3 | 2 | 1,591 | 15 | 0 | 15 | 2,040 | 66 | 29 | 17 | 46 | 12 | 15 | 0 | 139 | 3,785 | |
| 合計 | 1,141 | 241 | 125 | 79 | 3 | 2 | 1,591 | 15 | 0 | 15 | 2,048 | 66 | 29 | 17 | 46 | 12 | 15 | 0 | 139 | 3,793 | |

様式-3 被害額 (事業実施後：R20時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/50 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|----|---------|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|--------|---------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 38,904 | 22,040 | 3,612 | 1,527 | 19 | 14 | 66,116 | 1 | 0 | 1 | 49,103 | 1,984 | 1,416 | 915 | 2,331 | 616 | 1,373 | 0 | 6,304 | 121,524 | |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 36,045 | 24,387 | 3,454 | 1,699 | 20 | 12 | 65,617 | 2 | 0 | 2 | 48,761 | 2,159 | 1,933 | 1,099 | 3,032 | 696 | 1,519 | 0 | 7,406 | 121,786 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,378 | 310 | 148 | 98 | 3 | 2 | 1,939 | 16 | 0 | 16 | 2,357 | 73 | 32 | 19 | 51 | 13 | 19 | 0 | 156 | 4,468 | |
| 合計 | 76,327 | 46,737 | 7,214 | 3,324 | 42 | 28 | 133,672 | 19 | 0 | 19 | 100,250 | 4,216 | 3,381 | 2,033 | 5,414 | 1,325 | 2,911 | 0 | 13,866 | 247,807 | |

様式-3 被害額 (事業実施後：R20時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/70 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|--------|---------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 48,335 | 26,061 | 4,093 | 1,746 | 26 | 19 | 80,280 | 11 | 0 | 11 | 60,140 | 2,247 | 1,646 | 1,061 | 2,707 | 725 | 1,624 | 0 | 7,303 | 147,734 | |
| L2 | 1,069 | 150 | 40 | 18 | 0 | 0 | 1,277 | 13 | 0 | 13 | 1,787 | 50 | 44 | 24 | 68 | 14 | 9 | 0 | 141 | 3,218 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 60,344 | 38,705 | 6,892 | 3,418 | 34 | 19 | 109,412 | 5 | 0 | 5 | 81,434 | 4,520 | 3,282 | 1,797 | 5,079 | 1,360 | 2,411 | 0 | 13,370 | 204,221 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,512 | 365 | 184 | 129 | 4 | 3 | 2,197 | 17 | 0 | 17 | 2,633 | 79 | 33 | 20 | 53 | 14 | 23 | 0 | 169 | 5,016 | |
| 合計 | 111,260 | 65,281 | 11,209 | 5,311 | 64 | 41 | 193,166 | 46 | 0 | 46 | 145,994 | 6,896 | 5,005 | 2,902 | 7,907 | 2,113 | 4,067 | 0 | 20,983 | 360,189 | |

様式-3 被害額 (事業実施後：R20時点) 水系名：土器川水系 河川名：土器川 流量規模：1/100 (単位：百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|--------|-----|----|------------|--------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------|----------|--------|---------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労働対価 | 代替活動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,736 | 30,410 | 5,046 | 2,113 | 30 | 21 | 93,356 | 12 | 0 | 12 | 69,877 | 2,675 | 1,912 | 1,209 | 3,121 | 875 | 1,895 | 0 | 8,566 | 171,811 | |
| L2 | 1,702 | 318 | 70 | 35 | 0 | 0 | 2,125 | 16 | 0 | 16 | 2,601 | 91 | 66 | 37 | 103 | 23 | 20 | 0 | 237 | 4,979 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 70,022 | 44,330 | 8,556 | 4,189 | 41 | 22 | 127,160 | 8 | 0 | 8 | 94,758 | 5,642 | 3,924 | 2,115 | 6,039 | 1,694 | 2,762 | 0 | 16,137 | 238,063 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| R3 | 1,837 | 494 | 207 | 147 | 5 | 3 | 2,693 | 18 | 0 | 18 | 3,042 | 86 | 35 | 23 | 58 | 15 | 31 | 0 | 190 | 5,943 | |
| 合計 | 129,297 | 75,552 | 13,879 | 6,484 | 76 | 46 | 225,334 | 55 | 0 | 55 | 170,327 | 8,494 | 5,937 | 3,384 | 9,321 | 2,607 | 4,708 | 0 | 25,130 | 420,846 | |

様式-3 (被害額：全体事業)：R22時点⑬ 整備計画完成 (長尾箇所：河床安定化対策)

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R22時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/10 | | (単位：百万円) | | | |
|------------|----|-------------------|---------|----|-------|----|----|--------|-----|----|--------------------|------------|------------------|-----------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R22時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/20 | | (単位：百万円) | | | |
|------------|----|-------------------|---------|----|-------|----|----|--------|-----|----|--------------------|------------|------------------|-----------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R22時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/30 | | (単位：百万円) | | | |
|------------|-------|-------------------|---------|----|-------|----|-------|--------|-----|----|--------------------|------------|------------------|-----------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------|-----|-------|----|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,030 | 201 | 123 | 78 | 2 | 2 | 1,436 | 13 | 0 | 13 | 1,835 | 64 | 26 | 15 | 41 | 11 | 13 | 0 | 129 | 3,413 | |
| 合計 | 1,030 | 201 | 123 | 78 | 2 | 2 | 1,436 | 13 | 0 | 13 | 1,843 | 64 | 26 | 15 | 41 | 11 | 13 | 0 | 129 | 3,421 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R22時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/50 | | (単位：百万円) | | | |
|------------|--------|-------------------|---------|-------|-------|----|---------|--------|-----|----|--------------------|------------|------------------|-----------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 32,617 | 18,663 | 2,721 | 1,219 | 16 | 12 | 55,248 | 0 | 0 | 0 | 41,023 | 1,635 | 1,184 | 767 | 1,951 | 518 | 1,163 | 0 | 5,267 | 101,538 | |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 37,235 | 25,151 | 3,623 | 1,781 | 20 | 13 | 67,823 | 2 | 2 | 2 | 50,398 | 2,246 | 1,990 | 1,131 | 3,121 | 729 | 1,567 | 0 | 7,663 | 125,886 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,273 | 275 | 162 | 110 | 3 | 2 | 1,825 | 14 | 0 | 14 | 2,186 | 74 | 28 | 17 | 45 | 12 | 17 | 0 | 148 | 4,173 | |
| 合計 | 71,125 | 44,089 | 6,506 | 3,110 | 39 | 27 | 124,896 | 16 | 0 | 16 | 93,636 | 3,955 | 3,202 | 1,915 | 5,117 | 1,259 | 2,747 | 0 | 13,078 | 231,626 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R22時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/70 | | (単位：百万円) | | | |
|------------|---------|-------------------|---------|-------|-------|----|---------|--------|-----|----|--------------------|------------|------------------|-----------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 43,238 | 23,395 | 3,342 | 1,493 | 24 | 17 | 71,509 | 11 | 0 | 11 | 53,620 | 1,958 | 1,452 | 940 | 2,392 | 639 | 1,457 | 0 | 6,446 | 131,586 | |
| L2 | 43 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 2 | 135 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 193 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 60,344 | 38,705 | 6,892 | 3,418 | 34 | 19 | 109,412 | 5 | 0 | 5 | 81,434 | 4,520 | 3,282 | 1,797 | 5,079 | 1,360 | 2,411 | 0 | 13,370 | 204,221 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,446 | 339 | 183 | 128 | 3 | 3 | 2,102 | 16 | 0 | 16 | 2,497 | 79 | 31 | 19 | 50 | 13 | 21 | 0 | 163 | 4,778 | |
| 合計 | 105,071 | 62,444 | 10,418 | 5,040 | 61 | 39 | 183,073 | 34 | 0 | 34 | 137,686 | 6,558 | 4,768 | 2,757 | 7,525 | 2,013 | 3,889 | 0 | 19,985 | 340,778 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R22時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/100 | | (単位：百万円) | | | |
|------------|---------|-------------------|---------|-------|-------|----|---------|--------|-----|----|--------------------|------------|------------------|-----------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 51,941 | 28,213 | 4,466 | 1,900 | 28 | 20 | 86,568 | 12 | 0 | 12 | 64,827 | 2,403 | 1,762 | 1,125 | 2,887 | 801 | 1,758 | 0 | 7,849 | 159,256 | |
| L2 | 99 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 117 | 6 | 0 | 6 | 488 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 | 627 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 70,022 | 44,330 | 8,556 | 4,189 | 41 | 22 | 127,160 | 8 | 0 | 8 | 94,758 | 5,642 | 3,924 | 2,115 | 6,039 | 1,694 | 2,762 | 0 | 16,137 | 238,063 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| R3 | 1,674 | 420 | 204 | 145 | 4 | 3 | 2,450 | 17 | 0 | 17 | 2,796 | 85 | 33 | 21 | 54 | 14 | 26 | 0 | 179 | 5,442 | |
| 合計 | 123,736 | 72,972 | 13,232 | 6,237 | 73 | 45 | 216,295 | 44 | 0 | 44 | 162,918 | 8,136 | 5,724 | 3,264 | 8,998 | 2,510 | 4,547 | 0 | 24,181 | 403,438 | |

様式-3 (被害額：残事業)：R2時点⑦ 飯野箇所：河道掘削 (0.8k~1.4k)

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R2時点) | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/10 | | | | (単位：百万円) | | | |
|------------|----|------------------|---------|----|-------|----|----|--------|-----|-----------|--------------------|------------|------------------|-----------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|-----|----|
| 汎濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 159 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 159 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R2時点) | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/20 | | | | (単位：百万円) | | | |
|------------|--------|------------------|---------|-------|-------|----|---------|--------|-----|-----------|--------------------|------------|------------------|-----------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 汎濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 10,842 | 5,014 | 688 | 310 | 2 | 2 | 16,858 | 0 | 0 | 0 | 12,509 | 519 | 407 | 253 | 660 | 119 | 312 | 0 | 1,610 | 30,977 | |
| L2 | 667 | 58 | 21 | 13 | 0 | 0 | 759 | 11 | 0 | 11 | 1,271 | 31 | 33 | 17 | 50 | 8 | 4 | 0 | 93 | 2,134 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 47,561 | 31,627 | 6,331 | 3,088 | 27 | 16 | 88,650 | 3 | 0 | 3 | 65,926 | 2,931 | 1,838 | 1,047 | 2,885 | 975 | 1,970 | 0 | 8,761 | 163,340 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 142 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 266 | |
| 合計 | 59,153 | 36,726 | 7,042 | 3,412 | 29 | 18 | 106,380 | 15 | 0 | 15 | 79,848 | 3,483 | 2,281 | 1,319 | 3,600 | 1,103 | 2,288 | 0 | 10,474 | 196,717 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R2時点) | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/30 | | | | (単位：百万円) | | | |
|------------|--------|------------------|---------|-------|-------|----|---------|--------|-----|-----------|--------------------|------------|------------------|-----------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 汎濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 20,678 | 11,268 | 1,806 | 774 | 7 | 6 | 34,539 | 0 | 0 | 0 | 25,628 | 1,047 | 670 | 446 | 1,116 | 290 | 702 | 0 | 3,155 | 63,322 | |
| L2 | 1,735 | 288 | 68 | 41 | 0 | 0 | 2,132 | 18 | 0 | 18 | 2,725 | 92 | 70 | 38 | 108 | 22 | 18 | 0 | 240 | 5,115 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 59,069 | 38,050 | 9,164 | 4,443 | 34 | 19 | 110,779 | 5 | 0 | 5 | 82,439 | 4,453 | 2,343 | 1,294 | 3,637 | 1,338 | 2,370 | 0 | 11,798 | 205,021 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,174 | 242 | 136 | 89 | 3 | 2 | 1,646 | 14 | 0 | 14 | 2,072 | 70 | 30 | 17 | 47 | 12 | 15 | 0 | 144 | 3,876 | |
| 合計 | 82,656 | 49,848 | 11,174 | 5,347 | 44 | 27 | 149,096 | 37 | 0 | 37 | 112,864 | 5,662 | 3,113 | 1,795 | 4,908 | 1,662 | 3,105 | 0 | 15,337 | 277,334 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R2時点) | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/50 | | | | (単位：百万円) | | | |
|------------|---------|------------------|---------|-------|-------|----|---------|--------|-----|-----------|--------------------|------------|------------------|-----------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 汎濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 39,620 | 22,554 | 4,521 | 1,894 | 19 | 14 | 68,622 | 1 | 0 | 1 | 50,963 | 2,010 | 1,223 | 789 | 2,012 | 632 | 1,405 | 0 | 6,059 | 125,645 | |
| L2 | 3,740 | 659 | 167 | 95 | 1 | 1 | 4,663 | 33 | 0 | 33 | 5,557 | 190 | 167 | 90 | 257 | 51 | 41 | 0 | 539 | 10,792 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 71,019 | 44,761 | 11,850 | 5,675 | 42 | 23 | 133,370 | 9 | 0 | 9 | 99,422 | 5,845 | 2,927 | 1,575 | 4,502 | 1,739 | 2,789 | 0 | 14,875 | 247,676 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,407 | 315 | 166 | 112 | 3 | 3 | 2,006 | 15 | 0 | 15 | 2,386 | 77 | 32 | 19 | 51 | 14 | 20 | 0 | 162 | 4,569 | |
| 合計 | 115,786 | 68,289 | 16,704 | 7,776 | 65 | 41 | 208,661 | 58 | 0 | 58 | 158,328 | 8,122 | 4,349 | 2,473 | 6,822 | 2,436 | 4,255 | 0 | 21,635 | 388,682 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R2時点) | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/70 | | | | (単位：百万円) | | | |
|------------|---------|------------------|---------|-------|-------|----|---------|--------|-----|-----------|--------------------|------------|------------------|-----------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 汎濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 46,699 | 26,782 | 5,772 | 2,381 | 23 | 16 | 81,673 | 1 | 0 | 1 | 60,663 | 2,483 | 1,453 | 918 | 2,371 | 781 | 1,669 | 0 | 7,304 | 149,641 | |
| L2 | 5,029 | 1,034 | 217 | 124 | 3 | 2 | 6,409 | 43 | 0 | 43 | 7,471 | 238 | 221 | 121 | 342 | 67 | 64 | 0 | 711 | 14,634 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 79,346 | 49,671 | 13,762 | 6,582 | 48 | 25 | 149,434 | 14 | 0 | 14 | 111,555 | 6,745 | 3,313 | 1,761 | 5,074 | 2,042 | 3,095 | 0 | 16,956 | 277,959 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,601 | 393 | 196 | 138 | 4 | 3 | 2,335 | 17 | 0 | 17 | 2,711 | 83 | 32 | 20 | 52 | 14 | 25 | 0 | 174 | 5,237 | |
| 合計 | 132,675 | 77,880 | 19,947 | 9,225 | 78 | 46 | 239,851 | 75 | 0 | 75 | 182,400 | 9,549 | 5,019 | 2,820 | 7,839 | 2,904 | 4,853 | 0 | 25,145 | 447,471 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R2時点) | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/100 | | | | (単位：百万円) | | | |
|------------|---------|------------------|---------|--------|-------|----|---------|--------|-----|-----------|--------------------|------------|------------------|------------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 汎濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,461 | 30,295 | 6,217 | 2,562 | 30 | 21 | 94,586 | 9 | 0 | 9 | 70,657 | 2,712 | 1,652 | 1,040 | 2,692 | 881 | 1,887 | 0 | 8,172 | 173,424 | |
| L2 | 6,360 | 1,341 | 282 | 163 | 4 | 3 | 8,153 | 53 | 0 | 53 | 9,362 | 278 | 258 | 143 | 401 | 78 | 84 | 0 | 841 | 18,409 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 86,588 | 54,215 | 15,496 | 7,415 | 52 | 27 | 163,793 | 19 | 0 | 19 | 122,402 | 7,507 | 3,658 | 1,933 | 5,591 | 2,290 | 3,378 | 0 | 18,766 | 304,980 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,773 | 458 | 207 | 147 | 4 | 3 | 2,592 | 18 | 0 | 18 | 2,932 | 86 | 34 | 22 | 56 | 15 | 29 | 0 | 186 | 5,728 | |
| 合計 | 150,182 | 86,309 | 22,202 | 10,287 | 90 | 54 | 269,124 | 100 | 0 | 100 | 205,406 | 10,583 | 5,602 | 3,138 | 8,740 | 3,264 | 5,378 | 0 | 27,965 | 502,955 | |

様式-3 (被害額: 残事業): R14-1 時点⑧ 飯野箇所: 引堤 (右岸 1.4k~2.0k)

様式-3 被害額 (事業実施後: R14-1時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/10 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|------------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|----|-----|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| L2 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 159 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 159 | |

様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点1) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/20 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|-------|-------|-----|-------|----|--------|----|-----|------------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|-------|--------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 10,842 | 5,014 | 688 | 310 | 2 | 2 | 16,858 | 0 | 0 | 0 | 12,509 | 519 | 407 | 253 | 660 | 119 | 312 | 0 | 1,610 | 30,977 | |
| L2 | 667 | 58 | 21 | 13 | 0 | 0 | 759 | 11 | 0 | 11 | 1,271 | 31 | 33 | 17 | 50 | 8 | 4 | 0 | 93 | 2,134 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 142 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 266 | |
| 合計 | 11,592 | 5,099 | 711 | 324 | 2 | 2 | 17,730 | 12 | 0 | 12 | 13,922 | 552 | 443 | 272 | 715 | 128 | 318 | 0 | 1,713 | 33,377 | |

様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点1) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/30 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|-------|-----|-------|----|--------|----|-----|------------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|-------|--------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 20,678 | 11,268 | 1,806 | 774 | 7 | 6 | 34,539 | 0 | 0 | 0 | 25,628 | 1,047 | 670 | 446 | 1,116 | 290 | 702 | 0 | 3,155 | 63,322 | |
| L2 | 1,735 | 288 | 68 | 41 | 0 | 0 | 2,132 | 18 | 0 | 18 | 2,725 | 92 | 70 | 38 | 108 | 22 | 18 | 0 | 240 | 5,115 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,174 | 242 | 136 | 89 | 3 | 2 | 1,646 | 14 | 0 | 14 | 2,072 | 70 | 30 | 17 | 47 | 12 | 15 | 0 | 144 | 3,876 | |
| 合計 | 23,587 | 11,798 | 2,010 | 904 | 10 | 8 | 38,317 | 32 | 0 | 32 | 30,425 | 1,209 | 770 | 501 | 1,271 | 324 | 735 | 0 | 3,539 | 72,313 | |

様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点1) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/50 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|----|-----|------------|---------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 39,620 | 22,554 | 4,521 | 1,894 | 19 | 14 | 68,622 | 1 | 0 | 1 | 50,963 | 2,010 | 1,223 | 789 | 2,012 | 632 | 1,405 | 0 | 6,059 | 125,645 | |
| L2 | 3,740 | 659 | 167 | 95 | 1 | 1 | 4,663 | 33 | 0 | 33 | 5,557 | 190 | 167 | 90 | 257 | 51 | 41 | 0 | 539 | 10,792 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 71,019 | 44,761 | 11,850 | 5,675 | 42 | 23 | 133,370 | 9 | 0 | 9 | 99,422 | 5,845 | 2,927 | 1,575 | 4,502 | 1,739 | 2,789 | 0 | 14,875 | 247,676 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,407 | 315 | 166 | 112 | 3 | 3 | 2,006 | 15 | 0 | 15 | 2,386 | 77 | 32 | 19 | 51 | 14 | 20 | 0 | 162 | 4,569 | |
| 合計 | 115,786 | 68,289 | 16,704 | 7,776 | 65 | 41 | 208,661 | 58 | 0 | 58 | 158,328 | 8,122 | 4,349 | 2,473 | 6,822 | 2,436 | 4,255 | 0 | 21,635 | 388,682 | |

様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点1) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/70 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|----|-----|------------|---------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 46,699 | 26,782 | 5,772 | 2,381 | 23 | 16 | 81,673 | 1 | 0 | 1 | 60,663 | 2,483 | 1,453 | 918 | 2,371 | 781 | 1,669 | 0 | 7,304 | 149,641 | |
| L2 | 5,029 | 1,034 | 217 | 124 | 3 | 2 | 6,409 | 43 | 0 | 43 | 7,471 | 238 | 221 | 121 | 342 | 67 | 64 | 0 | 711 | 14,634 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 79,346 | 49,671 | 13,762 | 6,582 | 48 | 25 | 149,434 | 14 | 0 | 14 | 111,555 | 6,745 | 3,313 | 1,761 | 5,074 | 2,042 | 3,095 | 0 | 16,956 | 277,959 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,601 | 393 | 196 | 138 | 4 | 3 | 2,335 | 17 | 0 | 17 | 2,711 | 83 | 32 | 20 | 52 | 14 | 25 | 0 | 174 | 5,237 | |
| 合計 | 132,675 | 77,880 | 19,947 | 9,225 | 78 | 46 | 239,851 | 75 | 0 | 75 | 182,400 | 9,549 | 5,019 | 2,820 | 7,839 | 2,904 | 4,853 | 0 | 25,145 | 447,471 | |

様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点1) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/100 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-----|------------|---------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,461 | 30,295 | 6,217 | 2,562 | 30 | 21 | 94,586 | 9 | 0 | 9 | 70,657 | 2,712 | 1,652 | 1,040 | 2,692 | 881 | 1,887 | 0 | 8,172 | 173,424 | |
| L2 | 6,360 | 1,341 | 282 | 163 | 4 | 3 | 8,153 | 53 | 0 | 53 | 9,362 | 278 | 258 | 143 | 401 | 78 | 84 | 0 | 841 | 18,409 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 86,588 | 54,215 | 15,496 | 7,415 | 52 | 27 | 163,793 | 19 | 0 | 19 | 122,402 | 7,507 | 3,658 | 1,933 | 5,591 | 2,290 | 3,378 | 0 | 18,766 | 304,980 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| R3 | 1,773 | 456 | 207 | 147 | 4 | 3 | 2,592 | 18 | 0 | 18 | 2,932 | 86 | 34 | 22 | 56 | 15 | 29 | 0 | 186 | 5,728 | |
| 合計 | 150,182 | 86,309 | 22,202 | 10,287 | 90 | 54 | 269,124 | 100 | 0 | 100 | 205,406 | 10,583 | 5,602 | 3,138 | 8,740 | 3,264 | 5,378 | 0 | 27,965 | 502,595 | |

様式-3 (被害額: 残事業): R14-2 時点⑨ 土器箇所: 堤防拡幅 (左岸 2.4k)

様式-3 被害額 (事業実施後: R14-2時点) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/10 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|------------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|----|-----|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| L2 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 159 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 159 | |

様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点2) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/20 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|------|-------|----|-------|----|--------|----|-----|------------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|-----|-------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 667 | 58 | 21 | 13 | 0 | 0 | 759 | 11 | 0 | 11 | 1,271 | 31 | 33 | 17 | 50 | 8 | 4 | 0 | 93 | 2,134 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 142 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 266 | |
| 合計 | 750 | 85 | 23 | 14 | 0 | 0 | 872 | 12 | 0 | 12 | 1,413 | 33 | 36 | 19 | 55 | 9 | 6 | 0 | 103 | 2,400 | |

様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点2) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/30 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|------|-------|-----|-------|----|--------|----|-----|------------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|-----|-------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 1,735 | 288 | 68 | 41 | 0 | 0 | 2,132 | 18 | 0 | 18 | 2,725 | 92 | 70 | 38 | 108 | 22 | 18 | 0 | 240 | 5,115 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,174 | 242 | 136 | 89 | 3 | 2 | 1,646 | 14 | 0 | 14 | 2,072 | 70 | 30 | 17 | 47 | 12 | 15 | 0 | 144 | 3,876 | |
| 合計 | 2,909 | 530 | 204 | 130 | 3 | 2 | 3,778 | 32 | 0 | 32 | 4,797 | 162 | 100 | 55 | 155 | 34 | 33 | 0 | 384 | 8,991 | |

様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点2) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/50 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|----|-----|------------|---------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 39,620 | 22,554 | 4,521 | 1,894 | 19 | 14 | 68,622 | 1 | 0 | 1 | 50,963 | 2,010 | 1,223 | 789 | 2,012 | 632 | 1,405 | 0 | 6,059 | 125,645 | |
| L2 | 3,740 | 659 | 167 | 95 | 1 | 1 | 4,663 | 33 | 0 | 33 | 5,557 | 190 | 167 | 90 | 257 | 51 | 41 | 0 | 539 | 10,792 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 71,019 | 44,761 | 11,850 | 5,675 | 42 | 23 | 133,370 | 9 | 0 | 9 | 99,422 | 5,845 | 2,927 | 1,575 | 4,502 | 1,739 | 2,789 | 0 | 14,875 | 247,676 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,407 | 315 | 166 | 112 | 3 | 3 | 2,006 | 15 | 0 | 15 | 2,386 | 77 | 32 | 19 | 51 | 14 | 20 | 0 | 162 | 4,569 | |
| 合計 | 115,786 | 68,289 | 16,704 | 7,776 | 65 | 41 | 208,661 | 58 | 0 | 58 | 158,328 | 8,122 | 4,349 | 2,473 | 6,822 | 2,436 | 4,255 | 0 | 21,635 | 388,682 | |

様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点2) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/70 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|----|-----|------------|---------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 46,699 | 26,782 | 5,772 | 2,381 | 23 | 16 | 81,673 | 1 | 0 | 1 | 60,663 | 2,483 | 1,453 | 918 | 2,371 | 781 | 1,669 | 0 | 7,304 | 149,641 | |
| L2 | 5,029 | 1,034 | 217 | 124 | 3 | 2 | 6,409 | 43 | 0 | 43 | 7,471 | 238 | 221 | 121 | 342 | 67 | 64 | 0 | 711 | 14,634 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 79,346 | 49,671 | 13,762 | 6,582 | 48 | 25 | 149,434 | 14 | 0 | 14 | 111,555 | 6,745 | 3,313 | 1,761 | 5,074 | 2,042 | 3,095 | 0 | 16,956 | 277,959 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,601 | 393 | 196 | 138 | 4 | 3 | 2,335 | 17 | 0 | 17 | 2,711 | 83 | 32 | 20 | 52 | 14 | 25 | 0 | 174 | 5,237 | |
| 合計 | 132,675 | 77,880 | 19,947 | 9,225 | 78 | 46 | 239,851 | 75 | 0 | 75 | 182,400 | 9,549 | 5,019 | 2,820 | 7,839 | 2,904 | 4,853 | 0 | 25,145 | 447,471 | |

様式-3 被害額 (事業実施後: R14時点2) 水系名: 土器川水系 河川名: 土器川 流量規模: 1/100 (単位: 百万円)

| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
|--------|---------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-----|------------|---------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|--------|---------|----|
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,461 | 30,295 | 6,217 | 2,562 | 30 | 21 | 94,586 | 9 | 0 | 9 | 70,657 | 2,712 | 1,652 | 1,040 | 2,692 | 881 | 1,887 | 0 | 8,172 | 173,424 | |
| L2 | 6,360 | 1,341 | 282 | 163 | 4 | 3 | 8,153 | 53 | 0 | 53 | 9,362 | 278 | 258 | 143 | 401 | 78 | 84 | 0 | 841 | 18,409 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 86,588 | 54,215 | 15,496 | 7,415 | 52 | 27 | 163,793 | 19 | 0 | 19 | 122,402 | 7,507 | 3,658 | 1,933 | 5,591 | 2,290 | 3,378 | 0 | 18,766 | 304,980 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| R3 | 1,773 | 458 | 207 | 147 | 4 | 3 | 2,592 | 18 | 0 | 18 | 2,932 | 86 | 34 | 22 | 56 | 15 | 29 | 0 | 186 | 5,728 | |
| 合計 | 150,182 | 86,309 | 22,202 | 10,287 | 90 | 54 | 269,124 | 100 | 0 | 100 | 205,406 | 10,583 | 5,602 | 3,138 | 8,740 | 3,264 | 5,378 | 0 | 27,965 | 502,595 | |

様式-3 (被害額：残事業)：R15時点⑩ 飯野箇所：堤防拡幅 (右岸 3.2k~3.4k)

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R15時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/10 | | (単位：百万円) | | | |
|------------|----|-------------------|---------|----|-------|----|--------|----|-----|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|----|-----|----|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稻 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 159 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 159 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R15時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/20 | | (単位：百万円) | | | |
|------------|-----|-------------------|---------|----|-------|----|--------|----|-----|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----|-------|----|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稻 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 667 | 58 | 21 | 13 | 0 | 0 | 759 | 11 | 0 | 11 | 1,271 | 31 | 33 | 17 | 50 | 8 | 4 | 0 | 93 | 2,134 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 142 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 266 | |
| 合計 | 750 | 85 | 23 | 14 | 0 | 0 | 872 | 12 | 0 | 12 | 1,413 | 33 | 36 | 19 | 55 | 9 | 6 | 0 | 103 | 2,400 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R15時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/30 | | (単位：百万円) | | | |
|------------|-------|-------------------|---------|-----|-------|----|--------|----|-----|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----|-------|----|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稻 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 1,735 | 288 | 68 | 41 | 0 | 0 | 2,132 | 18 | 0 | 18 | 2,725 | 92 | 70 | 38 | 108 | 22 | 18 | 0 | 240 | 5,115 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,174 | 242 | 136 | 89 | 3 | 2 | 1,646 | 14 | 0 | 14 | 2,072 | 70 | 30 | 17 | 47 | 12 | 15 | 0 | 144 | 3,876 | |
| 合計 | 2,909 | 530 | 204 | 130 | 3 | 2 | 3,778 | 32 | 0 | 32 | 4,797 | 162 | 100 | 55 | 155 | 34 | 33 | 0 | 384 | 8,991 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R15時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/50 | | (単位：百万円) | | | |
|------------|---------|-------------------|---------|-------|-------|----|---------|----|-----|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|--------|---------|----|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稻 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 39,620 | 22,554 | 4,521 | 1,894 | 19 | 14 | 68,622 | 1 | 0 | 1 | 50,963 | 2,010 | 1,223 | 789 | 2,012 | 632 | 1,405 | 0 | 6,059 | 125,645 | |
| L2 | 3,740 | 659 | 167 | 95 | 1 | 1 | 4,663 | 33 | 0 | 33 | 5,557 | 190 | 167 | 90 | 257 | 51 | 41 | 0 | 539 | 10,792 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 63,536 | 40,740 | 10,200 | 4,909 | 37 | 20 | 119,442 | 6 | 0 | 6 | 88,916 | 4,960 | 2,541 | 1,389 | 3,930 | 1,480 | 2,538 | 0 | 12,908 | 221,272 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,407 | 315 | 166 | 112 | 3 | 3 | 2,006 | 15 | 0 | 15 | 2,386 | 77 | 32 | 19 | 51 | 14 | 20 | 0 | 162 | 4,569 | |
| 合計 | 108,303 | 64,268 | 15,054 | 7,010 | 60 | 38 | 194,733 | 55 | 0 | 55 | 147,822 | 7,237 | 3,963 | 2,287 | 6,250 | 2,177 | 4,004 | 0 | 19,668 | 362,278 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R15時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/70 | | (単位：百万円) | | | |
|------------|---------|-------------------|---------|-------|-------|----|---------|----|-----|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|--------|---------|----|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稻 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 46,699 | 26,782 | 5,772 | 2,381 | 23 | 16 | 81,673 | 1 | 0 | 1 | 60,663 | 2,483 | 1,453 | 918 | 2,371 | 781 | 1,669 | 0 | 7,304 | 149,641 | |
| L2 | 5,029 | 1,034 | 217 | 124 | 3 | 2 | 6,409 | 43 | 0 | 43 | 7,471 | 238 | 221 | 121 | 342 | 67 | 64 | 0 | 711 | 14,634 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 72,492 | 45,608 | 12,143 | 5,815 | 42 | 23 | 136,123 | 10 | 0 | 10 | 101,499 | 5,975 | 2,987 | 1,605 | 4,592 | 1,782 | 2,841 | 0 | 15,190 | 252,822 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,601 | 393 | 196 | 138 | 4 | 3 | 2,335 | 17 | 0 | 17 | 2,711 | 83 | 32 | 20 | 52 | 14 | 25 | 0 | 174 | 5,237 | |
| 合計 | 125,821 | 73,817 | 18,328 | 8,458 | 72 | 44 | 226,540 | 71 | 0 | 71 | 172,344 | 8,779 | 4,693 | 2,664 | 7,357 | 2,644 | 4,599 | 0 | 23,379 | 422,334 | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R15時点) | | | | | | | | | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/100 | | (単位：百万円) | | | |
|------------|---------|-------------------|---------|-------|-------|----|---------|----|-----|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|--------|---------|----|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所 における 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 水稻 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,461 | 30,295 | 6,217 | 2,562 | 30 | 21 | 94,586 | 9 | 0 | 9 | 70,657 | 2,712 | 1,652 | 1,040 | 2,692 | 881 | 1,887 | 0 | 8,172 | 173,424 | |
| L2 | 6,360 | 1,341 | 282 | 163 | 4 | 3 | 8,153 | 53 | 0 | 53 | 9,362 | 278 | 258 | 143 | 401 | 78 | 84 | 0 | 841 | 18,409 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 79,853 | 49,932 | 13,837 | 6,624 | 48 | 26 | 150,320 | 15 | 0 | 15 | 112,237 | 6,773 | 3,325 | 1,769 | 5,094 | 2,049 | 3,111 | 0 | 17,027 | 279,599 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| R3 | 1,773 | 458 | 207 | 147 | 4 | 3 | 2,592 | 18 | 0 | 18 | 2,932 | 86 | 34 | 22 | 56 | 15 | 29 | 0 | 186 | 5,728 | |
| 合計 | 143,447 | 82,026 | 20,543 | 9,496 | 86 | 53 | 255,651 | 96 | 0 | 96 | 195,241 | 9,849 | 5,269 | 2,974 | 8,243 | 3,023 | 5,111 | 0 | 26,226 | 477,214 | |

様式-3 (被害額：残事業)：R17時点① 長尾箇所：堤防整備 (右岸 16.5k~16.9k)

| 様式-3 被害額 (事業実施後：R17時点) | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/10 | | (単位：百万円) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|-------|---------|--------|-----------|----|------------|--------|--------------|-----|----|---------------|--------------------|----------|----|----|----|--------|-------|----|
| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労働対面 | 代替活動等 | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |

| 様式-3 被害額 (事業実施後：R17時点) | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/20 | | (単位：百万円) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|-------|---------|--------|-----------|-----|------------|--------|--------------|-----|----|---------------|--------------------|----------|----|----|----|--------|-------|----|
| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労働対面 | 代替活動等 | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| L2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 106 | | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 142 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 266 | |
| 合計 | 104 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 136 | 2 | 0 | 2 | 221 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 | 372 | |

| 様式-3 被害額 (事業実施後：R17時点) | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/30 | | (単位：百万円) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|-------|---------|--------|-----------|-------|------------|--------|--------------|-------|----|---------------|--------------------|----------|----|----|----|--------|-------|----|
| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労働対面 | 代替活動等 | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| L2 | 110 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 134 | 2 | 0 | 2 | 210 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 362 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,174 | 242 | 136 | 89 | 3 | 2 | 1,646 | 14 | 0 | 14 | 2,072 | 70 | 30 | 17 | 47 | 12 | 15 | 0 | 144 | 3,876 | |
| 合計 | 1,284 | 260 | 141 | 90 | 3 | 2 | 1,780 | 16 | 0 | 16 | 2,282 | 77 | 34 | 19 | 53 | 14 | 16 | 0 | 160 | 4,238 | |

| 様式-3 被害額 (事業実施後：R17時点) | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/50 | | (単位：百万円) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|--------|--------------|---------|-------|---------------|--------------------|----------|-------|-------|----|--------|---------|----|
| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労働対面 | 代替活動等 | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 39,620 | 22,554 | 4,521 | 1,894 | 19 | 14 | 68,622 | 1 | 0 | 1 | 50,963 | 2,010 | 1,223 | 789 | 2,012 | 632 | 1,405 | 0 | 6,059 | 125,645 | |
| L2 | 227 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 272 | 2 | 0 | 2 | 345 | 15 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 34 | 653 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 63,536 | 40,740 | 10,200 | 4,909 | 37 | 20 | 119,442 | 6 | 0 | 6 | 88,916 | 4,960 | 2,541 | 1,389 | 3,930 | 1,480 | 2,538 | 0 | 12,908 | 221,272 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,407 | 315 | 166 | 112 | 3 | 3 | 2,006 | 15 | 0 | 15 | 2,386 | 77 | 32 | 19 | 51 | 14 | 20 | 0 | 162 | 4,569 | |
| 合計 | 104,790 | 63,642 | 14,897 | 6,917 | 59 | 37 | 190,342 | 24 | 0 | 24 | 142,610 | 7,062 | 3,804 | 2,202 | 6,006 | 2,130 | 3,965 | 0 | 19,163 | 352,139 | |

| 様式-3 被害額 (事業実施後：R17時点) | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/70 | | (単位：百万円) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|--------|--------------|---------|-------|---------------|--------------------|----------|-------|-------|----|--------|---------|----|
| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労働対面 | 代替活動等 | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 46,699 | 26,782 | 5,772 | 2,381 | 23 | 16 | 81,673 | 1 | 0 | 1 | 60,663 | 2,483 | 1,453 | 918 | 2,371 | 781 | 1,669 | 0 | 7,304 | 149,641 | |
| L2 | 416 | 64 | 16 | 6 | 0 | 0 | 502 | 4 | 0 | 4 | 615 | 21 | 18 | 10 | 28 | 7 | 4 | 0 | 60 | 1,181 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 72,492 | 45,608 | 12,143 | 5,815 | 42 | 23 | 136,123 | 10 | 0 | 10 | 101,499 | 5,975 | 2,987 | 1,605 | 4,592 | 1,782 | 2,841 | 0 | 15,190 | 252,822 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,601 | 393 | 196 | 138 | 4 | 3 | 2,335 | 17 | 0 | 17 | 2,711 | 83 | 32 | 20 | 52 | 14 | 25 | 0 | 174 | 5,237 | |
| 合計 | 121,208 | 72,847 | 18,127 | 8,340 | 69 | 42 | 220,633 | 32 | 0 | 32 | 165,488 | 8,562 | 4,490 | 2,553 | 7,043 | 2,584 | 4,539 | 0 | 22,728 | 408,881 | |

| 様式-3 被害額 (事業実施後：R17時点) | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/100 | | (単位：百万円) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|--------|---------|--------|------------|---------|------------|--------|--------------|---------|-------|---------------|--------------------|----------|-------|-------|----|--------|---------|----|
| 氾濫ブロック | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労働対面 | 代替活動等 | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,461 | 30,295 | 6,217 | 2,562 | 30 | 21 | 94,586 | 9 | 0 | 9 | 70,657 | 2,712 | 1,652 | 1,040 | 2,692 | 881 | 1,887 | 0 | 8,172 | 173,424 | |
| L2 | 1,067 | 152 | 40 | 19 | 0 | 0 | 1,278 | 13 | 0 | 13 | 1,792 | 49 | 43 | 23 | 66 | 14 | 9 | 0 | 138 | 3,221 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 79,853 | 49,932 | 13,837 | 6,624 | 48 | 26 | 150,320 | 15 | 0 | 15 | 112,237 | 6,773 | 3,325 | 1,769 | 5,094 | 2,049 | 3,111 | 0 | 17,027 | 279,599 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| R3 | 1,773 | 458 | 207 | 147 | 4 | 3 | 2,592 | 18 | 0 | 18 | 2,932 | 86 | 34 | 22 | 56 | 15 | 29 | 0 | 186 | 5,728 | |
| 合計 | 138,154 | 80,837 | 20,301 | 9,352 | 82 | 50 | 248,776 | 56 | 0 | 56 | 187,671 | 9,620 | 5,054 | 2,854 | 7,908 | 2,959 | 5,036 | 0 | 25,523 | 462,026 | |

様式-3 (被害額：残事業)：R20時点⑫ 炭所箇所：河岸掘削 (18.0k~18.8k)

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R20時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | 河川名：土器川 | | | 流量規模：1/10 | | | (単位：百万円) | | | | | |
|------------|---------|-------------------|-------|----|-------|-----------|--------|-----|---------|--------------------|------------|------------------|-----------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|----|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対面 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R20時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | 河川名：土器川 | | | 流量規模：1/20 | | | (単位：百万円) | | | | | |
|------------|---------|-------------------|-------|----|-------|-----------|--------|-----|---------|--------------------|------------|------------------|-----------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|----|-----|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対面 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 142 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 266 |
| 合計 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 142 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 266 |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R20時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | 河川名：土器川 | | | 流量規模：1/30 | | | (単位：百万円) | | | | | |
|------------|---------|-------------------|-------|----|-------|-----------|--------|-----|---------|--------------------|------------|------------------|-----------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|-----|-------|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対面 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,174 | 242 | 136 | 89 | 3 | 2 | 1,646 | 14 | 0 | 14 | 2,072 | 70 | 30 | 17 | 47 | 12 | 15 | 0 | 144 | 3,876 |
| 合計 | 1,174 | 242 | 136 | 89 | 3 | 2 | 1,646 | 14 | 0 | 14 | 2,080 | 70 | 30 | 17 | 47 | 12 | 15 | 0 | 144 | 3,884 |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R20時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | 河川名：土器川 | | | 流量規模：1/50 | | | (単位：百万円) | | | | | |
|------------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----|---------|--------------------|------------|------------------|-----------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|--------|---------|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対面 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 39,620 | 22,554 | 4,521 | 1,894 | 19 | 14 | 68,622 | 1 | 0 | 1 | 50,963 | 2,010 | 1,223 | 789 | 2,012 | 632 | 1,405 | 0 | 6,059 | 125,645 |
| L2 | 227 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 272 | 2 | 0 | 2 | 345 | 15 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 34 | 653 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 63,536 | 40,740 | 10,200 | 4,909 | 37 | 20 | 119,442 | 6 | 0 | 6 | 88,916 | 4,960 | 2,541 | 1,389 | 3,930 | 1,480 | 2,538 | 0 | 12,908 | 221,272 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,407 | 315 | 166 | 112 | 3 | 3 | 2,006 | 15 | 0 | 15 | 2,386 | 77 | 32 | 19 | 51 | 14 | 20 | 0 | 162 | 4,569 |
| 合計 | 104,790 | 63,642 | 14,897 | 6,917 | 59 | 37 | 190,342 | 24 | 0 | 24 | 142,610 | 7,062 | 3,804 | 2,202 | 6,006 | 2,130 | 3,965 | 0 | 19,163 | 352,139 |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R20時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | 河川名：土器川 | | | 流量規模：1/70 | | | (単位：百万円) | | | | | |
|------------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----|---------|--------------------|------------|------------------|-----------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|--------|---------|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対面 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 46,699 | 26,782 | 5,772 | 2,381 | 23 | 16 | 81,673 | 1 | 0 | 1 | 60,663 | 2,483 | 1,453 | 918 | 2,371 | 781 | 1,669 | 0 | 7,304 | 149,641 |
| L2 | 416 | 64 | 16 | 6 | 0 | 0 | 502 | 4 | 0 | 4 | 615 | 21 | 18 | 10 | 28 | 7 | 4 | 0 | 60 | 1,181 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 72,492 | 45,608 | 12,143 | 5,815 | 42 | 23 | 136,123 | 10 | 0 | 10 | 101,499 | 5,975 | 2,987 | 1,605 | 4,592 | 1,782 | 2,841 | 0 | 15,190 | 252,822 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,601 | 393 | 196 | 138 | 4 | 3 | 2,335 | 17 | 0 | 17 | 2,711 | 83 | 32 | 20 | 52 | 14 | 25 | 0 | 174 | 5,237 |
| 合計 | 121,208 | 72,847 | 18,127 | 8,340 | 69 | 42 | 220,633 | 32 | 0 | 32 | 165,488 | 8,562 | 4,490 | 2,553 | 7,043 | 2,584 | 4,539 | 0 | 22,728 | 408,881 |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R20時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | 河川名：土器川 | | | 流量規模：1/100 | | | (単位：百万円) | | | | | |
|------------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----|---------|--------------------|------------|------------------|-----------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|--------|---------|
| 氾濫 ブロック | 一般資産被害額 | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家庭における 応急対策費用 | | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃労 働対面 | 代替活 動等 | 小計 | | | | | | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,461 | 30,295 | 6,217 | 2,562 | 30 | 21 | 94,586 | 9 | 0 | 9 | 70,657 | 2,712 | 1,652 | 1,040 | 2,692 | 881 | 1,887 | 0 | 8,172 | 173,424 |
| L2 | 1,067 | 152 | 40 | 19 | 0 | 0 | 1,278 | 13 | 0 | 13 | 1,792 | 49 | 43 | 23 | 66 | 14 | 9 | 0 | 138 | 3,221 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 79,853 | 49,932 | 13,837 | 6,624 | 48 | 26 | 150,320 | 15 | 0 | 15 | 112,237 | 6,773 | 3,325 | 1,769 | 5,094 | 2,049 | 3,111 | 0 | 17,027 | 279,599 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| R3 | 1,773 | 458 | 207 | 147 | 4 | 3 | 2,592 | 18 | 0 | 18 | 2,932 | 86 | 34 | 22 | 56 | 15 | 29 | 0 | 186 | 5,728 |
| 合計 | 138,154 | 80,837 | 20,301 | 9,352 | 82 | 50 | 248,776 | 56 | 0 | 56 | 187,671 | 9,620 | 5,054 | 2,854 | 7,908 | 2,959 | 5,036 | 0 | 25,523 | 462,026 |

様式-3 (被害額：残事業)：R22時点⑬ 整備計画完成 (長尾箇所：河床安定化対策)

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R22時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | 河川名：土器川 | | | 流量規模：1/10 | | | (単位：百万円) | | | | |
|------------|----|-------------------|---------|----|--------|-----------|----|--------------------|------------|------------------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|----|----|------------|-----------|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | | | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R22時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | 河川名：土器川 | | | 流量規模：1/20 | | | (単位：百万円) | | | | |
|------------|----|-------------------|---------|----|--------|-----------|----|--------------------|------------|------------------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|----|----|------------|-----------|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | | | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R22時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | 河川名：土器川 | | | 流量規模：1/30 | | | (単位：百万円) | | | | | |
|------------|-------|-------------------|---------|----|--------|-----------|-------|--------------------|------------|------------------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|----|----|------------|-----------|-------|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | | | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R3 | 1,174 | 242 | 136 | 89 | 3 | 2 | 1,646 | 14 | 0 | 14 | 2,072 | 70 | 30 | 17 | 47 | 12 | 15 | 0 | 144 | 3,876 |
| 合計 | 1,174 | 242 | 136 | 89 | 3 | 2 | 1,646 | 14 | 0 | 14 | 2,080 | 70 | 30 | 17 | 47 | 12 | 15 | 0 | 144 | 3,884 |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R22時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | 河川名：土器川 | | | 流量規模：1/50 | | | (単位：百万円) | | | | | |
|------------|---------|-------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|--------------------|------------|------------------|---------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|------------|-----------|---------|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | | | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 39,620 | 22,554 | 4,521 | 1,894 | 19 | 14 | 68,622 | 1 | 0 | 1 | 50,963 | 2,010 | 1,223 | 789 | 2,012 | 632 | 1,405 | 0 | 6,059 | 125,645 |
| L2 | 227 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 272 | 2 | 0 | 2 | 345 | 15 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 34 | 653 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 63,536 | 40,740 | 10,200 | 4,909 | 37 | 20 | 119,442 | 6 | 0 | 6 | 88,916 | 4,960 | 2,541 | 1,389 | 3,930 | 1,480 | 2,538 | 0 | 12,908 | 221,272 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,407 | 315 | 166 | 112 | 3 | 3 | 2,006 | 15 | 0 | 15 | 2,386 | 77 | 32 | 19 | 51 | 14 | 20 | 0 | 162 | 4,569 |
| 合計 | 104,790 | 63,642 | 14,897 | 6,917 | 59 | 37 | 190,342 | 24 | 0 | 24 | 142,610 | 7,062 | 3,804 | 2,202 | 6,006 | 2,130 | 3,965 | 0 | 19,163 | 352,139 |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R22時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | 河川名：土器川 | | | 流量規模：1/70 | | | (単位：百万円) | | | | | |
|------------|---------|-------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|--------------------|------------|------------------|---------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|------------|-----------|---------|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | | | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 46,699 | 26,782 | 5,772 | 2,381 | 23 | 16 | 81,673 | 1 | 0 | 1 | 60,663 | 2,483 | 1,453 | 918 | 2,371 | 781 | 1,669 | 0 | 7,304 | 149,641 |
| L2 | 416 | 64 | 16 | 6 | 0 | 0 | 502 | 4 | 0 | 4 | 615 | 21 | 18 | 10 | 28 | 7 | 4 | 0 | 60 | 1,181 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 72,492 | 45,608 | 12,143 | 5,815 | 42 | 23 | 136,123 | 10 | 0 | 10 | 101,499 | 5,975 | 2,987 | 1,605 | 4,592 | 1,782 | 2,841 | 0 | 15,190 | 252,822 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,601 | 393 | 196 | 138 | 4 | 3 | 2,335 | 17 | 0 | 17 | 2,711 | 83 | 32 | 20 | 52 | 14 | 25 | 0 | 174 | 5,237 |
| 合計 | 121,208 | 72,847 | 18,127 | 8,340 | 69 | 42 | 220,633 | 32 | 0 | 32 | 165,488 | 8,562 | 4,490 | 2,553 | 7,043 | 2,584 | 4,539 | 0 | 22,728 | 408,881 |

| 様式-3 | | 被害額 (事業実施後：R22時点) | | | | 水系名：土器川水系 | | | 河川名：土器川 | | | 流量規模：1/100 | | | (単位：百万円) | | | | | |
|------------|---------|-------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|--------------------|------------|------------------|---------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|------------|-----------|---------|
| 氾濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 一般資産被害額 | | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被害 額 | 営業停 止損失 | 家屋における 応急対策費用 | | 事業所に おける応 急対策費 用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | | | |
| | | | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | | | 畑作物 | 小計 | | | | | | | 清掃労 働対価 | 代替活 動等 | |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,461 | 30,295 | 6,217 | 2,562 | 30 | 21 | 94,586 | 9 | 0 | 9 | 70,657 | 2,712 | 1,652 | 1,040 | 2,692 | 881 | 1,887 | 0 | 8,172 | 173,424 |
| L2 | 1,067 | 152 | 40 | 19 | 0 | 0 | 1,278 | 13 | 0 | 13 | 1,792 | 49 | 43 | 23 | 66 | 14 | 9 | 0 | 138 | 3,221 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 79,853 | 49,932 | 13,837 | 6,624 | 48 | 26 | 150,320 | 15 | 0 | 15 | 112,237 | 6,773 | 3,325 | 1,769 | 5,094 | 2,049 | 3,111 | 0 | 17,027 | 279,599 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| R3 | 1,773 | 458 | 207 | 147 | 4 | 3 | 2,592 | 18 | 0 | 18 | 2,932 | 86 | 34 | 22 | 56 | 15 | 29 | 0 | 186 | 5,728 |
| 合計 | 138,154 | 80,837 | 20,301 | 9,352 | 82 | 50 | 248,776 | 56 | 0 | 56 | 187,671 | 9,620 | 5,054 | 2,854 | 7,908 | 2,959 | 5,036 | 0 | 25,523 | 462,026 |

様式-3 (被害額: 当面事業): R2 現況時点⑥ 飯野箇所: 堤防拡幅 (右岸 1.0k~1.2k)

| 様式-3 | | 被害額 (評価時点: R2現況時点) | | | | | | 水系名: 土器川水系 | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/10 | | | (単位: 百万円) | | | | |
|------------|----|--------------------|-------|----|-------|----|----|------------|-----|----|--------------------|------------|------------------|---------------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------|----|-----|----|
| 汎濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被 害額 | 営業停止 損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所に おける 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | 水稻 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃 労働 対価 | 代替 活動 等 | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 159 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 159 | |

| 様式-3 | | 被害額 (評価時点: R2時点) | | | | | | 水系名: 土器川水系 | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/20 | | | (単位: 百万円) | | | | |
|------------|--------|------------------|-------|-------|-------|----|---------|------------|-----|----|--------------------|------------|------------------|---------------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 汎濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被 害額 | 営業停止 損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所に おける 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | 水稻 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃 労働 対価 | 代替 活動 等 | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 10,842 | 5,014 | 688 | 310 | 2 | 2 | 16,858 | 0 | 0 | 0 | 12,509 | 519 | 407 | 253 | 660 | 119 | 312 | 0 | 1,610 | 30,977 | |
| L2 | 667 | 58 | 21 | 13 | 0 | 0 | 759 | 11 | 0 | 11 | 1,271 | 31 | 33 | 17 | 50 | 8 | 4 | 0 | 93 | 2,134 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 47,561 | 31,627 | 6,331 | 3,088 | 27 | 16 | 88,650 | 3 | 0 | 3 | 65,926 | 2,931 | 1,838 | 1,047 | 2,885 | 975 | 1,970 | 0 | 8,761 | 163,340 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 142 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 266 | |
| 合計 | 59,153 | 36,726 | 7,042 | 3,412 | 29 | 18 | 106,380 | 15 | 0 | 15 | 79,848 | 3,483 | 2,281 | 1,319 | 3,600 | 1,103 | 2,288 | 0 | 10,474 | 196,717 | |

| 様式-3 | | 被害額 (評価時点: R2時点) | | | | | | 水系名: 土器川水系 | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/30 | | | (単位: 百万円) | | | | |
|------------|--------|------------------|--------|-------|-------|----|---------|------------|-----|----|--------------------|------------|------------------|---------------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 汎濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被 害額 | 営業停止 損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所に おける 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | 水稻 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃 労働 対価 | 代替 活動 等 | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 24,938 | 13,960 | 3,458 | 1,397 | 15 | 12 | 43,780 | 0 | 0 | 0 | 32,505 | 1,454 | 768 | 507 | 1,275 | 437 | 870 | 0 | 4,036 | 80,321 | |
| L2 | 1,735 | 288 | 68 | 41 | 0 | 0 | 2,132 | 18 | 0 | 18 | 2,725 | 92 | 70 | 38 | 108 | 22 | 18 | 0 | 240 | 5,115 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 59,069 | 38,050 | 9,164 | 4,443 | 34 | 19 | 110,779 | 5 | 0 | 5 | 82,439 | 4,453 | 2,343 | 1,294 | 3,637 | 1,338 | 2,370 | 0 | 11,798 | 205,021 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,174 | 242 | 136 | 89 | 3 | 2 | 1,646 | 14 | 0 | 14 | 2,072 | 70 | 30 | 17 | 47 | 12 | 15 | 0 | 144 | 3,876 | |
| 合計 | 86,916 | 52,540 | 12,826 | 5,970 | 52 | 33 | 158,337 | 37 | 0 | 37 | 119,741 | 6,069 | 3,211 | 1,856 | 5,067 | 1,809 | 3,273 | 0 | 16,218 | 294,333 | |

| 様式-3 | | 被害額 (評価時点: R2時点) | | | | | | 水系名: 土器川水系 | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/50 | | | (単位: 百万円) | | | | |
|------------|---------|------------------|--------|-------|-------|----|---------|------------|-----|----|--------------------|------------|------------------|---------------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 汎濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被 害額 | 営業停止 損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所に おける 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | 水稻 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃 労働 対価 | 代替 活動 等 | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 39,620 | 22,554 | 4,521 | 1,894 | 19 | 14 | 68,622 | 1 | 0 | 1 | 50,963 | 2,010 | 1,223 | 789 | 2,012 | 632 | 1,405 | 0 | 6,059 | 125,645 | |
| L2 | 3,740 | 659 | 167 | 95 | 1 | 1 | 4,663 | 33 | 0 | 33 | 5,557 | 190 | 167 | 90 | 257 | 51 | 41 | 0 | 539 | 10,792 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 71,019 | 44,761 | 11,850 | 5,675 | 42 | 23 | 133,370 | 9 | 0 | 9 | 99,422 | 5,845 | 2,927 | 1,575 | 4,502 | 1,739 | 2,789 | 0 | 14,875 | 247,676 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,407 | 315 | 166 | 112 | 3 | 3 | 2,006 | 15 | 0 | 15 | 2,386 | 77 | 32 | 19 | 51 | 14 | 20 | 0 | 162 | 4,569 | |
| 合計 | 115,786 | 68,289 | 16,704 | 7,776 | 65 | 41 | 208,661 | 58 | 0 | 58 | 158,328 | 8,122 | 4,349 | 2,473 | 6,822 | 2,436 | 4,255 | 0 | 21,635 | 388,682 | |

| 様式-3 | | 被害額 (評価時点: R2時点) | | | | | | 水系名: 土器川水系 | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/70 | | | (単位: 百万円) | | | | |
|------------|---------|------------------|--------|-------|-------|----|---------|------------|-----|----|--------------------|------------|------------------|---------------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 汎濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被 害額 | 営業停止 損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所に おける 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | 水稻 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃 労働 対価 | 代替 活動 等 | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 46,699 | 26,782 | 5,772 | 2,381 | 23 | 16 | 81,673 | 1 | 0 | 1 | 60,663 | 2,483 | 1,453 | 918 | 2,371 | 781 | 1,669 | 0 | 7,304 | 149,641 | |
| L2 | 5,029 | 1,034 | 217 | 124 | 3 | 2 | 6,409 | 43 | 0 | 43 | 7,471 | 238 | 221 | 121 | 342 | 67 | 64 | 0 | 711 | 14,634 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 79,346 | 49,671 | 13,762 | 6,582 | 48 | 25 | 149,434 | 14 | 0 | 14 | 111,555 | 6,745 | 3,313 | 1,761 | 5,074 | 2,042 | 3,095 | 0 | 16,956 | 277,959 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,601 | 393 | 196 | 138 | 4 | 3 | 2,335 | 17 | 0 | 17 | 2,711 | 83 | 32 | 20 | 52 | 14 | 25 | 0 | 174 | 5,237 | |
| 合計 | 132,675 | 77,880 | 19,947 | 9,225 | 78 | 46 | 239,851 | 75 | 0 | 75 | 182,400 | 9,549 | 5,019 | 2,820 | 7,839 | 2,904 | 4,853 | 0 | 25,145 | 447,471 | |

| 様式-3 | | 被害額 (評価時点: R2時点) | | | | | | 水系名: 土器川水系 | | | 河川名: 土器川 | | | 流量規模: 1/100 | | | (単位: 百万円) | | | | |
|------------|---------|------------------|--------|--------|-------|----|---------|------------|-----|-----|--------------------|------------|------------------|---------------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------|----|
| 汎濫 ブロック | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 小計 | 農作物被害額 | | | 公共土木 施設等被 害額 | 営業停止 損失 | 家屋における 応急対策費用 | | | 事業所に おける 応急対策 費用 | 国・地方 公共団体 における 応急対策 費用 | その他の 間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | 水稻 | 畑作物 | 小計 | | | 清掃 労働 対価 | 代替 活動 等 | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,461 | 30,295 | 6,217 | 2,562 | 30 | 21 | 94,586 | 9 | 0 | 9 | 70,657 | 2,712 | 1,652 | 1,040 | 2,692 | 881 | 1,887 | 0 | 8,172 | 173,424 | |
| L2 | 6,360 | 1,341 | 282 | 163 | 4 | 3 | 8,153 | 53 | 0 | 53 | 9,362 | 278 | 258 | 143 | 401 | 78 | 84 | 0 | 841 | 18,409 | |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 86,588 | 54,215 | 15,496 | 7,415 | 52 | 27 | 163,793 | 19 | 0 | 19 | 122,402 | 7,507 | 3,658 | 1,933 | 5,591 | 2,290 | 3,378 | 0 | 18,766 | 304,980 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 1,773 | 458 | 207 | 147 | 4 | 3 | 2,592 | 18 | 0 | 18 | 2,932 | 86 | 34 | 22 | 56 | 15 | 29 | 0 | 186 | 5,728 | |
| 合計 | 150,182 | 86,309 | 22,202 | 10,287 | 90 | 54 | 269,124 | 100 | 0 | 100 | 205,406 | 10,583 | 5,602 | 3,138 | 8,740 | 3,264 | 5,378 | 0 | 27,965 | 502,595 | |

様式-3 (被害額：当面事業)：R2時点⑦ 飯野箇所：河道掘削 (0.8k~1.4k)

| 様式-3 被害額 (事業実施後：R2時点) | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/10 | | (単位：百万円) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|-------|---------|--------|-----------|----|----------|------------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|----|----|----|-----|
| 汎害ブロック | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L2 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 159 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 159 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後：R2時点) | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/20 | | (単位：百万円) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|-------|---------|--------|-----------|---------|----------|------------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|-------|----|--------|---------|
| 汎害ブロック | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 10,842 | 5,014 | 688 | 310 | 2 | 2 | 16,858 | 0 | 0 | 0 | 12,509 | 519 | 407 | 253 | 660 | 119 | 312 | 0 | 1,610 | 30,977 |
| L2 | 667 | 58 | 21 | 13 | 0 | 0 | 759 | 11 | 0 | 11 | 1,271 | 31 | 33 | 17 | 50 | 8 | 4 | 0 | 93 | 2,134 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 47,561 | 31,627 | 6,331 | 3,088 | 27 | 16 | 88,650 | 3 | 0 | 3 | 65,926 | 2,931 | 1,838 | 1,047 | 2,885 | 975 | 1,970 | 0 | 8,761 | 163,340 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 142 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 266 |
| 合計 | 59,153 | 36,726 | 7,042 | 3,412 | 29 | 18 | 106,380 | 15 | 0 | 15 | 79,848 | 3,483 | 2,281 | 1,319 | 3,600 | 1,103 | 2,288 | 0 | 10,474 | 196,717 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後：R2時点) | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/30 | | (単位：百万円) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|----------|------------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|-------|----|--------|---------|
| 汎害ブロック | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 20,678 | 11,268 | 1,806 | 774 | 7 | 6 | 34,539 | 0 | 0 | 0 | 25,628 | 1,047 | 670 | 446 | 1,116 | 290 | 702 | 0 | 3,155 | 63,322 |
| L2 | 1,735 | 288 | 68 | 41 | 0 | 0 | 2,132 | 18 | 0 | 18 | 2,725 | 92 | 70 | 38 | 108 | 22 | 18 | 0 | 240 | 5,115 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 59,069 | 38,050 | 9,164 | 4,443 | 34 | 19 | 110,779 | 5 | 0 | 5 | 82,439 | 4,453 | 2,343 | 1,294 | 3,637 | 1,338 | 2,370 | 0 | 11,798 | 205,021 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,174 | 242 | 136 | 89 | 3 | 2 | 1,646 | 14 | 0 | 14 | 2,072 | 70 | 30 | 17 | 47 | 12 | 15 | 0 | 144 | 3,876 |
| 合計 | 82,656 | 49,848 | 11,174 | 5,347 | 44 | 27 | 149,096 | 37 | 0 | 37 | 112,864 | 5,662 | 3,113 | 1,795 | 4,908 | 1,662 | 3,105 | 0 | 15,337 | 277,334 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後：R2時点) | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/50 | | (単位：百万円) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|----------|------------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|-------|----|--------|---------|
| 汎害ブロック | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 39,620 | 22,554 | 4,521 | 1,894 | 19 | 14 | 68,622 | 1 | 0 | 1 | 50,963 | 2,010 | 1,223 | 789 | 2,012 | 632 | 1,405 | 0 | 6,059 | 125,645 |
| L2 | 3,740 | 659 | 167 | 95 | 1 | 1 | 4,663 | 33 | 0 | 33 | 5,557 | 190 | 167 | 90 | 257 | 51 | 41 | 0 | 539 | 10,792 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 71,019 | 44,761 | 11,850 | 5,675 | 42 | 23 | 133,370 | 9 | 0 | 9 | 99,422 | 5,845 | 2,927 | 1,575 | 4,502 | 1,739 | 2,789 | 0 | 14,875 | 247,676 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,407 | 315 | 166 | 112 | 3 | 3 | 2,006 | 15 | 0 | 15 | 2,386 | 77 | 32 | 19 | 51 | 14 | 20 | 0 | 162 | 4,569 |
| 合計 | 115,786 | 68,289 | 16,704 | 7,776 | 65 | 41 | 208,661 | 58 | 0 | 58 | 158,328 | 8,122 | 4,349 | 2,473 | 6,822 | 2,436 | 4,255 | 0 | 21,635 | 388,682 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後：R2時点) | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/70 | | (単位：百万円) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|----------|------------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|-------|----|--------|---------|
| 汎害ブロック | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 46,699 | 26,782 | 5,772 | 2,381 | 23 | 16 | 81,673 | 1 | 0 | 1 | 60,663 | 2,483 | 1,453 | 918 | 2,371 | 781 | 1,669 | 0 | 7,304 | 149,641 |
| L2 | 5,029 | 1,034 | 217 | 124 | 3 | 2 | 6,409 | 43 | 0 | 43 | 7,471 | 238 | 221 | 121 | 342 | 67 | 64 | 0 | 711 | 14,634 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 79,346 | 49,671 | 13,762 | 6,582 | 48 | 25 | 149,434 | 14 | 0 | 14 | 111,555 | 6,745 | 3,313 | 1,761 | 5,074 | 2,042 | 3,095 | 0 | 16,956 | 277,959 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,601 | 393 | 196 | 138 | 4 | 3 | 2,335 | 17 | 0 | 17 | 2,711 | 83 | 32 | 20 | 52 | 14 | 25 | 0 | 174 | 5,237 |
| 合計 | 132,675 | 77,880 | 19,947 | 9,225 | 78 | 46 | 239,851 | 75 | 0 | 75 | 182,400 | 9,549 | 5,019 | 2,820 | 7,839 | 2,904 | 4,853 | 0 | 25,145 | 447,471 |

| 様式-3 被害額 (事業実施後：R2時点) | | 水系名：土器川水系 | | 河川名：土器川 | | 流量規模：1/100 | | (単位：百万円) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|--------|---------|--------|------------|---------|----------|------------|--------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------|-------|----|--------|---------|
| 汎害ブロック | 一般資産被害額 | | | | 農作物被害額 | | | | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家屋における応急対策費用 | | | 事業所における応急対策費用 | 国・地方公共団体における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 | |
| | 家屋 | 家庭用品 | 事業所資産 | | 農漁家資産 | | 水稲 | 畑作物 | | | 小計 | 清掃労働対価 | 代替活動等 | | | | | | | 小計 |
| | | | 償却 | 在庫 | 償却 | 在庫 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 55,461 | 30,295 | 6,217 | 2,562 | 30 | 21 | 94,586 | 9 | 0 | 9 | 70,657 | 2,712 | 1,652 | 1,040 | 2,692 | 881 | 1,887 | 0 | 8,172 | 173,424 |
| L2 | 6,360 | 1,341 | 282 | 163 | 4 | 3 | 8,153 | 53 | 0 | 53 | 9,362 | 278 | 258 | 143 | 401 | 78 | 84 | 0 | 841 | 18,409 |
| L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | 86,588 | 54,215 | 15,496 | 7,415 | 52 | 27 | 163,793 | 19 | 0 | 19 | 122,402 | 7,507 | 3,658 | 1,933 | 5,591 | 2,290 | 3,378 | 0 | 18,766 | 304,980 |
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R3 | 1,773 | 458 | 207 | 147 | 4 | 3 | 2,592 | 18 | 0 | 18 | 2,932 | 86 | 34 | 22 | 56 | 15 | 29 | 0 | 186 | 5,728 |
| 合計 | 150,182 | 86,309 | 22,202 | 10,287 | 90 | 54 | 269,124 | 100 | 0 | 100 | 205,406 | 10,583 | 5,602 | 3,138 | 8,740 | 3,264 | 5,378 | 0 | 27,965 | 502,955 |

様式－４（年平均被害軽減期待額：全体事業）

【全体事業】【R22時点】（整備計画河道）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：土器川水系 河川名：土器川 対象河道：平成21年 単位：百万円

| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 116,337 | 0 | 116,337 | 58,169 | 0.02500 | 1,454 | 1,454 | |
| 1/20 | 0.05000 | 194,024 | 0 | 194,024 | 155,181 | 0.05000 | 7,759 | 9,213 | |
| 1/30 | 0.03333 | 240,423 | 3,421 | 237,002 | 215,513 | 0.01667 | 3,593 | 12,806 | |
| 1/50 | 0.02000 | 338,026 | 231,626 | 106,400 | 171,701 | 0.01333 | 2,289 | 15,095 | |
| 1/70 | 0.01429 | 398,027 | 340,778 | 57,249 | 81,825 | 0.00571 | 467 | 15,562 | |
| 1/100 | 0.01000 | 455,868 | 403,438 | 52,430 | 54,840 | 0.00429 | 235 | 15,797 | |

【全体事業】【H23時点】（土器箇所堤防拡幅、左岸1.6k）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：土器川水系 河川名：土器川 対象河道：平成21年 単位：百万円

| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 116,337 | 116,057 | 280 | 140 | 0.02500 | 4 | 4 | |
| 1/20 | 0.05000 | 194,024 | 190,697 | 3,327 | 1,804 | 0.05000 | 90 | 94 | |
| 1/30 | 0.03333 | 240,423 | 237,965 | 2,458 | 2,893 | 0.01667 | 48 | 142 | |
| 1/50 | 0.02000 | 338,026 | 338,026 | 0 | 1,229 | 0.01333 | 16 | 158 | |
| 1/70 | 0.01429 | 398,027 | 398,027 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 158 | |
| 1/100 | 0.01000 | 455,868 | 455,868 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 158 | |

【全体事業】【H25時点】（土器箇所局所洗掘対策、左岸1.6k）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：土器川水系 河川名：土器川 対象河道：平成21年 単位：百万円

| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 116,337 | 87,087 | 29,250 | 14,625 | 0.02500 | 366 | 366 | |
| 1/20 | 0.05000 | 194,024 | 162,908 | 31,116 | 30,183 | 0.05000 | 1,509 | 1,875 | |
| 1/30 | 0.03333 | 240,423 | 221,025 | 19,398 | 25,257 | 0.01667 | 421 | 2,296 | |
| 1/50 | 0.02000 | 338,026 | 338,026 | 0 | 9,699 | 0.01333 | 129 | 2,425 | |
| 1/70 | 0.01429 | 398,027 | 398,027 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 2,425 | |
| 1/100 | 0.01000 | 455,868 | 455,868 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 2,425 | |

【全体事業】【R01-1時点】（飯野箇所侵食対策、右岸4.2k）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：土器川水系 河川名：土器川 対象河道：平成21年 単位：百万円

| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 116,337 | 52,952 | 63,385 | 31,693 | 0.02500 | 792 | 792 | |
| 1/20 | 0.05000 | 194,024 | 110,466 | 83,558 | 73,472 | 0.05000 | 3,674 | 4,466 | |
| 1/30 | 0.03333 | 240,423 | 221,025 | 19,398 | 51,478 | 0.01667 | 858 | 5,324 | |
| 1/50 | 0.02000 | 338,026 | 338,026 | 0 | 9,699 | 0.01333 | 129 | 5,453 | |
| 1/70 | 0.01429 | 398,027 | 398,027 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 5,453 | |
| 1/100 | 0.01000 | 455,868 | 455,868 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 5,453 | |

様式－４（年平均被害軽減期待額：全体事業）

【全体事業】【R01-2時点】（高柳箇所侵食対策、右岸6.0k）

| 様式－４ | | 年平均被害軽減期待額 | | | 水系名：土器川水系 | 河川名：土器川 | 対象河道：平成21年 | 単位：百万円 | |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 116,337 | 52,952 | 63,385 | 31,693 | 0.02500 | 792 | 792 | |
| 1/20 | 0.05000 | 194,024 | 110,466 | 83,558 | 73,472 | 0.05000 | 3,674 | 4,466 | |
| 1/30 | 0.03333 | 240,423 | 221,025 | 19,398 | 51,478 | 0.01667 | 858 | 5,324 | |
| 1/50 | 0.02000 | 338,026 | 338,026 | 0 | 9,699 | 0.01333 | 129 | 5,453 | |
| 1/70 | 0.01429 | 398,027 | 398,027 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 5,453 | |
| 1/100 | 0.01000 | 455,868 | 455,868 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 5,453 | |

【全体事業】【R01-3時点】（飯野箇所堤防拡幅、右岸1.0k~1.2k）

| 様式－４ | | 年平均被害軽減期待額 | | | 水系名：土器川水系 | 河川名：土器川 | 対象河道：平成21年 | 単位：百万円 | |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 116,337 | 52,261 | 64,076 | 32,038 | 0.02500 | 801 | 801 | |
| 1/20 | 0.05000 | 194,024 | 95,331 | 98,693 | 81,385 | 0.05000 | 4,069 | 4,870 | |
| 1/30 | 0.03333 | 240,423 | 221,025 | 19,398 | 59,046 | 0.01667 | 984 | 5,854 | |
| 1/50 | 0.02000 | 338,026 | 338,026 | 0 | 9,699 | 0.01333 | 129 | 5,983 | |
| 1/70 | 0.01429 | 398,027 | 398,027 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 5,983 | |
| 1/100 | 0.01000 | 455,868 | 455,868 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 5,983 | |

【全体事業】【R2時点】（飯野箇所河道掘削、0.8k~1.4k）

| 様式－４ | | 年平均被害軽減期待額 | | | 水系名：土器川水系 | 河川名：土器川 | 対象河道：平成21年 | 単位：百万円 | |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 116,337 | 52,261 | 64,076 | 32,038 | 0.02500 | 801 | 801 | |
| 1/20 | 0.05000 | 194,024 | 88,744 | 105,280 | 84,678 | 0.05000 | 4,234 | 5,035 | |
| 1/30 | 0.03333 | 240,423 | 213,187 | 27,236 | 66,258 | 0.01667 | 1,105 | 6,140 | |
| 1/50 | 0.02000 | 338,026 | 338,026 | 0 | 13,618 | 0.01333 | 182 | 6,322 | |
| 1/70 | 0.01429 | 398,027 | 398,027 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 6,322 | |
| 1/100 | 0.01000 | 455,868 | 455,868 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 6,322 | |

【全体事業】【R14-1時点】（飯野箇所引堤、右岸1.4k~2.0k）

| 様式－４ | | 年平均被害軽減期待額 | | | 水系名：土器川水系 | 河川名：土器川 | 対象河道：平成21年 | 単位：百万円 | |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 116,337 | 386 | 115,951 | 57,976 | 0.02500 | 1,449 | 1,449 | |
| 1/20 | 0.05000 | 194,024 | 36,869 | 157,155 | 136,553 | 0.05000 | 6,828 | 8,277 | |
| 1/30 | 0.03333 | 240,423 | 213,187 | 27,236 | 92,196 | 0.01667 | 1,537 | 9,814 | |
| 1/50 | 0.02000 | 338,026 | 338,026 | 0 | 13,618 | 0.01333 | 182 | 9,996 | |
| 1/70 | 0.01429 | 398,027 | 398,027 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 9,996 | |
| 1/100 | 0.01000 | 455,868 | 455,868 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 9,996 | |

様式－４（年平均被害軽減期待額：全体事業）

【全体事業】【R14-2時点】（土器箇所堤防拡幅、左岸2.4k）

| 様式－４ | | 年平均被害軽減期待額 | | | 水系名：土器川水系 | 河川名：土器川 | 対象河道：平成21年 | 単位：百万円 | |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 116,337 | 386 | 115,951 | 57,976 | 0.02500 | 1,449 | 1,449 | |
| 1/20 | 0.05000 | 194,024 | 2,828 | 191,196 | 153,574 | 0.05000 | 7,679 | 9,128 | |
| 1/30 | 0.03333 | 240,423 | 149,524 | 90,899 | 141,048 | 0.01667 | 2,351 | 11,479 | |
| 1/50 | 0.02000 | 338,026 | 338,026 | 0 | 45,450 | 0.01333 | 606 | 12,085 | |
| 1/70 | 0.01429 | 398,027 | 398,027 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 12,085 | |
| 1/100 | 0.01000 | 455,868 | 455,868 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 12,085 | |

【全体事業】【R15時点】（飯野箇所堤防拡幅、右岸3.2k~3.4k）

| 様式－４ | | 年平均被害軽減期待額 | | | 水系名：土器川水系 | 河川名：土器川 | 対象河道：平成21年 | 単位：百万円 | |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 116,337 | 386 | 115,951 | 57,976 | 0.02500 | 1,449 | 1,449 | |
| 1/20 | 0.05000 | 194,024 | 2,828 | 191,196 | 153,574 | 0.05000 | 7,679 | 9,128 | |
| 1/30 | 0.03333 | 240,423 | 4,920 | 235,503 | 213,350 | 0.01667 | 3,557 | 12,685 | |
| 1/50 | 0.02000 | 338,026 | 258,043 | 79,983 | 157,743 | 0.01333 | 2,103 | 14,788 | |
| 1/70 | 0.01429 | 398,027 | 371,156 | 26,871 | 53,427 | 0.00571 | 305 | 15,093 | |
| 1/100 | 0.01000 | 455,868 | 432,665 | 23,203 | 25,037 | 0.00429 | 107 | 15,200 | |

【全体事業】【R17時点】（長尾箇所堤防整備、右岸16.5k~16.9k大川頭首工）

| 様式－４ | | 年平均被害軽減期待額 | | | 水系名：土器川水系 | 河川名：土器川 | 対象河道：平成21年 | 単位：百万円 | |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 116,337 | 0 | 116,337 | 58,169 | 0.02500 | 1,454 | 1,454 | |
| 1/20 | 0.05000 | 194,024 | 847 | 193,177 | 154,757 | 0.05000 | 7,738 | 9,192 | |
| 1/30 | 0.03333 | 240,423 | 4,920 | 235,503 | 214,340 | 0.01667 | 3,573 | 12,765 | |
| 1/50 | 0.02000 | 338,026 | 249,869 | 88,157 | 161,830 | 0.01333 | 2,157 | 14,922 | |
| 1/70 | 0.01429 | 398,027 | 360,201 | 37,826 | 62,992 | 0.00571 | 360 | 15,282 | |
| 1/100 | 0.01000 | 455,868 | 420,862 | 35,006 | 36,416 | 0.00429 | 156 | 15,438 | |

【全体事業】【R20時点】（炭所箇所河岸掘削、18.0k~18.8k）

| 様式－４ | | 年平均被害軽減期待額 | | | 水系名：土器川水系 | 河川名：土器川 | 対象河道：平成21年 | 単位：百万円 | |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 116,337 | 0 | 116,337 | 58,169 | 0.02500 | 1,454 | 1,454 | |
| 1/20 | 0.05000 | 194,024 | 296 | 193,728 | 155,033 | 0.05000 | 7,752 | 9,206 | |
| 1/30 | 0.03333 | 240,423 | 3,793 | 236,630 | 215,179 | 0.01667 | 3,587 | 12,793 | |
| 1/50 | 0.02000 | 338,026 | 247,807 | 90,219 | 163,425 | 0.01333 | 2,178 | 14,971 | |
| 1/70 | 0.01429 | 398,027 | 360,189 | 37,838 | 64,029 | 0.00571 | 366 | 15,337 | |
| 1/100 | 0.01000 | 455,868 | 420,846 | 35,022 | 36,430 | 0.00429 | 156 | 15,493 | |

様式－４（年平均被害軽減期待額：残事業）

【残事業】【R22時点】（整備計画河道）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：土器川水系 河川名：土器川 対象河道：令和2年 単位：百万円

| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 159 | 0 | 159 | 80 | 0.02500 | 2 | 2 | |
| 1/20 | 0.05000 | 196,717 | 0 | 196,717 | 98,438 | 0.05000 | 4,922 | 4,924 | |
| 1/30 | 0.03333 | 277,334 | 3,884 | 273,450 | 235,084 | 0.01667 | 3,919 | 8,843 | |
| 1/50 | 0.02000 | 388,682 | 352,139 | 36,543 | 154,997 | 0.01333 | 2,066 | 10,909 | |
| 1/70 | 0.01429 | 447,471 | 408,881 | 38,590 | 37,567 | 0.00571 | 215 | 11,124 | |
| 1/100 | 0.01000 | 502,595 | 462,026 | 40,569 | 39,580 | 0.00429 | 170 | 11,294 | |

【残事業】【R14-1時点】（飯野箇所引堤、右岸1.4k~2.0k）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：土器川水系 河川名：土器川 対象河道：令和2年 単位：百万円

| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0.02500 | 0 | 0 | |
| 1/20 | 0.05000 | 196,717 | 33,377 | 163,340 | 81,670 | 0.05000 | 4,084 | 4,084 | |
| 1/30 | 0.03333 | 277,334 | 72,313 | 205,021 | 184,181 | 0.01667 | 3,070 | 7,154 | |
| 1/50 | 0.02000 | 388,682 | 388,682 | 0 | 102,511 | 0.01333 | 1,366 | 8,520 | |
| 1/70 | 0.01429 | 447,471 | 447,471 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 8,520 | |
| 1/100 | 0.01000 | 502,595 | 502,595 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 8,520 | |

【残事業】【R14-2時点】（土器箇所堤防拡幅、左岸2.4k）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：土器川水系 河川名：土器川 対象河道：令和2年 単位：百万円

| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0.02500 | 0 | 0 | |
| 1/20 | 0.05000 | 196,717 | 2,400 | 194,317 | 97,159 | 0.05000 | 4,858 | 4,858 | |
| 1/30 | 0.03333 | 277,334 | 8,991 | 268,343 | 231,330 | 0.01667 | 3,856 | 8,714 | |
| 1/50 | 0.02000 | 388,682 | 388,682 | 0 | 134,172 | 0.01333 | 1,789 | 10,503 | |
| 1/70 | 0.01429 | 447,471 | 447,471 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 10,503 | |
| 1/100 | 0.01000 | 502,595 | 502,595 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 10,503 | |

【残事業】【R15時点】（飯野箇所堤防拡幅、右岸3.2k~3.4k）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：土器川水系 河川名：土器川 対象河道：令和2年 単位：百万円

| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0.02500 | 0 | 0 | |
| 1/20 | 0.05000 | 196,717 | 2,400 | 194,317 | 97,159 | 0.05000 | 4,858 | 4,858 | |
| 1/30 | 0.03333 | 277,334 | 8,991 | 268,343 | 231,330 | 0.01667 | 3,856 | 8,714 | |
| 1/50 | 0.02000 | 388,682 | 362,278 | 26,404 | 147,374 | 0.01333 | 1,964 | 10,678 | |
| 1/70 | 0.01429 | 447,471 | 422,334 | 25,137 | 25,771 | 0.00571 | 147 | 10,825 | |
| 1/100 | 0.01000 | 502,595 | 477,214 | 25,381 | 25,259 | 0.00429 | 108 | 10,933 | |

様式－４（年平均被害軽減期待額：残事業）

【残事業】【R17時点】（長尾箇所堤防整備、右岸16.5k～16.9k大川頭首工）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：土器川水系 河川名：土器川 対象河道：令和2年 単位：百万円

| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 159 | 8 | 151 | 76 | 0.02500 | 2 | 2 | |
| 1/20 | 0.05000 | 196,717 | 372 | 196,345 | 98,248 | 0.05000 | 4,912 | 4,914 | |
| 1/30 | 0.03333 | 277,334 | 4,238 | 273,096 | 234,721 | 0.01667 | 3,913 | 8,827 | |
| 1/50 | 0.02000 | 388,682 | 352,139 | 36,543 | 154,820 | 0.01333 | 2,064 | 10,891 | |
| 1/70 | 0.01429 | 447,471 | 408,881 | 38,590 | 37,567 | 0.00571 | 215 | 11,106 | |
| 1/100 | 0.01000 | 502,595 | 462,026 | 40,569 | 39,580 | 0.00429 | 170 | 11,276 | |

【残事業】【R20時点】（炭所箇所河道掘削、18.0k～18.8k）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：土器川水系 河川名：土器川 対象河道：令和2年 単位：百万円

| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 159 | 0 | 159 | 80 | 0.02500 | 2 | 2 | |
| 1/20 | 0.05000 | 196,717 | 266 | 196,451 | 98,305 | 0.05000 | 4,915 | 4,917 | |
| 1/30 | 0.03333 | 277,334 | 3,884 | 273,450 | 234,951 | 0.01667 | 3,917 | 8,834 | |
| 1/50 | 0.02000 | 388,682 | 352,139 | 36,543 | 154,997 | 0.01333 | 2,066 | 10,900 | |
| 1/70 | 0.01429 | 447,471 | 408,881 | 38,590 | 37,567 | 0.00571 | 215 | 11,115 | |
| 1/100 | 0.01000 | 502,595 | 462,026 | 40,569 | 39,580 | 0.00429 | 170 | 11,285 | |

様式－４（年平均被害軽減期待額：当面事業）

【当面事業】【R2時点】（飯野箇所河道掘削、0.8k～1.4k）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：土器川水系 河川名：土器川 対象河道：令和2年 単位：百万円

| 流量規模 | 超過確率 | 被害額 | | | 区間平均被害額 ④ | 区間確率 ⑤ | 年平均被害額 ④×⑤ | 年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|----|
| | | 事業を実施しない場合 ① | 事業を実施した場合 ② | 軽減額 ③=①-② | | | | | |
| 1/8 | 0.12500 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1/10 | 0.10000 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0.02500 | 0 | 0 | |
| 1/20 | 0.05000 | 196,717 | 196,717 | 0 | 0 | 0.05000 | 0 | 0 | |
| 1/30 | 0.03333 | 294,333 | 277,334 | 16,999 | 8,500 | 0.01667 | 142 | 142 | |
| 1/50 | 0.02000 | 388,682 | 388,682 | 0 | 8,500 | 0.01333 | 113 | 255 | |
| 1/70 | 0.01429 | 447,471 | 447,471 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | 255 | |
| 1/100 | 0.01000 | 502,595 | 502,595 | 0 | 0 | 0.00429 | 0 | 255 | |

様式-5 (費用対便益：全体事業)

| | | 水系名：土器川 | | | | 河川名：土器川 | | | | (百万円) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---------|-----------------|----------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|--------|--------|--------------|--------------|---------|----|--------|------|------|------|---------|
| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レー ター | 便 益 | | | 費 用 | | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | | | | | |
| | | | | | 便益① | | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | | 維持管理費④ | | | ③+④ | | | | | | |
| | | | | | 便益 | 現在価値 | | | 費用 | 現在価値 | 費用 | | | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | | | | |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整備期間 32年 | H21 | -11 | 1.539 | 1.142 | 0 | 0 | | | 730 | 1,283 | 0.0 | 0.0 | 730.0 | 1,283.4 | | | | | | |
| | H22 | -10 | 1.480 | 1.141 | 0 | 0 | | | 483 | 816 | 0.0 | 0.0 | 483.0 | 815.6 | | | | | | |
| | H23 | -9 | 1.423 | 1.118 | 0 | 0 | | | 369 | 587 | 0.0 | 0.0 | 369.0 | 587.2 | | | | | | |
| | H24 | -8 | 1.369 | 1.125 | 158 | 216 | | | 967 | 1,488 | 0.1 | 0.2 | 967.1 | 1,488.7 | | | | | | |
| | H25 | -7 | 1.316 | 1.100 | 158 | 208 | | | 694 | 1,005 | 0.1 | 0.1 | 694.1 | 1,005.1 | | | | | | |
| | H26 | -6 | 1.265 | 1.067 | 158 | 200 | | | 543 | 733 | 0.1 | 0.1 | 543.1 | 733.1 | | | | | | |
| | H27 | -5 | 1.217 | 1.057 | 2,425 | 2,950 | | | 511 | 657 | 0.1 | 0.1 | 511.1 | 657.1 | | | | | | |
| | H28 | -4 | 1.170 | 1.057 | 2,425 | 2,837 | | | 485 | 600 | 0.1 | 0.1 | 485.1 | 599.7 | | | | | | |
| | H29 | -3 | 1.125 | 1.032 | 2,425 | 2,728 | | | 391 | 454 | 0.1 | 0.1 | 391.1 | 454.2 | | | | | | |
| | H30 | -2 | 1.082 | 1.000 | 2,425 | 2,623 | | | 471 | 509 | 0.1 | 0.1 | 471.1 | 509.5 | | | | | | |
| | R1 | -1 | 1.040 | 1.000 | 2,425 | 2,522 | | | 877 | 912 | 0.1 | 0.1 | 877.1 | 912.2 | | | | | | |
| | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5,983 | 5,983 | | | 653 | 653 | 0.2 | 0.2 | 653.2 | 653.2 | | | | | | |
| | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 6,322 | 6,079 | | | 388 | 373 | 0.2 | 0.2 | 388.2 | 373.3 | | | | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 6,322 | 5,845 | | | 386 | 357 | 0.2 | 0.2 | 386.2 | 357.1 | | | | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 6,322 | 5,620 | | | 381 | 339 | 0.2 | 0.2 | 381.2 | 338.9 | | | | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 6,322 | 5,404 | | | 372 | 318 | 0.2 | 0.2 | 372.2 | 318.2 | | | | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 6,322 | 5,196 | | | 367 | 302 | 0.2 | 0.2 | 367.2 | 301.8 | | | | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 6,322 | 4,996 | | | 380 | 300 | 0.2 | 0.2 | 380.2 | 300.5 | | | | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 6,322 | 4,804 | | | 506 | 385 | 0.2 | 0.2 | 506.2 | 384.7 | | | | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 6,322 | 4,619 | | | 622 | 454 | 0.2 | 0.1 | 622.2 | 454.6 | | | | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 6,322 | 4,442 | | | 747 | 525 | 0.2 | 0.1 | 747.2 | 525.0 | | | | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 6,322 | 4,271 | | | 772 | 522 | 0.2 | 0.1 | 772.2 | 521.7 | | | | | | |
| R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 6,322 | 4,107 | | | 367 | 238 | 1.2 | 0.8 | 368.2 | 239.2 | | | | | | | |
| R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 6,322 | 3,949 | | | 394 | 246 | 1.2 | 0.7 | 395.2 | 246.8 | | | | | | | |
| R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 12,085 | 7,258 | | | 277 | 166 | 1.2 | 0.7 | 278.2 | 167.1 | | | | | | | |
| R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 15,200 | 8,778 | | | 295 | 170 | 1.4 | 0.8 | 296.4 | 171.2 | | | | | | | |
| R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 15,200 | 8,440 | | | 276 | 153 | 1.4 | 0.8 | 277.4 | 154.0 | | | | | | | |
| R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 15,438 | 8,242 | | | 295 | 158 | 2.8 | 1.5 | 297.8 | 159.0 | | | | | | | |
| R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 15,438 | 7,925 | | | 291 | 149 | 2.8 | 1.4 | 293.8 | 150.8 | | | | | | | |
| R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 15,438 | 7,621 | | | 291 | 144 | 2.8 | 1.4 | 293.8 | 145.0 | | | | | | | |
| R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 15,493 | 7,354 | | | 225 | 107 | 4.2 | 2.0 | 229.2 | 108.8 | | | | | | | |
| R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 15,493 | 7,071 | | | 225 | 103 | 4.2 | 1.9 | 229.2 | 104.6 | | | | | | | |
| 施設完成後の 評価期間 50年 | R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 15,797 | 6,932 | | | | | 15.8 | 6.9 | 15.8 | 6.9 | | | | | | |
| | R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 15,797 | 6,666 | | | | | 15.8 | 6.7 | 15.8 | 6.7 | | | | | | |
| | R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 15,797 | 6,409 | | | | | 15.8 | 6.4 | 15.8 | 6.4 | | | | | | |
| | R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 15,797 | 6,163 | | | | | 15.8 | 6.2 | 15.8 | 6.2 | | | | | | |
| | R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 15,797 | 5,926 | | | | | 15.8 | 5.9 | 15.8 | 5.9 | | | | | | |
| | R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 15,797 | 5,698 | | | | | 15.8 | 5.7 | 15.8 | 5.7 | | | | | | |
| | R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 15,797 | 5,479 | | | | | 15.8 | 5.5 | 15.8 | 5.5 | | | | | | |
| | R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 15,797 | 5,268 | | | | | 15.8 | 5.3 | 15.8 | 5.3 | | | | | | |
| | R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 15,797 | 5,065 | | | | | 15.8 | 5.1 | 15.8 | 5.1 | | | | | | |
| | R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 15,797 | 4,871 | | | | | 15.8 | 4.9 | 15.8 | 4.9 | | | | | | |
| | R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 15,797 | 4,683 | | | | | 15.8 | 4.7 | 15.8 | 4.7 | | | | | | |
| | R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 15,797 | 4,503 | | | | | 15.8 | 4.5 | 15.8 | 4.5 | | | | | | |
| | R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 15,797 | 4,330 | | | | | 15.8 | 4.3 | 15.8 | 4.3 | | | | | | |
| | R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 15,797 | 4,163 | | | | | 15.8 | 4.2 | 15.8 | 4.2 | | | | | | |
| | R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 15,797 | 4,003 | | | | | 15.8 | 4.0 | 15.8 | 4.0 | | | | | | |
| | R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 15,797 | 3,849 | | | | | 15.8 | 3.8 | 15.8 | 3.8 | | | | | | |
| | R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 15,797 | 3,701 | | | | | 15.8 | 3.7 | 15.8 | 3.7 | | | | | | |
| | R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 15,797 | 3,559 | | | | | 15.8 | 3.6 | 15.8 | 3.6 | | | | | | |
| | R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 15,797 | 3,422 | | | | | 15.8 | 3.4 | 15.8 | 3.4 | | | | | | |
| | R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 15,797 | 3,290 | | | | | 15.8 | 3.3 | 15.8 | 3.3 | | | | | | |
| | R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 15,797 | 3,164 | | | | | 15.8 | 3.2 | 15.8 | 3.2 | | | | | | |
| | R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 15,797 | 3,042 | | | | | 15.8 | 3.0 | 15.8 | 3.0 | | | | | | |
| | R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 15,797 | 2,925 | | | | | 15.8 | 2.9 | 15.8 | 2.9 | | | | | | |
| | R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 15,797 | 2,813 | | | | | 15.8 | 2.8 | 15.8 | 2.8 | | | | | | |
| | R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 15,797 | 2,704 | | | | | 15.8 | 2.7 | 15.8 | 2.7 | | | | | | |
| | R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 15,797 | 2,600 | | | | | 15.8 | 2.6 | 15.8 | 2.6 | | | | | | |
| | R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 15,797 | 2,500 | | | | | 15.8 | 2.5 | 15.8 | 2.5 | | | | | | |
| | R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 15,797 | 2,404 | | | | | 15.8 | 2.4 | 15.8 | 2.4 | | | | | | |
| | R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 15,797 | 2,312 | | | | | 15.8 | 2.3 | 15.8 | 2.3 | | | | | | |
| | R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 15,797 | 2,223 | | | | | 15.8 | 2.2 | 15.8 | 2.2 | | | | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 15,797 | 2,137 | | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 15,797 | 2,055 | | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 15,797 | 1,976 | | | | | 15.8 | 2.0 | 15.8 | 2.0 | | | | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 15,797 | 1,900 | | | | | 15.8 | 1.9 | 15.8 | 1.9 | | | | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 15,797 | 1,827 | | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 15,797 | 1,757 | | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 15,797 | 1,689 | | | | | 15.8 | 1.7 | 15.8 | 1.7 | | | | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 15,797 | 1,624 | | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 15,797 | 1,562 | | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 15,797 | 1,502 | | | | | 15.8 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | | | | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 15,797 | 1,444 | | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 15,797 | 1,388 | | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 15,797 | 1,335 | | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 15,797 | 1,284 | | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 15,797 | 1,234 | | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 15,797 | 1,187 | | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 15,797 | 1,141 | | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 15,797 | 1,097 | | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | | | | |
| R71 | 69 | 0.067 | 1.000 | 15,797 | 1,055 | | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | | | | |
| R72 | 70 | 0.064 | 1.000 | 15,797 | 1,014 | | | | | 15.8 | 1.0 | 15.8 | 1.0 | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 1,004,081 | 297,163 | 239 | B= | 297,402 | 15,031 | 15,206 | 816.2 | 169.7 | 15,847 | C= | 15,376 | B/C= | 19.3 | B-C= | 282,026 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：残事業)

| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レ ー タ ー | 水系名:土器川 | | | 河川名:土器川 | | | (百万円) | | | | | |
|---|------|-------|-----------------|------------------------|---------|-----------|----------|--------------------|--------|-------|--------------|--------------|-------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | 便 益 | | | 費 用 | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | | |
| | | | | | 便益① | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | 維持管理費④ | ③+④ | | | | | | |
| 便益 | 現在価値 | | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | | | | | | | | |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 整備 期間 20 年 | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 0 | 0 | | 388 | 373 | 0.0 | 0.0 | 388.0 | 373.1 | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 0 | 0 | | 386 | 357 | 0.0 | 0.0 | 386.0 | 356.9 | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 0 | 0 | | 381 | 339 | 0.0 | 0.0 | 381.0 | 338.7 | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 0 | 0 | | 372 | 318 | 0.0 | 0.0 | 372.0 | 318.0 | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 0 | 0 | | 367 | 302 | 0.0 | 0.0 | 367.0 | 301.6 | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 0 | 0 | | 380 | 300 | 0.0 | 0.0 | 380.0 | 300.3 | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 0 | 0 | | 506 | 385 | 0.0 | 0.0 | 506.0 | 384.5 | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 0 | 0 | | 622 | 454 | 0.0 | 0.0 | 622.0 | 454.5 | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 0 | 0 | | 747 | 525 | 0.0 | 0.0 | 747.0 | 524.8 | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 0 | 0 | | 772 | 522 | 0.0 | 0.0 | 772.0 | 521.5 | | | |
| | R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 0 | 0 | | 367 | 238 | 1.0 | 0.6 | 368.0 | 239.0 | | | |
| | R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 0 | 0 | | 394 | 246 | 1.0 | 0.6 | 395.0 | 246.7 | | | |
| | R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 10,503 | 6,308 | | 277 | 166 | 1.1 | 0.7 | 278.1 | 167.0 | | | |
| | R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 10,933 | 6,314 | | 295 | 170 | 1.2 | 0.7 | 296.2 | 171.0 | | | |
| | R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 10,933 | 6,071 | | 276 | 153 | 1.2 | 0.7 | 277.2 | 153.9 | | | |
| | R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 11,276 | 6,020 | | 295 | 158 | 2.7 | 1.4 | 297.7 | 158.9 | | | |
| | R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 11,276 | 5,789 | | 291 | 149 | 2.7 | 1.4 | 293.7 | 150.8 | | | |
| | R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 11,276 | 5,566 | | 291 | 144 | 2.7 | 1.3 | 293.7 | 145.0 | | | |
| | R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 11,285 | 5,356 | | 225 | 107 | 4.1 | 1.9 | 229.1 | 108.7 | | | |
| | R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 11,285 | 5,150 | | 225 | 103 | 4.1 | 1.9 | 229.1 | 104.6 | | | |
| 施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 50 年 | R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 11,294 | 4,956 | | | | 15.6 | 6.8 | 15.6 | 6.8 | | | |
| | R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 11,294 | 4,766 | | | | 15.6 | 6.6 | 15.6 | 6.6 | | | |
| | R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 11,294 | 4,582 | | | | 15.6 | 6.3 | 15.6 | 6.3 | | | |
| | R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 11,294 | 4,406 | | | | 15.6 | 6.1 | 15.6 | 6.1 | | | |
| | R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 11,294 | 4,237 | | | | 15.6 | 5.9 | 15.6 | 5.9 | | | |
| | R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 11,294 | 4,074 | | | | 15.6 | 5.6 | 15.6 | 5.6 | | | |
| | R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 11,294 | 3,917 | | | | 15.6 | 5.4 | 15.6 | 5.4 | | | |
| | R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 11,294 | 3,766 | | | | 15.6 | 5.2 | 15.6 | 5.2 | | | |
| | R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 11,294 | 3,621 | | | | 15.6 | 5.0 | 15.6 | 5.0 | | | |
| | R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 11,294 | 3,482 | | | | 15.6 | 4.8 | 15.6 | 4.8 | | | |
| | R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 11,294 | 3,348 | | | | 15.6 | 4.6 | 15.6 | 4.6 | | | |
| | R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 11,294 | 3,219 | | | | 15.6 | 4.4 | 15.6 | 4.4 | | | |
| | R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 11,294 | 3,096 | | | | 15.6 | 4.3 | 15.6 | 4.3 | | | |
| | R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 11,294 | 2,977 | | | | 15.6 | 4.1 | 15.6 | 4.1 | | | |
| | R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 11,294 | 2,862 | | | | 15.6 | 4.0 | 15.6 | 4.0 | | | |
| | R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 11,294 | 2,752 | | | | 15.6 | 3.8 | 15.6 | 3.8 | | | |
| | R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 11,294 | 2,646 | | | | 15.6 | 3.7 | 15.6 | 3.7 | | | |
| | R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 11,294 | 2,544 | | | | 15.6 | 3.5 | 15.6 | 3.5 | | | |
| | R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 11,294 | 2,447 | | | | 15.6 | 3.4 | 15.6 | 3.4 | | | |
| | R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 11,294 | 2,352 | | | | 15.6 | 3.2 | 15.6 | 3.2 | | | |
| | R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 11,294 | 2,262 | | | | 15.6 | 3.1 | 15.6 | 3.1 | | | |
| | R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 11,294 | 2,175 | | | | 15.6 | 3.0 | 15.6 | 3.0 | | | |
| | R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 11,294 | 2,091 | | | | 15.6 | 2.9 | 15.6 | 2.9 | | | |
| | R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 11,294 | 2,011 | | | | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | | | |
| | R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 11,294 | 1,934 | | | | 15.6 | 2.7 | 15.6 | 2.7 | | | |
| | R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 11,294 | 1,859 | | | | 15.6 | 2.6 | 15.6 | 2.6 | | | |
| | R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 11,294 | 1,788 | | | | 15.6 | 2.5 | 15.6 | 2.5 | | | |
| | R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 11,294 | 1,719 | | | | 15.6 | 2.4 | 15.6 | 2.4 | | | |
| | R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 11,294 | 1,653 | | | | 15.6 | 2.3 | 15.6 | 2.3 | | | |
| | R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 11,294 | 1,589 | | | | 15.6 | 2.2 | 15.6 | 2.2 | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 11,294 | 1,528 | | | | 15.6 | 2.1 | 15.6 | 2.1 | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 11,294 | 1,469 | | | | 15.6 | 2.0 | 15.6 | 2.0 | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 11,294 | 1,413 | | | | 15.6 | 2.0 | 15.6 | 2.0 | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 11,294 | 1,358 | | | | 15.6 | 1.9 | 15.6 | 1.9 | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 11,294 | 1,306 | | | | 15.6 | 1.8 | 15.6 | 1.8 | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 11,294 | 1,256 | | | | 15.6 | 1.7 | 15.6 | 1.7 | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 11,294 | 1,208 | | | | 15.6 | 1.7 | 15.6 | 1.7 | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 11,294 | 1,161 | | | | 15.6 | 1.6 | 15.6 | 1.6 | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 11,294 | 1,117 | | | | 15.6 | 1.5 | 15.6 | 1.5 | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 11,294 | 1,074 | | | | 15.6 | 1.5 | 15.6 | 1.5 | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 11,294 | 1,032 | | | | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 1.4 | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 11,294 | 993 | | | | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 1.4 | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 11,294 | 954 | | | | 15.6 | 1.3 | 15.6 | 1.3 | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 11,294 | 918 | | | | 15.6 | 1.3 | 15.6 | 1.3 | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 11,294 | 882 | | | | 15.6 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 11,294 | 848 | | | | 15.6 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 11,294 | 816 | | | | 15.6 | 1.1 | 15.6 | 1.1 | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 11,294 | 784 | | | | 15.6 | 1.1 | 15.6 | 1.1 | | | | |
| R71 | 69 | 0.067 | 1.000 | 11,294 | 754 | | | | 15.6 | 1.0 | 15.6 | 1.0 | | | | |
| R72 | 70 | 0.064 | 1.000 | 11,294 | 725 | | | | 15.6 | 1.0 | 15.6 | 1.0 | | | | |
| 合 計 | | | | | 653,467 | 157,301 | 222 | B = 157,523 | 7,857 | 5,509 | 801.8 | 164.2 | 8,659 | C = 5,673 | B/C = 27.8 | B-C = 151,850 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：当面事業)

| | | 水系名:土器川 | | | | | | | | | | | 河川名:土器川 | | (百万円) | | | | | |
|------------|-----|---------|-----------------|----------------|--------|-------|-----------|----------|-------|-------|--------|------|---------|--------------|--------------|-------|------|-----|------|-------|
| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レー ター | 便 益 | | | 費 用 | | | | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | | | |
| | | | | | 便益① | | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | | 維持管理費④ | | ③+④ | | | | | | | |
| | | | | | 便益 | 現在価値 | | | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | 費用 | | | 現在価値 | | | | |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 整備期間 | H21 | -11 | 1.539 | 1.142 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | H22 | -10 | 1.480 | 1.141 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | H23 | -9 | 1.423 | 1.118 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | H24 | -8 | 1.369 | 1.125 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | H25 | -7 | 1.316 | 1.100 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | H26 | -6 | 1.265 | 1.067 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | H27 | -5 | 1.217 | 1.057 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | H28 | -4 | 1.170 | 1.057 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | H29 | -3 | 1.125 | 1.032 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | H30 | -2 | 1.082 | 1.000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| R1 | -1 | 1.040 | 1.000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| 7年 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | | 653 | 653 | 0.0 | 0.0 | 653.0 | 653.0 | | | | | | |
| | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 255 | 245 | | | 388 | 373 | 0.0 | 0.0 | 388.0 | 373.1 | | | | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 255 | 236 | | | 386 | 357 | 0.0 | 0.0 | 386.0 | 356.9 | | | | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 255 | 227 | | | 381 | 339 | 0.0 | 0.0 | 381.0 | 338.7 | | | | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 255 | 218 | | | 372 | 318 | 0.0 | 0.0 | 372.0 | 318.0 | | | | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 255 | 210 | | | 367 | 302 | 0.0 | 0.0 | 367.0 | 301.6 | | | | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 255 | 202 | | | 380 | 300 | 0.0 | 0.0 | 380.0 | 300.3 | | | | | | |
| 施設完成後の評価期間 | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 255 | 194 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 255 | 186 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 255 | 179 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 255 | 172 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 255 | 166 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 255 | 159 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 255 | 153 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 255 | 147 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 255 | 142 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 255 | 136 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 255 | 131 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 255 | 126 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 255 | 121 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 255 | 116 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 255 | 112 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 255 | 108 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 255 | 103 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 255 | 99 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 255 | 96 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 255 | 92 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 255 | 88 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 255 | 85 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 255 | 82 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 255 | 79 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 255 | 76 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 255 | 73 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 255 | 70 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 255 | 67 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 255 | 65 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 255 | 62 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 255 | 60 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 255 | 57 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 255 | 55 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 255 | 53 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 255 | 51 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 255 | 49 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 255 | 47 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 255 | 45 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 255 | 44 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 255 | 42 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 255 | 40 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 255 | 39 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 255 | 37 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 255 | 36 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 255 | 35 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 255 | 33 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 255 | 32 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 255 | 31 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 255 | 29 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 255 | 28 | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 14,280 | 5,666 | 174 | B= | 5,840 | 2,927 | 2,642 | 0.0 | 0.0 | 2,927 | C= | 2,642 | B/C= | 2.2 | B-C= | 3,198 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：全体事業 感度分析 事業費+10%)

| | | 水系名:土器川 | | | | 河川名:土器川 | | | | (百万円) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|--------|--------|--------------|--------------|---------|----|--------|------|------|------|---------|
| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レター | 便 益 | | | 費 用 | | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | | | | | |
| | | | | | 便益① | | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | | 維持管理費④ | | | ③+④ | | | | | | |
| | | | | | 便益 | 現在価値 | | | 費用 | 現在価値 | 費用 | | | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | | | | |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整備期間 32年 | H21 | -11 | 1.539 | 1.142 | 0 | 0 | | | 730 | 1,283 | 0.0 | 0.0 | 730.0 | 1,123.8 | | | | | | |
| | H22 | -10 | 1.480 | 1.141 | 0 | 0 | | | 483 | 816 | 0.0 | 0.0 | 483.0 | 715.0 | | | | | | |
| | H23 | -9 | 1.423 | 1.118 | 0 | 0 | | | 369 | 587 | 0.0 | 0.0 | 369.0 | 525.2 | | | | | | |
| | H24 | -8 | 1.369 | 1.125 | 158 | 216 | | | 967 | 1,488 | 0.1 | 0.1 | 967.1 | 1,323.5 | | | | | | |
| | H25 | -7 | 1.316 | 1.100 | 158 | 208 | | | 694 | 1,005 | 0.1 | 0.1 | 694.1 | 913.4 | | | | | | |
| | H26 | -6 | 1.265 | 1.067 | 158 | 200 | | | 543 | 733 | 0.1 | 0.1 | 543.1 | 687.2 | | | | | | |
| | H27 | -5 | 1.217 | 1.057 | 2,425 | 2,950 | | | 511 | 657 | 0.1 | 0.1 | 511.1 | 621.8 | | | | | | |
| | H28 | -4 | 1.170 | 1.057 | 2,425 | 2,837 | | | 485 | 600 | 0.1 | 0.1 | 485.1 | 567.5 | | | | | | |
| | H29 | -3 | 1.125 | 1.032 | 2,425 | 2,728 | | | 391 | 454 | 0.1 | 0.1 | 391.1 | 439.9 | | | | | | |
| | H30 | -2 | 1.082 | 1.000 | 2,425 | 2,623 | | | 471 | 509 | 0.1 | 0.1 | 471.1 | 509.5 | | | | | | |
| | R1 | -1 | 1.040 | 1.000 | 2,425 | 2,522 | | | 877 | 912 | 0.1 | 0.1 | 877.1 | 912.2 | | | | | | |
| | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5,983 | 5,983 | | | 718 | 718 | 0.2 | 0.2 | 718.2 | 718.2 | | | | | | |
| | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 6,322 | 6,079 | | | 427 | 411 | 0.2 | 0.2 | 427.2 | 410.8 | | | | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 6,322 | 5,845 | | | 425 | 393 | 0.2 | 0.2 | 425.2 | 393.1 | | | | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 6,322 | 5,620 | | | 419 | 372 | 0.2 | 0.2 | 419.2 | 372.7 | | | | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 6,322 | 5,404 | | | 409 | 350 | 0.2 | 0.2 | 409.2 | 349.8 | | | | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 6,322 | 5,196 | | | 404 | 332 | 0.2 | 0.2 | 404.2 | 332.2 | | | | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 6,322 | 4,996 | | | 418 | 330 | 0.2 | 0.2 | 418.2 | 330.5 | | | | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 6,322 | 4,804 | | | 557 | 423 | 0.2 | 0.2 | 557.2 | 423.4 | | | | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 6,322 | 4,619 | | | 684 | 500 | 0.2 | 0.1 | 684.2 | 499.9 | | | | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 6,322 | 4,442 | | | 822 | 578 | 0.2 | 0.1 | 822.2 | 577.7 | | | | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 6,322 | 4,271 | | | 849 | 574 | 0.2 | 0.1 | 849.2 | 573.7 | | | | | | |
| R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 6,322 | 4,107 | | | 404 | 262 | 1.2 | 0.8 | 405.2 | 263.2 | | | | | | | |
| R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 6,322 | 3,949 | | | 433 | 270 | 1.2 | 0.7 | 434.2 | 271.2 | | | | | | | |
| R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 12,085 | 7,258 | | | 305 | 183 | 1.2 | 0.7 | 306.2 | 183.9 | | | | | | | |
| R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 15,200 | 8,778 | | | 325 | 188 | 1.4 | 0.8 | 326.4 | 188.5 | | | | | | | |
| R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 15,200 | 8,440 | | | 304 | 169 | 1.4 | 0.8 | 305.4 | 169.6 | | | | | | | |
| R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 15,438 | 8,242 | | | 325 | 174 | 2.8 | 1.5 | 327.8 | 175.0 | | | | | | | |
| R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 15,438 | 7,925 | | | 320 | 164 | 2.8 | 1.4 | 322.8 | 165.7 | | | | | | | |
| R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 15,438 | 7,621 | | | 320 | 158 | 2.8 | 1.4 | 322.8 | 159.3 | | | | | | | |
| R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 15,493 | 7,354 | | | 248 | 118 | 4.2 | 2.0 | 252.2 | 119.7 | | | | | | | |
| R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 15,493 | 7,071 | | | 248 | 113 | 4.2 | 1.9 | 252.2 | 115.1 | | | | | | | |
| 施設完成後の 評価期間 50年 | R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 15,797 | 6,932 | | | | | 15.8 | 6.9 | 15.8 | 6.9 | | | | | | |
| | R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 15,797 | 6,666 | | | | | 15.8 | 6.7 | 15.8 | 6.7 | | | | | | |
| | R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 15,797 | 6,409 | | | | | 15.8 | 6.4 | 15.8 | 6.4 | | | | | | |
| | R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 15,797 | 6,163 | | | | | 15.8 | 6.2 | 15.8 | 6.2 | | | | | | |
| | R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 15,797 | 5,926 | | | | | 15.8 | 5.9 | 15.8 | 5.9 | | | | | | |
| | R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 15,797 | 5,698 | | | | | 15.8 | 5.7 | 15.8 | 5.7 | | | | | | |
| | R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 15,797 | 5,479 | | | | | 15.8 | 5.5 | 15.8 | 5.5 | | | | | | |
| | R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 15,797 | 5,268 | | | | | 15.8 | 5.3 | 15.8 | 5.3 | | | | | | |
| | R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 15,797 | 5,065 | | | | | 15.8 | 5.1 | 15.8 | 5.1 | | | | | | |
| | R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 15,797 | 4,871 | | | | | 15.8 | 4.9 | 15.8 | 4.9 | | | | | | |
| | R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 15,797 | 4,683 | | | | | 15.8 | 4.7 | 15.8 | 4.7 | | | | | | |
| | R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 15,797 | 4,503 | | | | | 15.8 | 4.5 | 15.8 | 4.5 | | | | | | |
| | R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 15,797 | 4,330 | | | | | 15.8 | 4.3 | 15.8 | 4.3 | | | | | | |
| | R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 15,797 | 4,163 | | | | | 15.8 | 4.2 | 15.8 | 4.2 | | | | | | |
| | R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 15,797 | 4,003 | | | | | 15.8 | 4.0 | 15.8 | 4.0 | | | | | | |
| | R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 15,797 | 3,849 | | | | | 15.8 | 3.8 | 15.8 | 3.8 | | | | | | |
| | R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 15,797 | 3,701 | | | | | 15.8 | 3.7 | 15.8 | 3.7 | | | | | | |
| | R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 15,797 | 3,559 | | | | | 15.8 | 3.6 | 15.8 | 3.6 | | | | | | |
| | R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 15,797 | 3,422 | | | | | 15.8 | 3.4 | 15.8 | 3.4 | | | | | | |
| | R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 15,797 | 3,290 | | | | | 15.8 | 3.3 | 15.8 | 3.3 | | | | | | |
| | R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 15,797 | 3,164 | | | | | 15.8 | 3.2 | 15.8 | 3.2 | | | | | | |
| | R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 15,797 | 3,042 | | | | | 15.8 | 3.0 | 15.8 | 3.0 | | | | | | |
| | R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 15,797 | 2,925 | | | | | 15.8 | 2.9 | 15.8 | 2.9 | | | | | | |
| | R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 15,797 | 2,813 | | | | | 15.8 | 2.8 | 15.8 | 2.8 | | | | | | |
| | R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 15,797 | 2,704 | | | | | 15.8 | 2.7 | 15.8 | 2.7 | | | | | | |
| | R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 15,797 | 2,600 | | | | | 15.8 | 2.6 | 15.8 | 2.6 | | | | | | |
| | R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 15,797 | 2,500 | | | | | 15.8 | 2.5 | 15.8 | 2.5 | | | | | | |
| | R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 15,797 | 2,404 | | | | | 15.8 | 2.4 | 15.8 | 2.4 | | | | | | |
| | R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 15,797 | 2,312 | | | | | 15.8 | 2.3 | 15.8 | 2.3 | | | | | | |
| | R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 15,797 | 2,223 | | | | | 15.8 | 2.2 | 15.8 | 2.2 | | | | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 15,797 | 2,137 | | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 15,797 | 2,055 | | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 15,797 | 1,976 | | | | | 15.8 | 2.0 | 15.8 | 2.0 | | | | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 15,797 | 1,900 | | | | | 15.8 | 1.9 | 15.8 | 1.9 | | | | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 15,797 | 1,827 | | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 15,797 | 1,757 | | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 15,797 | 1,689 | | | | | 15.8 | 1.7 | 15.8 | 1.7 | | | | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 15,797 | 1,624 | | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 15,797 | 1,562 | | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 15,797 | 1,502 | | | | | 15.8 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | | | | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 15,797 | 1,444 | | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 15,797 | 1,388 | | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 15,797 | 1,335 | | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 15,797 | 1,284 | | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 15,797 | 1,234 | | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 15,797 | 1,187 | | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 15,797 | 1,141 | | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 15,797 | 1,097 | | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | | | | |
| R71 | 69 | 0.067 | 1.000 | 15,797 | 1,055 | | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | | | | |
| R72 | 70 | 0.064 | 1.000 | 15,797 | 1,014 | | | | | 15.8 | 1.0 | 15.8 | 1.0 | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 1,004,081 | 297,163 | 263 | B= | 297,426 | 15,885 | 15,824 | 816.2 | 169.6 | 16,701 | C= | 15,994 | B/C= | 18.6 | B-C= | 281,432 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：全体事業 感度分析 事業費-10%)

| | | 水系名：土器川 | | | | 河川名：土器川 | | | | (百万円) | | | | | | |
|-------------|-----|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レター | 便 益 | | | 費 用 | | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | |
| | | | | | 便益① | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | | 維持管理費④ | | | | ③+④ | | |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 便益 | 現在価値 | | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | | | |
| 整備期間 32年 | H21 | -11 | 1.539 | 1.142 | 0 | 0 | | 730 | 1,283 | 0.0 | 0.0 | 730.0 | 1,123.8 | | | |
| | H22 | -10 | 1.480 | 1.141 | 0 | 0 | | 483 | 816 | 0.0 | 0.0 | 483.0 | 715.0 | | | |
| | H23 | -9 | 1.423 | 1.118 | 0 | 0 | | 369 | 587 | 0.0 | 0.0 | 369.0 | 525.2 | | | |
| | H24 | -8 | 1.369 | 1.125 | 158 | 216 | | 967 | 1,488 | 0.1 | 0.1 | 967.1 | 1,323.5 | | | |
| | H25 | -7 | 1.316 | 1.100 | 158 | 208 | | 694 | 1,005 | 0.1 | 0.1 | 694.1 | 913.4 | | | |
| | H26 | -6 | 1.265 | 1.067 | 158 | 200 | | 543 | 733 | 0.1 | 0.1 | 543.1 | 687.2 | | | |
| | H27 | -5 | 1.217 | 1.057 | 2,425 | 2,950 | | 511 | 657 | 0.1 | 0.1 | 511.1 | 621.8 | | | |
| | H28 | -4 | 1.170 | 1.057 | 2,425 | 2,837 | | 485 | 600 | 0.1 | 0.1 | 485.1 | 567.5 | | | |
| | H29 | -3 | 1.125 | 1.032 | 2,425 | 2,728 | | 391 | 454 | 0.1 | 0.1 | 391.1 | 439.9 | | | |
| | H30 | -2 | 1.082 | 1.000 | 2,425 | 2,623 | | 471 | 509 | 0.1 | 0.1 | 471.1 | 509.5 | | | |
| | R1 | -1 | 1.040 | 1.000 | 2,425 | 2,522 | | 877 | 912 | 0.1 | 0.1 | 877.1 | 912.2 | | | |
| | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5,983 | 5,983 | | 588 | 588 | 0.2 | 0.2 | 588.2 | 588.2 | | | |
| | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 6,322 | 6,079 | | 349 | 336 | 0.2 | 0.2 | 349.2 | 335.8 | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 6,322 | 5,845 | | 347 | 321 | 0.2 | 0.2 | 347.2 | 321.0 | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 6,322 | 5,620 | | 343 | 305 | 0.2 | 0.2 | 343.2 | 305.1 | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 6,322 | 5,404 | | 335 | 286 | 0.2 | 0.2 | 335.2 | 286.5 | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 6,322 | 5,196 | | 330 | 271 | 0.2 | 0.2 | 330.2 | 271.4 | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 6,322 | 4,996 | | 342 | 270 | 0.2 | 0.2 | 342.2 | 270.4 | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 6,322 | 4,804 | | 455 | 346 | 0.2 | 0.2 | 455.2 | 345.9 | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 6,322 | 4,619 | | 560 | 409 | 0.2 | 0.1 | 560.2 | 409.3 | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 6,322 | 4,442 | | 672 | 472 | 0.2 | 0.1 | 672.2 | 472.3 | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 6,322 | 4,271 | | 695 | 470 | 0.2 | 0.1 | 695.2 | 469.7 | | | |
| R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 6,322 | 4,107 | | 330 | 214 | 1.2 | 0.8 | 331.2 | 215.1 | | | | |
| R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 6,322 | 3,949 | | 355 | 222 | 1.2 | 0.7 | 356.2 | 222.5 | | | | |
| R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 12,085 | 7,258 | | 249 | 150 | 1.2 | 0.7 | 250.2 | 150.3 | | | | |
| R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 15,200 | 8,778 | | 266 | 154 | 1.4 | 0.8 | 267.4 | 154.4 | | | | |
| R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 15,200 | 8,440 | | 248 | 138 | 1.4 | 0.8 | 249.4 | 138.5 | | | | |
| R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 15,438 | 8,242 | | 266 | 142 | 2.8 | 1.5 | 268.8 | 143.5 | | | | |
| R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 15,438 | 7,925 | | 262 | 135 | 2.8 | 1.4 | 264.8 | 135.9 | | | | |
| R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 15,438 | 7,621 | | 262 | 129 | 2.8 | 1.4 | 264.8 | 130.7 | | | | |
| R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 15,493 | 7,354 | | 203 | 96 | 4.2 | 2.0 | 207.2 | 98.3 | | | | |
| R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 15,493 | 7,071 | | 203 | 93 | 4.2 | 1.9 | 207.2 | 94.6 | | | | |
| R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 15,797 | 6,932 | | | | 15.8 | 6.9 | 15.8 | 6.9 | | | | |
| R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 15,797 | 6,666 | | | | 15.8 | 6.7 | 15.8 | 6.7 | | | | |
| R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 15,797 | 6,409 | | | | 15.8 | 6.4 | 15.8 | 6.4 | | | | |
| R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 15,797 | 6,163 | | | | 15.8 | 6.2 | 15.8 | 6.2 | | | | |
| R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 15,797 | 5,926 | | | | 15.8 | 5.9 | 15.8 | 5.9 | | | | |
| R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 15,797 | 5,698 | | | | 15.8 | 5.7 | 15.8 | 5.7 | | | | |
| R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 15,797 | 5,479 | | | | 15.8 | 5.5 | 15.8 | 5.5 | | | | |
| R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 15,797 | 5,268 | | | | 15.8 | 5.3 | 15.8 | 5.3 | | | | |
| R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 15,797 | 5,065 | | | | 15.8 | 5.1 | 15.8 | 5.1 | | | | |
| R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 15,797 | 4,871 | | | | 15.8 | 4.9 | 15.8 | 4.9 | | | | |
| R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 15,797 | 4,683 | | | | 15.8 | 4.7 | 15.8 | 4.7 | | | | |
| R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 15,797 | 4,503 | | | | 15.8 | 4.5 | 15.8 | 4.5 | | | | |
| R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 15,797 | 4,330 | | | | 15.8 | 4.3 | 15.8 | 4.3 | | | | |
| R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 15,797 | 4,163 | | | | 15.8 | 4.2 | 15.8 | 4.2 | | | | |
| R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 15,797 | 4,003 | | | | 15.8 | 4.0 | 15.8 | 4.0 | | | | |
| R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 15,797 | 3,849 | | | | 15.8 | 3.8 | 15.8 | 3.8 | | | | |
| R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 15,797 | 3,701 | | | | 15.8 | 3.7 | 15.8 | 3.7 | | | | |
| R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 15,797 | 3,559 | | | | 15.8 | 3.6 | 15.8 | 3.6 | | | | |
| R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 15,797 | 3,422 | | | | 15.8 | 3.4 | 15.8 | 3.4 | | | | |
| R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 15,797 | 3,290 | | | | 15.8 | 3.3 | 15.8 | 3.3 | | | | |
| R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 15,797 | 3,164 | | | | 15.8 | 3.2 | 15.8 | 3.2 | | | | |
| R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 15,797 | 3,042 | | | | 15.8 | 3.0 | 15.8 | 3.0 | | | | |
| R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 15,797 | 2,925 | | | | 15.8 | 2.9 | 15.8 | 2.9 | | | | |
| R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 15,797 | 2,813 | | | | 15.8 | 2.8 | 15.8 | 2.8 | | | | |
| R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 15,797 | 2,704 | | | | 15.8 | 2.7 | 15.8 | 2.7 | | | | |
| R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 15,797 | 2,600 | | | | 15.8 | 2.6 | 15.8 | 2.6 | | | | |
| R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 15,797 | 2,500 | | | | 15.8 | 2.5 | 15.8 | 2.5 | | | | |
| R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 15,797 | 2,404 | | | | 15.8 | 2.4 | 15.8 | 2.4 | | | | |
| R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 15,797 | 2,312 | | | | 15.8 | 2.3 | 15.8 | 2.3 | | | | |
| R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 15,797 | 2,223 | | | | 15.8 | 2.2 | 15.8 | 2.2 | | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 15,797 | 2,137 | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 15,797 | 2,055 | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 15,797 | 1,976 | | | | 15.8 | 2.0 | 15.8 | 2.0 | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 15,797 | 1,900 | | | | 15.8 | 1.9 | 15.8 | 1.9 | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 15,797 | 1,827 | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 15,797 | 1,757 | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 15,797 | 1,689 | | | | 15.8 | 1.7 | 15.8 | 1.7 | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 15,797 | 1,624 | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 15,797 | 1,562 | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 15,797 | 1,502 | | | | 15.8 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 15,797 | 1,444 | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 15,797 | 1,388 | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 15,797 | 1,335 | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 15,797 | 1,284 | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 15,797 | 1,234 | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 15,797 | 1,187 | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 15,797 | 1,141 | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 15,797 | 1,097 | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | |
| R71 | 69 | 0.067 | 1.000 | 15,797 | 1,055 | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | |
| R72 | 70 | 0.064 | 1.000 | 15,797 | 1,014 | | | | 15.8 | 1.0 | 15.8 | 1.0 | | | | |
| 合 計 | | | | | 1,004,081 | 297,163 | | B= 297,378 | 14,181 | 14,591 | 816.2 | 169.6 | 14,997 | C= 14,761 | B/C= 20.1 | B-C= 282,617 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：全体事業 感度分析 資産+10%)

| | | 水系名：土器川 | | | | 河川名：土器川 | | | | (百万円) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---------|-----------------|----------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|--------|--------|--------------|--------------|---------|----|--------|------|------|------|---------|
| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レー ター | 便 益 | | | 費 用 | | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | | | | | |
| | | | | | 便益① | | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | | 維持管理費④ | | | ③+④ | | | | | | |
| | | | | | 便益 | 現在価値 | | | 費用 | 現在価値 | 費用 | | | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | | | | |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整備期間 32年 | H21 | -11 | 1.539 | 1.142 | 0 | 0 | | | 730 | 1,284 | 0.0 | 0.0 | 730.2 | 1,124.1 | | | | | | |
| | H22 | -10 | 1.480 | 1.141 | 0 | 0 | | | 483 | 815 | 0.0 | 0.0 | 482.8 | 714.7 | | | | | | |
| | H23 | -9 | 1.423 | 1.118 | 0 | 0 | | | 369 | 587 | 0.0 | 0.0 | 369.0 | 525.2 | | | | | | |
| | H24 | -8 | 1.369 | 1.125 | 174 | 238 | | | 967 | 1,488 | 0.1 | 0.1 | 966.8 | 1,323.1 | | | | | | |
| | H25 | -7 | 1.316 | 1.100 | 174 | 229 | | | 694 | 1,005 | 0.1 | 0.1 | 694.5 | 913.9 | | | | | | |
| | H26 | -6 | 1.265 | 1.067 | 174 | 220 | | | 543 | 732 | 0.1 | 0.1 | 542.6 | 686.6 | | | | | | |
| | H27 | -5 | 1.217 | 1.057 | 2,655 | 3,230 | | | 511 | 657 | 0.1 | 0.1 | 511.1 | 621.8 | | | | | | |
| | H28 | -4 | 1.170 | 1.057 | 2,655 | 3,106 | | | 485 | 600 | 0.1 | 0.1 | 485.5 | 568.0 | | | | | | |
| | H29 | -3 | 1.125 | 1.032 | 2,655 | 2,987 | | | 391 | 454 | 0.1 | 0.1 | 390.8 | 439.6 | | | | | | |
| | H30 | -2 | 1.082 | 1.000 | 2,655 | 2,872 | | | 471 | 510 | 0.1 | 0.1 | 471.5 | 510.0 | | | | | | |
| | R1 | -1 | 1.040 | 1.000 | 2,655 | 2,761 | | | 877 | 912 | 0.1 | 0.1 | 876.7 | 911.8 | | | | | | |
| | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 6,552 | 6,552 | | | 653 | 653 | 0.2 | 0.2 | 653.2 | 653.2 | | | | | | |
| | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 6,920 | 6,654 | | | 388 | 373 | 0.2 | 0.2 | 388.2 | 373.3 | | | | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 6,920 | 6,398 | | | 386 | 357 | 0.2 | 0.2 | 386.2 | 357.1 | | | | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 6,920 | 6,152 | | | 381 | 339 | 0.2 | 0.2 | 381.2 | 338.9 | | | | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 6,920 | 5,915 | | | 372 | 318 | 0.2 | 0.2 | 372.2 | 318.2 | | | | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 6,920 | 5,688 | | | 367 | 302 | 0.2 | 0.2 | 367.2 | 301.8 | | | | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 6,920 | 5,469 | | | 380 | 300 | 0.2 | 0.2 | 380.2 | 300.5 | | | | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 6,920 | 5,259 | | | 506 | 385 | 0.2 | 0.2 | 506.2 | 384.7 | | | | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 6,920 | 5,056 | | | 622 | 454 | 0.2 | 0.1 | 622.2 | 454.6 | | | | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 6,920 | 4,862 | | | 747 | 525 | 0.2 | 0.1 | 747.2 | 525.0 | | | | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 6,920 | 4,675 | | | 772 | 522 | 0.2 | 0.1 | 772.2 | 521.7 | | | | | | |
| R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 6,920 | 4,495 | | | 367 | 238 | 1.2 | 0.8 | 368.2 | 239.2 | | | | | | | |
| R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 6,920 | 4,322 | | | 394 | 246 | 1.2 | 0.7 | 395.2 | 246.8 | | | | | | | |
| R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 13,227 | 7,944 | | | 277 | 166 | 1.2 | 0.7 | 278.2 | 167.1 | | | | | | | |
| R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 16,632 | 9,605 | | | 295 | 170 | 1.4 | 0.8 | 296.4 | 171.2 | | | | | | | |
| R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 16,632 | 9,235 | | | 276 | 153 | 1.4 | 0.8 | 277.4 | 154.0 | | | | | | | |
| R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 16,895 | 9,020 | | | 295 | 158 | 2.8 | 1.5 | 297.8 | 159.0 | | | | | | | |
| R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 16,895 | 8,673 | | | 291 | 149 | 2.8 | 1.4 | 293.8 | 150.8 | | | | | | | |
| R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 16,895 | 8,340 | | | 291 | 144 | 2.8 | 1.4 | 293.8 | 145.0 | | | | | | | |
| R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 16,956 | 8,048 | | | 225 | 107 | 4.2 | 2.0 | 228.7 | 108.6 | | | | | | | |
| R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 16,956 | 7,738 | | | 225 | 102 | 4.2 | 1.9 | 228.7 | 104.4 | | | | | | | |
| 施設完成後の 評価期間 50年 | R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 17,289 | 7,587 | | | | | 15.8 | 6.9 | 15.8 | 6.9 | | | | | | |
| | R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 17,289 | 7,295 | | | | | 15.8 | 6.7 | 15.8 | 6.7 | | | | | | |
| | R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 17,289 | 7,015 | | | | | 15.8 | 6.4 | 15.8 | 6.4 | | | | | | |
| | R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 17,289 | 6,745 | | | | | 15.8 | 6.2 | 15.8 | 6.2 | | | | | | |
| | R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 17,289 | 6,485 | | | | | 15.8 | 5.9 | 15.8 | 5.9 | | | | | | |
| | R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 17,289 | 6,236 | | | | | 15.8 | 5.7 | 15.8 | 5.7 | | | | | | |
| | R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 17,289 | 5,996 | | | | | 15.8 | 5.5 | 15.8 | 5.5 | | | | | | |
| | R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 17,289 | 5,765 | | | | | 15.8 | 5.3 | 15.8 | 5.3 | | | | | | |
| | R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 17,289 | 5,544 | | | | | 15.8 | 5.1 | 15.8 | 5.1 | | | | | | |
| | R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 17,289 | 5,331 | | | | | 15.8 | 4.9 | 15.8 | 4.9 | | | | | | |
| | R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 17,289 | 5,126 | | | | | 15.8 | 4.7 | 15.8 | 4.7 | | | | | | |
| | R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 17,289 | 4,928 | | | | | 15.8 | 4.5 | 15.8 | 4.5 | | | | | | |
| | R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 17,289 | 4,739 | | | | | 15.8 | 4.3 | 15.8 | 4.3 | | | | | | |
| | R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 17,289 | 4,557 | | | | | 15.8 | 4.2 | 15.8 | 4.2 | | | | | | |
| | R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 17,289 | 4,381 | | | | | 15.8 | 4.0 | 15.8 | 4.0 | | | | | | |
| | R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 17,289 | 4,213 | | | | | 15.8 | 3.8 | 15.8 | 3.8 | | | | | | |
| | R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 17,289 | 4,051 | | | | | 15.8 | 3.7 | 15.8 | 3.7 | | | | | | |
| | R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 17,289 | 3,895 | | | | | 15.8 | 3.6 | 15.8 | 3.6 | | | | | | |
| | R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 17,289 | 3,745 | | | | | 15.8 | 3.4 | 15.8 | 3.4 | | | | | | |
| | R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 17,289 | 3,601 | | | | | 15.8 | 3.3 | 15.8 | 3.3 | | | | | | |
| | R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 17,289 | 3,463 | | | | | 15.8 | 3.2 | 15.8 | 3.2 | | | | | | |
| | R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 17,289 | 3,329 | | | | | 15.8 | 3.0 | 15.8 | 3.0 | | | | | | |
| | R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 17,289 | 3,201 | | | | | 15.8 | 2.9 | 15.8 | 2.9 | | | | | | |
| | R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 17,289 | 3,078 | | | | | 15.8 | 2.8 | 15.8 | 2.8 | | | | | | |
| | R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 17,289 | 2,960 | | | | | 15.8 | 2.7 | 15.8 | 2.7 | | | | | | |
| | R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 17,289 | 2,846 | | | | | 15.8 | 2.6 | 15.8 | 2.6 | | | | | | |
| | R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 17,289 | 2,737 | | | | | 15.8 | 2.5 | 15.8 | 2.5 | | | | | | |
| | R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 17,289 | 2,631 | | | | | 15.8 | 2.4 | 15.8 | 2.4 | | | | | | |
| | R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 17,289 | 2,530 | | | | | 15.8 | 2.3 | 15.8 | 2.3 | | | | | | |
| | R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 17,289 | 2,433 | | | | | 15.8 | 2.2 | 15.8 | 2.2 | | | | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 17,289 | 2,339 | | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 17,289 | 2,249 | | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 17,289 | 2,163 | | | | | 15.8 | 2.0 | 15.8 | 2.0 | | | | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 17,289 | 2,080 | | | | | 15.8 | 1.9 | 15.8 | 1.9 | | | | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 17,289 | 2,000 | | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 17,289 | 1,923 | | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 17,289 | 1,849 | | | | | 15.8 | 1.7 | 15.8 | 1.7 | | | | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 17,289 | 1,778 | | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 17,289 | 1,709 | | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 17,289 | 1,643 | | | | | 15.8 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | | | | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 17,289 | 1,580 | | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 17,289 | 1,520 | | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 17,289 | 1,461 | | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 17,289 | 1,405 | | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 17,289 | 1,351 | | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 17,289 | 1,299 | | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 17,289 | 1,249 | | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 17,289 | 1,201 | | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | | | | |
| R71 | 69 | 0.067 | 1.000 | 17,289 | 1,155 | | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | | | | |
| R72 | 70 | 0.064 | 1.000 | 17,289 | 1,110 | | | | | 15.8 | 1.0 | 15.8 | 1.0 | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 1,098,927 | 325,250 | 239 | B= | 325,489 | 15,030 | 15,205 | 816.2 | 169.6 | 15,846 | C= | 15,375 | B/C= | 21.2 | B-C= | 310,114 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：全体事業 感度分析 資産-10%)

| | | 水系名：土器川 | | | | 河川名：土器川 | | | | (百万円) | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|---------|-----------------|-----------|---------|-----------|----------|------|---------|--------|--------|--------------|--------------|--------|----|--------|------|------|------|---------|
| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レター | 便 益 | | | 費 用 | | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | | | | | |
| | | | | | 便益① | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | | 維持管理費④ | | | | ③+④ | | | | | | |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 便益 | 現在価値 | | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | | | | | | | |
| 整備期間 32年 | H21 | -11 | 1.539 | 1.142 | 0 | 0 | | 730 | 1,284 | 0.0 | 0.0 | 730.2 | 1,124.1 | | | | | | | |
| | H22 | -10 | 1.480 | 1.141 | 0 | 0 | | 483 | 815 | 0.0 | 0.0 | 482.8 | 714.7 | | | | | | | |
| | H23 | -9 | 1.423 | 1.118 | 0 | 0 | | 369 | 587 | 0.0 | 0.0 | 369.0 | 525.2 | | | | | | | |
| | H24 | -8 | 1.369 | 1.125 | 144 | 197 | | 967 | 1,488 | 0.1 | 0.1 | 966.8 | 1,323.1 | | | | | | | |
| | H25 | -7 | 1.316 | 1.100 | 144 | 189 | | 694 | 1,005 | 0.1 | 0.1 | 694.5 | 913.9 | | | | | | | |
| | H26 | -6 | 1.265 | 1.067 | 144 | 182 | | 543 | 732 | 0.1 | 0.1 | 542.6 | 686.6 | | | | | | | |
| | H27 | -5 | 1.217 | 1.057 | 2,196 | 2,672 | | 511 | 657 | 0.1 | 0.1 | 511.1 | 621.8 | | | | | | | |
| | H28 | -4 | 1.170 | 1.057 | 2,196 | 2,569 | | 485 | 600 | 0.1 | 0.1 | 485.5 | 568.0 | | | | | | | |
| | H29 | -3 | 1.125 | 1.032 | 2,196 | 2,470 | | 391 | 454 | 0.1 | 0.1 | 390.8 | 439.6 | | | | | | | |
| | H30 | -2 | 1.082 | 1.000 | 2,196 | 2,375 | | 471 | 510 | 0.1 | 0.1 | 471.5 | 510.0 | | | | | | | |
| | R1 | -1 | 1.040 | 1.000 | 2,196 | 2,284 | | 877 | 912 | 0.1 | 0.1 | 876.7 | 911.8 | | | | | | | |
| | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5,417 | 5,417 | | 653 | 653 | 0.2 | 0.2 | 653.2 | 653.2 | | | | | | | |
| | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 5,722 | 5,502 | | 388 | 373 | 0.2 | 0.2 | 388.2 | 373.3 | | | | | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 5,722 | 5,290 | | 386 | 357 | 0.2 | 0.2 | 386.2 | 357.1 | | | | | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 5,722 | 5,087 | | 381 | 339 | 0.2 | 0.2 | 381.2 | 338.9 | | | | | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 5,722 | 4,891 | | 372 | 318 | 0.2 | 0.2 | 372.2 | 318.2 | | | | | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 5,722 | 4,703 | | 367 | 302 | 0.2 | 0.2 | 367.2 | 301.8 | | | | | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 5,722 | 4,522 | | 380 | 300 | 0.2 | 0.2 | 380.2 | 300.5 | | | | | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 5,722 | 4,348 | | 506 | 385 | 0.2 | 0.2 | 506.2 | 384.7 | | | | | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 5,722 | 4,181 | | 622 | 454 | 0.2 | 0.1 | 622.2 | 454.6 | | | | | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 5,722 | 4,020 | | 747 | 525 | 0.2 | 0.1 | 747.2 | 525.0 | | | | | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 5,722 | 3,866 | | 772 | 522 | 0.2 | 0.1 | 772.2 | 521.7 | | | | | | | |
| R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 5,722 | 3,717 | | 367 | 238 | 1.2 | 0.8 | 368.2 | 239.2 | | | | | | | | |
| R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 5,722 | 3,574 | | 394 | 246 | 1.2 | 0.7 | 395.2 | 246.8 | | | | | | | | |
| R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 10,943 | 6,572 | | 277 | 166 | 1.2 | 0.7 | 278.2 | 167.1 | | | | | | | | |
| R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 13,766 | 7,950 | | 295 | 170 | 1.4 | 0.8 | 296.4 | 171.2 | | | | | | | | |
| R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 13,766 | 7,644 | | 276 | 153 | 1.4 | 0.8 | 277.4 | 154.0 | | | | | | | | |
| R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 13,983 | 7,466 | | 295 | 158 | 2.8 | 1.5 | 297.8 | 159.0 | | | | | | | | |
| R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 13,983 | 7,178 | | 291 | 149 | 2.8 | 1.4 | 293.8 | 150.8 | | | | | | | | |
| R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 13,983 | 6,902 | | 291 | 144 | 2.8 | 1.4 | 293.8 | 145.0 | | | | | | | | |
| R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 14,032 | 6,660 | | 225 | 107 | 4.2 | 2.0 | 228.7 | 108.6 | | | | | | | | |
| R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 14,032 | 6,404 | | 225 | 102 | 4.2 | 1.9 | 228.7 | 104.4 | | | | | | | | |
| R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 14,307 | 6,278 | | | | | 15.8 | 6.9 | 15.8 | 6.9 | | | | | | | |
| R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 14,307 | 6,037 | | | | | 15.8 | 6.7 | 15.8 | 6.7 | | | | | | | |
| R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 14,307 | 5,805 | | | | | 15.8 | 6.4 | 15.8 | 6.4 | | | | | | | |
| R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 14,307 | 5,581 | | | | | 15.8 | 6.2 | 15.8 | 6.2 | | | | | | | |
| R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 14,307 | 5,367 | | | | | 15.8 | 5.9 | 15.8 | 5.9 | | | | | | | |
| R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 14,307 | 5,160 | | | | | 15.8 | 5.7 | 15.8 | 5.7 | | | | | | | |
| R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 14,307 | 4,962 | | | | | 15.8 | 5.5 | 15.8 | 5.5 | | | | | | | |
| R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 14,307 | 4,771 | | | | | 15.8 | 5.3 | 15.8 | 5.3 | | | | | | | |
| R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 14,307 | 4,588 | | | | | 15.8 | 5.1 | 15.8 | 5.1 | | | | | | | |
| R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 14,307 | 4,411 | | | | | 15.8 | 4.9 | 15.8 | 4.9 | | | | | | | |
| R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 14,307 | 4,241 | | | | | 15.8 | 4.7 | 15.8 | 4.7 | | | | | | | |
| R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 14,307 | 4,078 | | | | | 15.8 | 4.5 | 15.8 | 4.5 | | | | | | | |
| R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 14,307 | 3,921 | | | | | 15.8 | 4.3 | 15.8 | 4.3 | | | | | | | |
| R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 14,307 | 3,771 | | | | | 15.8 | 4.2 | 15.8 | 4.2 | | | | | | | |
| R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 14,307 | 3,626 | | | | | 15.8 | 4.0 | 15.8 | 4.0 | | | | | | | |
| R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 14,307 | 3,486 | | | | | 15.8 | 3.8 | 15.8 | 3.8 | | | | | | | |
| R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 14,307 | 3,352 | | | | | 15.8 | 3.7 | 15.8 | 3.7 | | | | | | | |
| R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 14,307 | 3,223 | | | | | 15.8 | 3.6 | 15.8 | 3.6 | | | | | | | |
| R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 14,307 | 3,099 | | | | | 15.8 | 3.4 | 15.8 | 3.4 | | | | | | | |
| R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 14,307 | 2,980 | | | | | 15.8 | 3.3 | 15.8 | 3.3 | | | | | | | |
| R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 14,307 | 2,865 | | | | | 15.8 | 3.2 | 15.8 | 3.2 | | | | | | | |
| R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 14,307 | 2,755 | | | | | 15.8 | 3.0 | 15.8 | 3.0 | | | | | | | |
| R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 14,307 | 2,649 | | | | | 15.8 | 2.9 | 15.8 | 2.9 | | | | | | | |
| R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 14,307 | 2,547 | | | | | 15.8 | 2.8 | 15.8 | 2.8 | | | | | | | |
| R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 14,307 | 2,449 | | | | | 15.8 | 2.7 | 15.8 | 2.7 | | | | | | | |
| R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 14,307 | 2,355 | | | | | 15.8 | 2.6 | 15.8 | 2.6 | | | | | | | |
| R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 14,307 | 2,265 | | | | | 15.8 | 2.5 | 15.8 | 2.5 | | | | | | | |
| R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 14,307 | 2,177 | | | | | 15.8 | 2.4 | 15.8 | 2.4 | | | | | | | |
| R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 14,307 | 2,094 | | | | | 15.8 | 2.3 | 15.8 | 2.3 | | | | | | | |
| R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 14,307 | 2,013 | | | | | 15.8 | 2.2 | 15.8 | 2.2 | | | | | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 14,307 | 1,936 | | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 14,307 | 1,861 | | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 14,307 | 1,790 | | | | | 15.8 | 2.0 | 15.8 | 2.0 | | | | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 14,307 | 1,721 | | | | | 15.8 | 1.9 | 15.8 | 1.9 | | | | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 14,307 | 1,655 | | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 14,307 | 1,591 | | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 14,307 | 1,530 | | | | | 15.8 | 1.7 | 15.8 | 1.7 | | | | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 14,307 | 1,471 | | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 14,307 | 1,414 | | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 14,307 | 1,360 | | | | | 15.8 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | | | | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 14,307 | 1,308 | | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 14,307 | 1,257 | | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 14,307 | 1,209 | | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 14,307 | 1,163 | | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 14,307 | 1,118 | | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 14,307 | 1,075 | | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 14,307 | 1,034 | | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 14,307 | 994 | | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | | | | |
| R71 | 69 | 0.067 | 1.000 | 14,307 | 956 | | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | | | | |
| R72 | 70 | 0.064 | 1.000 | 14,307 | 919 | | | | | 15.8 | 1.0 | 15.8 | 1.0 | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 909,331 | 269,100 | 239 | B= | 269,339 | 15,030 | 15,205 | 816.2 | 169.6 | 15,846 | C= | 15,375 | B/C= | 17.5 | B-C= | 253,964 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：全体事業 感度分析 工期+10%)

| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レー ター | 便 益 | | | 費 用 | | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | |
|-------------|-----|-------|-----------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 便益① | | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | | 維持管理費④ | | | ③+④ | | |
| | | | | | 便益 | 現在価値 | | | 費用 | 現在価値 | 費用 | | | 現在価値 | 費用 | 現在価値 |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 整備期間 34年 | H21 | -11 | 1.539 | 1.142 | 0 | 0 | | 730 | 1,284 | 0.0 | 0.0 | 730.2 | 1,124.1 | | | |
| | H22 | -10 | 1.480 | 1.141 | 0 | 0 | | 483 | 815 | 0.0 | 0.0 | 482.8 | 714.7 | | | |
| | H23 | -9 | 1.423 | 1.118 | 0 | 0 | | 369 | 587 | 0.0 | 0.0 | 369.0 | 525.2 | | | |
| | H24 | -8 | 1.369 | 1.125 | 158 | 216 | | 967 | 1,488 | 0.1 | 0.1 | 966.8 | 1,323.1 | | | |
| | H25 | -7 | 1.316 | 1.100 | 158 | 208 | | 694 | 1,005 | 0.1 | 0.1 | 694.5 | 913.9 | | | |
| | H26 | -6 | 1.265 | 1.067 | 158 | 200 | | 543 | 732 | 0.1 | 0.1 | 542.6 | 686.6 | | | |
| | H27 | -5 | 1.217 | 1.057 | 2,425 | 2,950 | | 511 | 657 | 0.1 | 0.1 | 511.1 | 621.8 | | | |
| | H28 | -4 | 1.170 | 1.057 | 2,425 | 2,837 | | 485 | 600 | 0.1 | 0.1 | 485.5 | 568.0 | | | |
| | H29 | -3 | 1.125 | 1.032 | 2,425 | 2,728 | | 391 | 454 | 0.1 | 0.1 | 390.8 | 439.6 | | | |
| | H30 | -2 | 1.082 | 1.000 | 2,425 | 2,623 | | 471 | 510 | 0.1 | 0.1 | 471.5 | 510.0 | | | |
| | R1 | -1 | 1.040 | 1.000 | 2,425 | 2,522 | | 877 | 912 | 0.1 | 0.1 | 876.7 | 911.8 | | | |
| | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5,983 | 5,983 | | 653 | 653 | 0.2 | 0.2 | 653.2 | 653.2 | | | |
| | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 6,322 | 6,079 | | 353 | 339 | 0.2 | 0.2 | 352.9 | 339.3 | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 6,322 | 5,845 | | 351 | 325 | 0.2 | 0.2 | 351.3 | 324.8 | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 6,322 | 5,620 | | 347 | 309 | 0.2 | 0.2 | 347.5 | 308.9 | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 6,322 | 5,404 | | 341 | 291 | 0.2 | 0.2 | 340.8 | 291.3 | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 6,322 | 5,196 | | 335 | 276 | 0.2 | 0.2 | 335.7 | 275.9 | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 6,322 | 4,996 | | 340 | 268 | 0.2 | 0.2 | 339.7 | 268.5 | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 6,322 | 4,804 | | 391 | 297 | 0.2 | 0.2 | 391.5 | 297.5 | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 6,322 | 4,619 | | 492 | 359 | 0.2 | 0.1 | 491.8 | 359.4 | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 6,322 | 4,442 | | 588 | 413 | 0.2 | 0.1 | 588.4 | 413.4 | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 6,322 | 4,271 | | 681 | 460 | 0.2 | 0.1 | 681.6 | 460.5 | | | |
| | R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 6,322 | 4,107 | | 702 | 456 | 0.2 | 0.1 | 702.0 | 456.0 | | | |
| | R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 6,322 | 3,949 | | 352 | 220 | 1.2 | 0.7 | 353.2 | 220.6 | | | |
| R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 6,322 | 3,797 | | 355 | 213 | 1.2 | 0.7 | 355.7 | 213.6 | | | | |
| R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 6,322 | 3,651 | | 278 | 161 | 1.2 | 0.7 | 279.6 | 161.5 | | | | |
| R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 12,085 | 6,710 | | 262 | 146 | 1.2 | 0.7 | 263.7 | 146.4 | | | | |
| R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 15,200 | 8,115 | | 259 | 138 | 1.4 | 0.7 | 260.1 | 138.9 | | | | |
| R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 15,200 | 7,803 | | 259 | 133 | 1.4 | 0.7 | 260.1 | 133.5 | | | | |
| R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 15,438 | 7,621 | | 267 | 132 | 2.8 | 1.4 | 269.7 | 133.1 | | | | |
| R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 15,438 | 7,328 | | 265 | 126 | 2.8 | 1.3 | 267.3 | 126.9 | | | | |
| R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 15,438 | 7,046 | | 255 | 117 | 2.8 | 1.3 | 258.3 | 117.9 | | | | |
| R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 15,493 | 6,799 | | 204 | 90 | 4.2 | 1.8 | 208.3 | 91.4 | | | | |
| R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 15,493 | 6,537 | | 204 | 86 | 4.2 | 1.8 | 208.3 | 87.9 | | | | |
| R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 15,797 | 6,409 | | | | 15.8 | 6.4 | 15.8 | 6.4 | | | | |
| R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 15,797 | 6,163 | | | | 15.8 | 6.2 | 15.8 | 6.2 | | | | |
| R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 15,797 | 5,926 | | | | 15.8 | 5.9 | 15.8 | 5.9 | | | | |
| R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 15,797 | 5,698 | | | | 15.8 | 5.7 | 15.8 | 5.7 | | | | |
| R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 15,797 | 5,479 | | | | 15.8 | 5.5 | 15.8 | 5.5 | | | | |
| R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 15,797 | 5,268 | | | | 15.8 | 5.3 | 15.8 | 5.3 | | | | |
| R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 15,797 | 5,065 | | | | 15.8 | 5.1 | 15.8 | 5.1 | | | | |
| R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 15,797 | 4,871 | | | | 15.8 | 4.9 | 15.8 | 4.9 | | | | |
| R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 15,797 | 4,683 | | | | 15.8 | 4.7 | 15.8 | 4.7 | | | | |
| R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 15,797 | 4,503 | | | | 15.8 | 4.5 | 15.8 | 4.5 | | | | |
| R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 15,797 | 4,330 | | | | 15.8 | 4.3 | 15.8 | 4.3 | | | | |
| R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 15,797 | 4,163 | | | | 15.8 | 4.2 | 15.8 | 4.2 | | | | |
| R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 15,797 | 4,003 | | | | 15.8 | 4.0 | 15.8 | 4.0 | | | | |
| R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 15,797 | 3,849 | | | | 15.8 | 3.8 | 15.8 | 3.8 | | | | |
| R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 15,797 | 3,701 | | | | 15.8 | 3.7 | 15.8 | 3.7 | | | | |
| R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 15,797 | 3,559 | | | | 15.8 | 3.6 | 15.8 | 3.6 | | | | |
| R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 15,797 | 3,422 | | | | 15.8 | 3.4 | 15.8 | 3.4 | | | | |
| R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 15,797 | 3,290 | | | | 15.8 | 3.3 | 15.8 | 3.3 | | | | |
| R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 15,797 | 3,164 | | | | 15.8 | 3.2 | 15.8 | 3.2 | | | | |
| R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 15,797 | 3,042 | | | | 15.8 | 3.0 | 15.8 | 3.0 | | | | |
| R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 15,797 | 2,925 | | | | 15.8 | 2.9 | 15.8 | 2.9 | | | | |
| R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 15,797 | 2,813 | | | | 15.8 | 2.8 | 15.8 | 2.8 | | | | |
| R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 15,797 | 2,704 | | | | 15.8 | 2.7 | 15.8 | 2.7 | | | | |
| R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 15,797 | 2,600 | | | | 15.8 | 2.6 | 15.8 | 2.6 | | | | |
| R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 15,797 | 2,500 | | | | 15.8 | 2.5 | 15.8 | 2.5 | | | | |
| R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 15,797 | 2,404 | | | | 15.8 | 2.4 | 15.8 | 2.4 | | | | |
| R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 15,797 | 2,312 | | | | 15.8 | 2.3 | 15.8 | 2.3 | | | | |
| R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 15,797 | 2,223 | | | | 15.8 | 2.2 | 15.8 | 2.2 | | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 15,797 | 2,137 | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 15,797 | 2,055 | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 15,797 | 1,976 | | | | 15.8 | 2.0 | 15.8 | 2.0 | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 15,797 | 1,900 | | | | 15.8 | 1.9 | 15.8 | 1.9 | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 15,797 | 1,827 | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 15,797 | 1,757 | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 15,797 | 1,689 | | | | 15.8 | 1.7 | 15.8 | 1.7 | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 15,797 | 1,624 | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 15,797 | 1,562 | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 15,797 | 1,502 | | | | 15.8 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 15,797 | 1,444 | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 15,797 | 1,388 | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 15,797 | 1,335 | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 15,797 | 1,284 | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 15,797 | 1,234 | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 15,797 | 1,187 | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 15,797 | 1,141 | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 15,797 | 1,097 | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | |
| R71 | 69 | 0.067 | 1.000 | 15,797 | 1,055 | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | |
| R72 | 70 | 0.064 | 1.000 | 15,797 | 1,014 | | | | 15.8 | 1.0 | 15.8 | 1.0 | | | | |
| R73 | 71 | 0.062 | 1.000 | 15,797 | 975 | | | | 15.8 | 1.0 | 15.8 | 1.0 | | | | |
| R74 | 72 | 0.059 | 1.000 | 15,797 | 938 | | | | 15.8 | 0.9 | 15.8 | 0.9 | | | | |
| 合計 | | | | | 1,016,725 | 288,196 | 213 | B= 288,409 | 15,054 | 15,052 | 817.6 | 157.8 | 15,872 | C= 15,210 | B/C= 19.0 | B-C= 273,199 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：全体事業 感度分析 工期-10%)

| | | 水系名：土器川 | | | | 河川名：土器川 | | | | (百万円) | | | | | | |
|-----------------------|-----|---------|----------------|----------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 年次 | 年度 | t | 割引率 (=0.04) | デフ レー ター | 便 益 | | | 費 用 | | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | |
| | | | | | 便益① | | 残存価値 ② | 建設費③ | | 維持管理費④ | | | | ③+④ | | |
| | | | | | 便益 | 現在価値 | | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | | | 費用 | 現在価値 | |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 整備期間 30年 | H21 | -11 | 1.539 | 1.142 | 0 | 0 | | 730 | 1,284 | 0.0 | 0.0 | 730.2 | 1,124.1 | | | |
| | H22 | -10 | 1.480 | 1.141 | 0 | 0 | | 483 | 815 | 0.0 | 0.0 | 482.8 | 714.7 | | | |
| | H23 | -9 | 1.423 | 1.118 | 0 | 0 | | 369 | 587 | 0.0 | 0.0 | 369.0 | 525.2 | | | |
| | H24 | -8 | 1.369 | 1.125 | 158 | 216 | | 967 | 1,488 | 0.1 | 0.1 | 966.8 | 1,323.1 | | | |
| | H25 | -7 | 1.316 | 1.100 | 158 | 208 | | 694 | 1,005 | 0.1 | 0.1 | 694.5 | 913.9 | | | |
| | H26 | -6 | 1.265 | 1.067 | 158 | 200 | | 543 | 732 | 0.1 | 0.1 | 542.6 | 686.6 | | | |
| | H27 | -5 | 1.217 | 1.057 | 2,425 | 2,950 | | 511 | 657 | 0.1 | 0.1 | 511.1 | 621.8 | | | |
| | H28 | -4 | 1.170 | 1.057 | 2,425 | 2,837 | | 485 | 600 | 0.1 | 0.1 | 485.5 | 568.0 | | | |
| | H29 | -3 | 1.125 | 1.032 | 2,425 | 2,728 | | 391 | 454 | 0.1 | 0.1 | 390.8 | 439.6 | | | |
| | H30 | -2 | 1.082 | 1.000 | 2,425 | 2,623 | | 471 | 510 | 0.1 | 0.1 | 471.5 | 510.0 | | | |
| | R1 | -1 | 1.040 | 1.000 | 2,425 | 2,522 | | 877 | 912 | 0.1 | 0.1 | 876.7 | 911.8 | | | |
| | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5,983 | 5,983 | | 653 | 653 | 0.2 | 0.2 | 653.2 | 653.2 | | | |
| | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 6,322 | 6,079 | | 431 | 414 | 0.2 | 0.2 | 431.1 | 414.5 | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 6,322 | 5,845 | | 428 | 396 | 0.2 | 0.2 | 428.0 | 395.7 | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 6,322 | 5,620 | | 420 | 374 | 0.2 | 0.2 | 420.5 | 373.8 | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 6,322 | 5,404 | | 411 | 351 | 0.2 | 0.2 | 411.3 | 351.6 | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 6,322 | 5,196 | | 415 | 341 | 0.2 | 0.2 | 415.2 | 341.3 | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 6,322 | 4,996 | | 506 | 400 | 0.2 | 0.2 | 506.4 | 400.2 | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 6,322 | 4,804 | | 652 | 496 | 0.2 | 0.2 | 652.6 | 495.9 | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 6,322 | 4,619 | | 802 | 586 | 0.2 | 0.1 | 802.4 | 586.3 | | | |
| R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 6,322 | 4,442 | | 875 | 615 | 0.2 | 0.1 | 875.6 | 615.2 | | | | |
| R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 9,996 | 6,753 | | 412 | 279 | 1.2 | 0.8 | 413.5 | 279.3 | | | | |
| R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 12,085 | 7,850 | | 405 | 263 | 1.2 | 0.8 | 406.5 | 264.1 | | | | |
| R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 15,200 | 9,494 | | 315 | 197 | 1.4 | 0.9 | 316.2 | 197.5 | | | | |
| R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 15,200 | 9,129 | | 318 | 191 | 1.4 | 0.8 | 319.7 | 192.0 | | | | |
| R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 15,438 | 8,915 | | 318 | 184 | 2.8 | 1.6 | 321.1 | 185.4 | | | | |
| R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 15,438 | 8,572 | | 325 | 180 | 2.8 | 1.6 | 327.7 | 182.0 | | | | |
| R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 15,438 | 8,242 | | 323 | 173 | 2.8 | 1.5 | 326.1 | 174.1 | | | | |
| R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 15,438 | 7,925 | | 261 | 134 | 2.8 | 1.4 | 263.3 | 135.2 | | | | |
| R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 15,493 | 7,648 | | 237 | 117 | 4.2 | 2.1 | 241.2 | 119.1 | | | | |
| 施設完成後の 評価期間 50年 | R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 15,493 | 7,354 | | | | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | | | |
| | R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 15,797 | 7,210 | | | | 15.8 | 7.2 | 15.8 | 7.2 | | | |
| | R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 15,797 | 6,932 | | | | 15.8 | 6.9 | 15.8 | 6.9 | | | |
| | R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 15,797 | 6,666 | | | | 15.8 | 6.7 | 15.8 | 6.7 | | | |
| | R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 15,797 | 6,409 | | | | 15.8 | 6.4 | 15.8 | 6.4 | | | |
| | R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 15,797 | 6,163 | | | | 15.8 | 6.2 | 15.8 | 6.2 | | | |
| | R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 15,797 | 5,926 | | | | 15.8 | 5.9 | 15.8 | 5.9 | | | |
| | R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 15,797 | 5,698 | | | | 15.8 | 5.7 | 15.8 | 5.7 | | | |
| | R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 15,797 | 5,479 | | | | 15.8 | 5.5 | 15.8 | 5.5 | | | |
| | R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 15,797 | 5,268 | | | | 15.8 | 5.3 | 15.8 | 5.3 | | | |
| | R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 15,797 | 5,065 | | | | 15.8 | 5.1 | 15.8 | 5.1 | | | |
| | R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 15,797 | 4,871 | | | | 15.8 | 4.9 | 15.8 | 4.9 | | | |
| | R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 15,797 | 4,683 | | | | 15.8 | 4.7 | 15.8 | 4.7 | | | |
| | R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 15,797 | 4,503 | | | | 15.8 | 4.5 | 15.8 | 4.5 | | | |
| | R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 15,797 | 4,330 | | | | 15.8 | 4.3 | 15.8 | 4.3 | | | |
| | R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 15,797 | 4,163 | | | | 15.8 | 4.2 | 15.8 | 4.2 | | | |
| | R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 15,797 | 4,003 | | | | 15.8 | 4.0 | 15.8 | 4.0 | | | |
| | R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 15,797 | 3,849 | | | | 15.8 | 3.8 | 15.8 | 3.8 | | | |
| | R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 15,797 | 3,701 | | | | 15.8 | 3.7 | 15.8 | 3.7 | | | |
| | R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 15,797 | 3,559 | | | | 15.8 | 3.6 | 15.8 | 3.6 | | | |
| R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 15,797 | 3,422 | | | | 15.8 | 3.4 | 15.8 | 3.4 | | | | |
| R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 15,797 | 3,290 | | | | 15.8 | 3.3 | 15.8 | 3.3 | | | | |
| R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 15,797 | 3,164 | | | | 15.8 | 3.2 | 15.8 | 3.2 | | | | |
| R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 15,797 | 3,042 | | | | 15.8 | 3.0 | 15.8 | 3.0 | | | | |
| R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 15,797 | 2,925 | | | | 15.8 | 2.9 | 15.8 | 2.9 | | | | |
| R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 15,797 | 2,813 | | | | 15.8 | 2.8 | 15.8 | 2.8 | | | | |
| R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 15,797 | 2,704 | | | | 15.8 | 2.7 | 15.8 | 2.7 | | | | |
| R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 15,797 | 2,600 | | | | 15.8 | 2.6 | 15.8 | 2.6 | | | | |
| R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 15,797 | 2,500 | | | | 15.8 | 2.5 | 15.8 | 2.5 | | | | |
| R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 15,797 | 2,404 | | | | 15.8 | 2.4 | 15.8 | 2.4 | | | | |
| R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 15,797 | 2,312 | | | | 15.8 | 2.3 | 15.8 | 2.3 | | | | |
| R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 15,797 | 2,223 | | | | 15.8 | 2.2 | 15.8 | 2.2 | | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 15,797 | 2,137 | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 15,797 | 2,055 | | | | 15.8 | 2.1 | 15.8 | 2.1 | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 15,797 | 1,976 | | | | 15.8 | 2.0 | 15.8 | 2.0 | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 15,797 | 1,900 | | | | 15.8 | 1.9 | 15.8 | 1.9 | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 15,797 | 1,827 | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 15,797 | 1,757 | | | | 15.8 | 1.8 | 15.8 | 1.8 | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 15,797 | 1,689 | | | | 15.8 | 1.7 | 15.8 | 1.7 | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 15,797 | 1,624 | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 15,797 | 1,562 | | | | 15.8 | 1.6 | 15.8 | 1.6 | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 15,797 | 1,502 | | | | 15.8 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 15,797 | 1,444 | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 15,797 | 1,388 | | | | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 1.4 | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 15,797 | 1,335 | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 15,797 | 1,284 | | | | 15.8 | 1.3 | 15.8 | 1.3 | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 15,797 | 1,234 | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 15,797 | 1,187 | | | | 15.8 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 15,797 | 1,141 | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 15,797 | 1,097 | | | | 15.8 | 1.1 | 15.8 | 1.1 | | | | |
| 合 計 | | | | | 994,752 | 309,170 | 269 | B= 309,439 | 15,030 | 15,388 | 801.8 | 176.1 | 15,832 | C= 15,564 | B/C= 19.9 | B-C= 293,875 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：残事業 感度分析 事業費+10%)

| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レー ター | 便 益 | | | 費 用 | | | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | |
|---|-----|-------|-----------------|----------------|---------|---------|-----------|--------------------|-------|-------|--------|-------|--------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | 便益① | | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | | 維持管理費④ | | | | ③+④ | |
| | | | | | 便益 | 現在価値 | | | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | | | 費用 | 現在価値 |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 整備 期間 20 年 | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 0 | 0 | | 427 | 411 | 0.0 | 0.0 | 427.0 | 410.6 | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 0 | 0 | | 425 | 393 | 0.0 | 0.0 | 425.0 | 392.9 | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 0 | 0 | | 419 | 372 | 0.0 | 0.0 | 419.0 | 372.5 | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 0 | 0 | | 409 | 350 | 0.0 | 0.0 | 409.0 | 349.6 | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 0 | 0 | | 404 | 332 | 0.0 | 0.0 | 404.0 | 332.1 | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 0 | 0 | | 418 | 330 | 0.0 | 0.0 | 418.0 | 330.4 | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 0 | 0 | | 557 | 423 | 0.0 | 0.0 | 557.0 | 423.3 | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 0 | 0 | | 684 | 500 | 0.0 | 0.0 | 684.0 | 499.8 | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 0 | 0 | | 822 | 578 | 0.0 | 0.0 | 822.0 | 577.5 | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 0 | 0 | | 849 | 574 | 0.0 | 0.0 | 849.0 | 573.6 | | | |
| | R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 0 | 0 | | 404 | 262 | 1.0 | 0.6 | 405.0 | 263.1 | | | |
| | R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 0 | 0 | | 433 | 270 | 1.0 | 0.6 | 434.0 | 271.1 | | | |
| | R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 10,503 | 6,308 | | 305 | 183 | 1.1 | 0.7 | 306.1 | 183.8 | | | |
| | R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 10,933 | 6,314 | | 325 | 188 | 1.2 | 0.7 | 326.2 | 188.4 | | | |
| | R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 10,933 | 6,071 | | 304 | 169 | 1.2 | 0.7 | 305.2 | 169.5 | | | |
| | R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 11,276 | 6,020 | | 325 | 174 | 2.7 | 1.4 | 327.7 | 175.0 | | | |
| | R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 11,276 | 5,789 | | 320 | 164 | 2.7 | 1.4 | 322.7 | 165.7 | | | |
| | R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 11,276 | 5,566 | | 320 | 158 | 2.7 | 1.3 | 322.7 | 159.3 | | | |
| | R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 11,285 | 5,356 | | 247 | 117 | 4.1 | 1.9 | 251.1 | 119.2 | | | |
| | R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 11,285 | 5,150 | | 247 | 113 | 4.1 | 1.9 | 251.1 | 114.6 | | | |
| 施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 50 年 | R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 11,294 | 4,956 | | | | 15.6 | 6.8 | 15.6 | 6.8 | | | |
| | R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 11,294 | 4,766 | | | | 15.6 | 6.6 | 15.6 | 6.6 | | | |
| | R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 11,294 | 4,582 | | | | 15.6 | 6.3 | 15.6 | 6.3 | | | |
| | R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 11,294 | 4,406 | | | | 15.6 | 6.1 | 15.6 | 6.1 | | | |
| | R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 11,294 | 4,237 | | | | 15.6 | 5.9 | 15.6 | 5.9 | | | |
| | R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 11,294 | 4,074 | | | | 15.6 | 5.6 | 15.6 | 5.6 | | | |
| | R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 11,294 | 3,917 | | | | 15.6 | 5.4 | 15.6 | 5.4 | | | |
| | R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 11,294 | 3,766 | | | | 15.6 | 5.2 | 15.6 | 5.2 | | | |
| | R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 11,294 | 3,621 | | | | 15.6 | 5.0 | 15.6 | 5.0 | | | |
| | R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 11,294 | 3,482 | | | | 15.6 | 4.8 | 15.6 | 4.8 | | | |
| | R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 11,294 | 3,348 | | | | 15.6 | 4.6 | 15.6 | 4.6 | | | |
| | R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 11,294 | 3,219 | | | | 15.6 | 4.4 | 15.6 | 4.4 | | | |
| | R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 11,294 | 3,096 | | | | 15.6 | 4.3 | 15.6 | 4.3 | | | |
| | R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 11,294 | 2,977 | | | | 15.6 | 4.1 | 15.6 | 4.1 | | | |
| | R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 11,294 | 2,862 | | | | 15.6 | 4.0 | 15.6 | 4.0 | | | |
| | R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 11,294 | 2,752 | | | | 15.6 | 3.8 | 15.6 | 3.8 | | | |
| | R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 11,294 | 2,646 | | | | 15.6 | 3.7 | 15.6 | 3.7 | | | |
| | R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 11,294 | 2,544 | | | | 15.6 | 3.5 | 15.6 | 3.5 | | | |
| | R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 11,294 | 2,447 | | | | 15.6 | 3.4 | 15.6 | 3.4 | | | |
| | R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 11,294 | 2,352 | | | | 15.6 | 3.2 | 15.6 | 3.2 | | | |
| | R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 11,294 | 2,262 | | | | 15.6 | 3.1 | 15.6 | 3.1 | | | |
| | R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 11,294 | 2,175 | | | | 15.6 | 3.0 | 15.6 | 3.0 | | | |
| | R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 11,294 | 2,091 | | | | 15.6 | 2.9 | 15.6 | 2.9 | | | |
| | R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 11,294 | 2,011 | | | | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | | | |
| | R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 11,294 | 1,934 | | | | 15.6 | 2.7 | 15.6 | 2.7 | | | |
| | R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 11,294 | 1,859 | | | | 15.6 | 2.6 | 15.6 | 2.6 | | | |
| | R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 11,294 | 1,788 | | | | 15.6 | 2.5 | 15.6 | 2.5 | | | |
| | R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 11,294 | 1,719 | | | | 15.6 | 2.4 | 15.6 | 2.4 | | | |
| | R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 11,294 | 1,653 | | | | 15.6 | 2.3 | 15.6 | 2.3 | | | |
| | R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 11,294 | 1,589 | | | | 15.6 | 2.2 | 15.6 | 2.2 | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 11,294 | 1,528 | | | | 15.6 | 2.1 | 15.6 | 2.1 | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 11,294 | 1,469 | | | | 15.6 | 2.0 | 15.6 | 2.0 | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 11,294 | 1,413 | | | | 15.6 | 2.0 | 15.6 | 2.0 | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 11,294 | 1,358 | | | | 15.6 | 1.9 | 15.6 | 1.9 | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 11,294 | 1,306 | | | | 15.6 | 1.8 | 15.6 | 1.8 | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 11,294 | 1,256 | | | | 15.6 | 1.7 | 15.6 | 1.7 | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 11,294 | 1,208 | | | | 15.6 | 1.7 | 15.6 | 1.7 | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 11,294 | 1,161 | | | | 15.6 | 1.6 | 15.6 | 1.6 | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 11,294 | 1,117 | | | | 15.6 | 1.5 | 15.6 | 1.5 | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 11,294 | 1,074 | | | | 15.6 | 1.5 | 15.6 | 1.5 | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 11,294 | 1,032 | | | | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 1.4 | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 11,294 | 993 | | | | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 1.4 | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 11,294 | 954 | | | | 15.6 | 1.3 | 15.6 | 1.3 | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 11,294 | 918 | | | | 15.6 | 1.3 | 15.6 | 1.3 | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 11,294 | 882 | | | | 15.6 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 11,294 | 848 | | | | 15.6 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 11,294 | 816 | | | | 15.6 | 1.1 | 15.6 | 1.1 | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 11,294 | 784 | | | | 15.6 | 1.1 | 15.6 | 1.1 | | | | |
| R71 | 69 | 0.067 | 1.000 | 11,294 | 754 | | | | 15.6 | 1.0 | 15.6 | 1.0 | | | | |
| R72 | 70 | 0.064 | 1.000 | 11,294 | 725 | | | | 15.6 | 1.0 | 15.6 | 1.0 | | | | |
| 合 計 | | | | | 653,467 | 157,301 | 244 | B = 157,545 | 8,644 | 6,061 | 801.8 | 164.2 | 9,446 | C = 6,225 | B/C = 25.3 | B-C = 151,320 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：残事業 感度分析 事業費-10%)

| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レー ター | 水系名:土器川 | | | 河川名:土器川 | | | (百万円) | | | | | |
|---------------------|---|-------|-----------------|----------------|---------|-----------|----------|-------------|--------|-------|--------------|--------------|-------|-----------|------------|---------------|
| | | | | | 便 益 | | | 費 用 | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | | |
| | | | | | 便益① | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | 維持管理費④ | ③+④ | | | | | | |
| 便益 | 現在価値 | | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | | | | | | | | |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 整備 期間 20 年 | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 0 | 0 | | 349 | 336 | 0.0 | 0.0 | 349.0 | 335.6 | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 0 | 0 | | 347 | 321 | 0.0 | 0.0 | 347.0 | 320.8 | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 0 | 0 | | 343 | 305 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 304.9 | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 0 | 0 | | 335 | 286 | 0.0 | 0.0 | 335.0 | 286.4 | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 0 | 0 | | 330 | 271 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 271.2 | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 0 | 0 | | 342 | 270 | 0.0 | 0.0 | 342.0 | 270.3 | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 0 | 0 | | 455 | 346 | 0.0 | 0.0 | 455.0 | 345.8 | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 0 | 0 | | 560 | 409 | 0.0 | 0.0 | 560.0 | 409.2 | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 0 | 0 | | 672 | 472 | 0.0 | 0.0 | 672.0 | 472.1 | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 0 | 0 | | 695 | 470 | 0.0 | 0.0 | 695.0 | 469.5 | | | |
| | R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 0 | 0 | | 330 | 214 | 1.0 | 0.6 | 331.0 | 215.0 | | | |
| | R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 0 | 0 | | 355 | 222 | 1.0 | 0.6 | 356.0 | 222.4 | | | |
| | R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 10,503 | 6,308 | | 249 | 150 | 1.1 | 0.7 | 250.1 | 150.2 | | | |
| | R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 10,933 | 6,314 | | 266 | 154 | 1.2 | 0.7 | 267.2 | 154.3 | | | |
| | R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 10,933 | 6,071 | | 248 | 138 | 1.2 | 0.7 | 249.2 | 138.4 | | | |
| | R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 11,276 | 6,020 | | 266 | 142 | 2.7 | 1.4 | 268.7 | 143.5 | | | |
| | R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 11,276 | 5,789 | | 262 | 135 | 2.7 | 1.4 | 264.7 | 135.9 | | | |
| | R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 11,276 | 5,566 | | 262 | 129 | 2.7 | 1.3 | 264.7 | 130.7 | | | |
| | R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 11,285 | 5,356 | | 202 | 96 | 4.1 | 1.9 | 206.1 | 97.8 | | | |
| | R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 11,285 | 5,150 | | 202 | 92 | 4.1 | 1.9 | 206.1 | 94.1 | | | |
| | 施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 50 年 | R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 11,294 | 4,956 | | | | 15.6 | 6.8 | 15.6 | 6.8 | | |
| | | R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 11,294 | 4,766 | | | | 15.6 | 6.6 | 15.6 | 6.6 | | |
| R25 | | 23 | 0.406 | 1.000 | 11,294 | 4,582 | | | | 15.6 | 6.3 | 15.6 | 6.3 | | | |
| R26 | | 24 | 0.390 | 1.000 | 11,294 | 4,406 | | | | 15.6 | 6.1 | 15.6 | 6.1 | | | |
| R27 | | 25 | 0.375 | 1.000 | 11,294 | 4,237 | | | | 15.6 | 5.9 | 15.6 | 5.9 | | | |
| R28 | | 26 | 0.361 | 1.000 | 11,294 | 4,074 | | | | 15.6 | 5.6 | 15.6 | 5.6 | | | |
| R29 | | 27 | 0.347 | 1.000 | 11,294 | 3,917 | | | | 15.6 | 5.4 | 15.6 | 5.4 | | | |
| R30 | | 28 | 0.333 | 1.000 | 11,294 | 3,766 | | | | 15.6 | 5.2 | 15.6 | 5.2 | | | |
| R31 | | 29 | 0.321 | 1.000 | 11,294 | 3,621 | | | | 15.6 | 5.0 | 15.6 | 5.0 | | | |
| R32 | | 30 | 0.308 | 1.000 | 11,294 | 3,482 | | | | 15.6 | 4.8 | 15.6 | 4.8 | | | |
| R33 | | 31 | 0.296 | 1.000 | 11,294 | 3,348 | | | | 15.6 | 4.6 | 15.6 | 4.6 | | | |
| R34 | | 32 | 0.285 | 1.000 | 11,294 | 3,219 | | | | 15.6 | 4.4 | 15.6 | 4.4 | | | |
| R35 | | 33 | 0.274 | 1.000 | 11,294 | 3,096 | | | | 15.6 | 4.3 | 15.6 | 4.3 | | | |
| R36 | | 34 | 0.264 | 1.000 | 11,294 | 2,977 | | | | 15.6 | 4.1 | 15.6 | 4.1 | | | |
| R37 | | 35 | 0.253 | 1.000 | 11,294 | 2,862 | | | | 15.6 | 4.0 | 15.6 | 4.0 | | | |
| R38 | | 36 | 0.244 | 1.000 | 11,294 | 2,752 | | | | 15.6 | 3.8 | 15.6 | 3.8 | | | |
| R39 | | 37 | 0.234 | 1.000 | 11,294 | 2,646 | | | | 15.6 | 3.7 | 15.6 | 3.7 | | | |
| R40 | | 38 | 0.225 | 1.000 | 11,294 | 2,544 | | | | 15.6 | 3.5 | 15.6 | 3.5 | | | |
| R41 | | 39 | 0.217 | 1.000 | 11,294 | 2,447 | | | | 15.6 | 3.4 | 15.6 | 3.4 | | | |
| R42 | | 40 | 0.208 | 1.000 | 11,294 | 2,352 | | | | 15.6 | 3.2 | 15.6 | 3.2 | | | |
| R43 | | 41 | 0.200 | 1.000 | 11,294 | 2,262 | | | | 15.6 | 3.1 | 15.6 | 3.1 | | | |
| R44 | | 42 | 0.193 | 1.000 | 11,294 | 2,175 | | | | 15.6 | 3.0 | 15.6 | 3.0 | | | |
| R45 | | 43 | 0.185 | 1.000 | 11,294 | 2,091 | | | | 15.6 | 2.9 | 15.6 | 2.9 | | | |
| R46 | | 44 | 0.178 | 1.000 | 11,294 | 2,011 | | | | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | | | |
| R47 | | 45 | 0.171 | 1.000 | 11,294 | 1,934 | | | | 15.6 | 2.7 | 15.6 | 2.7 | | | |
| R48 | | 46 | 0.165 | 1.000 | 11,294 | 1,859 | | | | 15.6 | 2.6 | 15.6 | 2.6 | | | |
| R49 | | 47 | 0.158 | 1.000 | 11,294 | 1,788 | | | | 15.6 | 2.5 | 15.6 | 2.5 | | | |
| R50 | | 48 | 0.152 | 1.000 | 11,294 | 1,719 | | | | 15.6 | 2.4 | 15.6 | 2.4 | | | |
| R51 | | 49 | 0.146 | 1.000 | 11,294 | 1,653 | | | | 15.6 | 2.3 | 15.6 | 2.3 | | | |
| R52 | | 50 | 0.141 | 1.000 | 11,294 | 1,589 | | | | 15.6 | 2.2 | 15.6 | 2.2 | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 11,294 | 1,528 | | | | 15.6 | 2.1 | 15.6 | 2.1 | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 11,294 | 1,469 | | | | 15.6 | 2.0 | 15.6 | 2.0 | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 11,294 | 1,413 | | | | 15.6 | 2.0 | 15.6 | 2.0 | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 11,294 | 1,358 | | | | 15.6 | 1.9 | 15.6 | 1.9 | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 11,294 | 1,306 | | | | 15.6 | 1.8 | 15.6 | 1.8 | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 11,294 | 1,256 | | | | 15.6 | 1.7 | 15.6 | 1.7 | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 11,294 | 1,208 | | | | 15.6 | 1.7 | 15.6 | 1.7 | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 11,294 | 1,161 | | | | 15.6 | 1.6 | 15.6 | 1.6 | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 11,294 | 1,117 | | | | 15.6 | 1.5 | 15.6 | 1.5 | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 11,294 | 1,074 | | | | 15.6 | 1.5 | 15.6 | 1.5 | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 11,294 | 1,032 | | | | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 1.4 | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 11,294 | 993 | | | | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 1.4 | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 11,294 | 954 | | | | 15.6 | 1.3 | 15.6 | 1.3 | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 11,294 | 918 | | | | 15.6 | 1.3 | 15.6 | 1.3 | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 11,294 | 882 | | | | 15.6 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 11,294 | 848 | | | | 15.6 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 11,294 | 816 | | | | 15.6 | 1.1 | 15.6 | 1.1 | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 11,294 | 784 | | | | 15.6 | 1.1 | 15.6 | 1.1 | | | | |
| R71 | 69 | 0.067 | 1.000 | 11,294 | 754 | | | | 15.6 | 1.0 | 15.6 | 1.0 | | | | |
| R72 | 70 | 0.064 | 1.000 | 11,294 | 725 | | | | 15.6 | 1.0 | 15.6 | 1.0 | | | | |
| 合 計 | | | | | 653,467 | 157,301 | 200 | B = 157,501 | 7,070 | 4,958 | 801.8 | 164.2 | 7,872 | C = 5,122 | B/C = 30.7 | B-C = 152,379 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：残事業 感度分析 資産+10%)

| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レ ー タ ー | 水系名:土器川 | | | 河川名:土器川 | | | (百万円) | | | | | |
|---|------|-------|-----------------|------------------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|-------|--------------|--------------|-------|---------|----------|-------------|
| | | | | | 便 益 | | | 費 用 | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | | |
| | | | | | 便益① | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | 維持管理費④ | ③+④ | | | | | | |
| 便益 | 現在価値 | | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | | | | | | | | |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 整備 期間 20 年 | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 0 | 0 | | 388 | 373 | 0.0 | 0.0 | 388.0 | 373.1 | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 0 | 0 | | 386 | 357 | 0.0 | 0.0 | 386.0 | 356.9 | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 0 | 0 | | 381 | 339 | 0.0 | 0.0 | 381.0 | 338.7 | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 0 | 0 | | 372 | 318 | 0.0 | 0.0 | 372.0 | 318.0 | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 0 | 0 | | 367 | 302 | 0.0 | 0.0 | 367.0 | 301.6 | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 0 | 0 | | 380 | 300 | 0.0 | 0.0 | 380.0 | 300.3 | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 0 | 0 | | 506 | 385 | 0.0 | 0.0 | 506.0 | 384.5 | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 0 | 0 | | 622 | 454 | 0.0 | 0.0 | 622.0 | 454.5 | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 0 | 0 | | 747 | 525 | 0.0 | 0.0 | 747.0 | 524.8 | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 0 | 0 | | 772 | 522 | 0.0 | 0.0 | 772.0 | 521.5 | | | |
| | R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 0 | 0 | | 367 | 238 | 1.0 | 0.6 | 368.0 | 239.0 | | | |
| | R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 0 | 0 | | 394 | 246 | 1.0 | 0.6 | 395.0 | 246.7 | | | |
| | R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 11,496 | 6,904 | | 277 | 166 | 1.1 | 0.7 | 278.1 | 167.0 | | | |
| | R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 11,968 | 6,911 | | 295 | 170 | 1.2 | 0.7 | 296.2 | 171.0 | | | |
| | R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 11,968 | 6,645 | | 276 | 153 | 1.2 | 0.7 | 277.2 | 153.9 | | | |
| | R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 12,341 | 6,589 | | 295 | 158 | 2.7 | 1.4 | 297.7 | 158.9 | | | |
| | R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 12,341 | 6,336 | | 291 | 149 | 2.7 | 1.4 | 293.7 | 150.8 | | | |
| | R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 12,341 | 6,092 | | 291 | 144 | 2.7 | 1.3 | 293.7 | 145.0 | | | |
| | R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 12,352 | 5,863 | | 225 | 107 | 4.1 | 1.9 | 229.1 | 108.7 | | | |
| | R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 12,352 | 5,637 | | 225 | 103 | 4.1 | 1.9 | 229.1 | 104.6 | | | |
| 施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 50 年 | R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 12,361 | 5,424 | | | | 15.6 | 6.8 | 15.6 | 6.8 | | | |
| | R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 12,361 | 5,216 | | | | 15.6 | 6.6 | 15.6 | 6.6 | | | |
| | R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 12,361 | 5,015 | | | | 15.6 | 6.3 | 15.6 | 6.3 | | | |
| | R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 12,361 | 4,822 | | | | 15.6 | 6.1 | 15.6 | 6.1 | | | |
| | R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 12,361 | 4,637 | | | | 15.6 | 5.9 | 15.6 | 5.9 | | | |
| | R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 12,361 | 4,458 | | | | 15.6 | 5.6 | 15.6 | 5.6 | | | |
| | R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 12,361 | 4,287 | | | | 15.6 | 5.4 | 15.6 | 5.4 | | | |
| | R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 12,361 | 4,122 | | | | 15.6 | 5.2 | 15.6 | 5.2 | | | |
| | R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 12,361 | 3,964 | | | | 15.6 | 5.0 | 15.6 | 5.0 | | | |
| | R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 12,361 | 3,811 | | | | 15.6 | 4.8 | 15.6 | 4.8 | | | |
| | R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 12,361 | 3,665 | | | | 15.6 | 4.6 | 15.6 | 4.6 | | | |
| | R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 12,361 | 3,524 | | | | 15.6 | 4.4 | 15.6 | 4.4 | | | |
| | R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 12,361 | 3,388 | | | | 15.6 | 4.3 | 15.6 | 4.3 | | | |
| | R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 12,361 | 3,258 | | | | 15.6 | 4.1 | 15.6 | 4.1 | | | |
| | R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 12,361 | 3,132 | | | | 15.6 | 4.0 | 15.6 | 4.0 | | | |
| | R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 12,361 | 3,012 | | | | 15.6 | 3.8 | 15.6 | 3.8 | | | |
| | R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 12,361 | 2,896 | | | | 15.6 | 3.7 | 15.6 | 3.7 | | | |
| | R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 12,361 | 2,785 | | | | 15.6 | 3.5 | 15.6 | 3.5 | | | |
| | R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 12,361 | 2,678 | | | | 15.6 | 3.4 | 15.6 | 3.4 | | | |
| | R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 12,361 | 2,575 | | | | 15.6 | 3.2 | 15.6 | 3.2 | | | |
| | R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 12,361 | 2,476 | | | | 15.6 | 3.1 | 15.6 | 3.1 | | | |
| | R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 12,361 | 2,380 | | | | 15.6 | 3.0 | 15.6 | 3.0 | | | |
| | R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 12,361 | 2,289 | | | | 15.6 | 2.9 | 15.6 | 2.9 | | | |
| | R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 12,361 | 2,201 | | | | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | | | |
| | R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 12,361 | 2,116 | | | | 15.6 | 2.7 | 15.6 | 2.7 | | | |
| | R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 12,361 | 2,035 | | | | 15.6 | 2.6 | 15.6 | 2.6 | | | |
| | R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 12,361 | 1,957 | | | | 15.6 | 2.5 | 15.6 | 2.5 | | | |
| | R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 12,361 | 1,881 | | | | 15.6 | 2.4 | 15.6 | 2.4 | | | |
| | R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 12,361 | 1,809 | | | | 15.6 | 2.3 | 15.6 | 2.3 | | | |
| | R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 12,361 | 1,739 | | | | 15.6 | 2.2 | 15.6 | 2.2 | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 12,361 | 1,672 | | | | 15.6 | 2.1 | 15.6 | 2.1 | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 12,361 | 1,608 | | | | 15.6 | 2.0 | 15.6 | 2.0 | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 12,361 | 1,546 | | | | 15.6 | 2.0 | 15.6 | 2.0 | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 12,361 | 1,487 | | | | 15.6 | 1.9 | 15.6 | 1.9 | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 12,361 | 1,430 | | | | 15.6 | 1.8 | 15.6 | 1.8 | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 12,361 | 1,375 | | | | 15.6 | 1.7 | 15.6 | 1.7 | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 12,361 | 1,322 | | | | 15.6 | 1.7 | 15.6 | 1.7 | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 12,361 | 1,271 | | | | 15.6 | 1.6 | 15.6 | 1.6 | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 12,361 | 1,222 | | | | 15.6 | 1.5 | 15.6 | 1.5 | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 12,361 | 1,175 | | | | 15.6 | 1.5 | 15.6 | 1.5 | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 12,361 | 1,130 | | | | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 1.4 | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 12,361 | 1,086 | | | | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 1.4 | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 12,361 | 1,045 | | | | 15.6 | 1.3 | 15.6 | 1.3 | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 12,361 | 1,004 | | | | 15.6 | 1.3 | 15.6 | 1.3 | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 12,361 | 966 | | | | 15.6 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 12,361 | 929 | | | | 15.6 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 12,361 | 893 | | | | 15.6 | 1.1 | 15.6 | 1.1 | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 12,361 | 859 | | | | 15.6 | 1.1 | 15.6 | 1.1 | | | | |
| R71 | 69 | 0.067 | 1.000 | 12,361 | 826 | | | | 15.6 | 1.0 | 15.6 | 1.0 | | | | |
| R72 | 70 | 0.064 | 1.000 | 12,361 | 794 | | | | 15.6 | 1.0 | 15.6 | 1.0 | | | | |
| 合 計 | | | | | 715,209 | 172,169 | 222 | B=172,391 | 7,857 | 5,509 | 801.8 | 164.2 | 8,659 | C=5,673 | B/C=30.4 | B-C=166,718 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：残事業 感度分析 資産-10%)

| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レ ー タ ー | 水系名:土器川 | | | 河川名:土器川 | | | (百万円) | | | | | |
|---------------------|---|-------|-----------------|------------------------|---------|-----------|----------|-------------|--------|-------|--------------|--------------|-------|-----------|------------|---------------|
| | | | | | 便 益 | | | 費 用 | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | | |
| | | | | | 便益① | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | 維持管理費④ | ③+④ | | | | | | |
| 便益 | 現在価値 | | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | | | | | | | | |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 整備 期間 20 年 | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 0 | 0 | | 388 | 373 | 0.0 | 0.0 | 388.0 | 373.1 | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 0 | 0 | | 386 | 357 | 0.0 | 0.0 | 386.0 | 356.9 | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 0 | 0 | | 381 | 339 | 0.0 | 0.0 | 381.0 | 338.7 | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 0 | 0 | | 372 | 318 | 0.0 | 0.0 | 372.0 | 318.0 | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 0 | 0 | | 367 | 302 | 0.0 | 0.0 | 367.0 | 301.6 | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 0 | 0 | | 380 | 300 | 0.0 | 0.0 | 380.0 | 300.3 | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 0 | 0 | | 506 | 385 | 0.0 | 0.0 | 506.0 | 384.5 | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 0 | 0 | | 622 | 454 | 0.0 | 0.0 | 622.0 | 454.5 | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 0 | 0 | | 747 | 525 | 0.0 | 0.0 | 747.0 | 524.8 | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 0 | 0 | | 772 | 522 | 0.0 | 0.0 | 772.0 | 521.5 | | | |
| | R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 0 | 0 | | 367 | 238 | 1.0 | 0.6 | 368.0 | 239.0 | | | |
| | R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 0 | 0 | | 394 | 246 | 1.0 | 0.6 | 395.0 | 246.7 | | | |
| | R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 9,510 | 5,711 | | 277 | 166 | 1.1 | 0.7 | 278.1 | 167.0 | | | |
| | R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 9,901 | 5,718 | | 295 | 170 | 1.2 | 0.7 | 296.2 | 171.0 | | | |
| | R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 9,901 | 5,498 | | 276 | 153 | 1.2 | 0.7 | 277.2 | 153.9 | | | |
| | R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 10,209 | 5,451 | | 295 | 158 | 2.7 | 1.4 | 297.7 | 158.9 | | | |
| | R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 10,209 | 5,241 | | 291 | 149 | 2.7 | 1.4 | 293.7 | 150.8 | | | |
| | R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 10,209 | 5,039 | | 291 | 144 | 2.7 | 1.3 | 293.7 | 145.0 | | | |
| | R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 10,217 | 4,849 | | 225 | 107 | 4.1 | 1.9 | 229.1 | 108.7 | | | |
| | R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 10,217 | 4,663 | | 225 | 103 | 4.1 | 1.9 | 229.1 | 104.6 | | | |
| | 施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 50 年 | R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 10,225 | 4,487 | | | | 15.6 | 6.8 | 15.6 | 6.8 | | |
| | | R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 10,225 | 4,314 | | | | 15.6 | 6.6 | 15.6 | 6.6 | | |
| R25 | | 23 | 0.406 | 1.000 | 10,225 | 4,149 | | | | 15.6 | 6.3 | 15.6 | 6.3 | | | |
| R26 | | 24 | 0.390 | 1.000 | 10,225 | 3,989 | | | | 15.6 | 6.1 | 15.6 | 6.1 | | | |
| R27 | | 25 | 0.375 | 1.000 | 10,225 | 3,836 | | | | 15.6 | 5.9 | 15.6 | 5.9 | | | |
| R28 | | 26 | 0.361 | 1.000 | 10,225 | 3,688 | | | | 15.6 | 5.6 | 15.6 | 5.6 | | | |
| R29 | | 27 | 0.347 | 1.000 | 10,225 | 3,546 | | | | 15.6 | 5.4 | 15.6 | 5.4 | | | |
| R30 | | 28 | 0.333 | 1.000 | 10,225 | 3,410 | | | | 15.6 | 5.2 | 15.6 | 5.2 | | | |
| R31 | | 29 | 0.321 | 1.000 | 10,225 | 3,279 | | | | 15.6 | 5.0 | 15.6 | 5.0 | | | |
| R32 | | 30 | 0.308 | 1.000 | 10,225 | 3,153 | | | | 15.6 | 4.8 | 15.6 | 4.8 | | | |
| R33 | | 31 | 0.296 | 1.000 | 10,225 | 3,031 | | | | 15.6 | 4.6 | 15.6 | 4.6 | | | |
| R34 | | 32 | 0.285 | 1.000 | 10,225 | 2,915 | | | | 15.6 | 4.4 | 15.6 | 4.4 | | | |
| R35 | | 33 | 0.274 | 1.000 | 10,225 | 2,803 | | | | 15.6 | 4.3 | 15.6 | 4.3 | | | |
| R36 | | 34 | 0.264 | 1.000 | 10,225 | 2,695 | | | | 15.6 | 4.1 | 15.6 | 4.1 | | | |
| R37 | | 35 | 0.253 | 1.000 | 10,225 | 2,591 | | | | 15.6 | 4.0 | 15.6 | 4.0 | | | |
| R38 | | 36 | 0.244 | 1.000 | 10,225 | 2,492 | | | | 15.6 | 3.8 | 15.6 | 3.8 | | | |
| R39 | | 37 | 0.234 | 1.000 | 10,225 | 2,396 | | | | 15.6 | 3.7 | 15.6 | 3.7 | | | |
| R40 | | 38 | 0.225 | 1.000 | 10,225 | 2,304 | | | | 15.6 | 3.5 | 15.6 | 3.5 | | | |
| R41 | | 39 | 0.217 | 1.000 | 10,225 | 2,215 | | | | 15.6 | 3.4 | 15.6 | 3.4 | | | |
| R42 | | 40 | 0.208 | 1.000 | 10,225 | 2,130 | | | | 15.6 | 3.2 | 15.6 | 3.2 | | | |
| R43 | | 41 | 0.200 | 1.000 | 10,225 | 2,048 | | | | 15.6 | 3.1 | 15.6 | 3.1 | | | |
| R44 | | 42 | 0.193 | 1.000 | 10,225 | 1,969 | | | | 15.6 | 3.0 | 15.6 | 3.0 | | | |
| R45 | | 43 | 0.185 | 1.000 | 10,225 | 1,893 | | | | 15.6 | 2.9 | 15.6 | 2.9 | | | |
| R46 | | 44 | 0.178 | 1.000 | 10,225 | 1,821 | | | | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | | | |
| R47 | | 45 | 0.171 | 1.000 | 10,225 | 1,751 | | | | 15.6 | 2.7 | 15.6 | 2.7 | | | |
| R48 | | 46 | 0.165 | 1.000 | 10,225 | 1,683 | | | | 15.6 | 2.6 | 15.6 | 2.6 | | | |
| R49 | | 47 | 0.158 | 1.000 | 10,225 | 1,618 | | | | 15.6 | 2.5 | 15.6 | 2.5 | | | |
| R50 | | 48 | 0.152 | 1.000 | 10,225 | 1,556 | | | | 15.6 | 2.4 | 15.6 | 2.4 | | | |
| R51 | | 49 | 0.146 | 1.000 | 10,225 | 1,496 | | | | 15.6 | 2.3 | 15.6 | 2.3 | | | |
| R52 | | 50 | 0.141 | 1.000 | 10,225 | 1,439 | | | | 15.6 | 2.2 | 15.6 | 2.2 | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 10,225 | 1,383 | | | | 15.6 | 2.1 | 15.6 | 2.1 | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 10,225 | 1,330 | | | | 15.6 | 2.0 | 15.6 | 2.0 | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 10,225 | 1,279 | | | | 15.6 | 2.0 | 15.6 | 2.0 | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 10,225 | 1,230 | | | | 15.6 | 1.9 | 15.6 | 1.9 | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 10,225 | 1,183 | | | | 15.6 | 1.8 | 15.6 | 1.8 | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 10,225 | 1,137 | | | | 15.6 | 1.7 | 15.6 | 1.7 | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 10,225 | 1,093 | | | | 15.6 | 1.7 | 15.6 | 1.7 | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 10,225 | 1,051 | | | | 15.6 | 1.6 | 15.6 | 1.6 | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 10,225 | 1,011 | | | | 15.6 | 1.5 | 15.6 | 1.5 | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 10,225 | 972 | | | | 15.6 | 1.5 | 15.6 | 1.5 | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 10,225 | 935 | | | | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 1.4 | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 10,225 | 899 | | | | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 1.4 | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 10,225 | 864 | | | | 15.6 | 1.3 | 15.6 | 1.3 | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 10,225 | 831 | | | | 15.6 | 1.3 | 15.6 | 1.3 | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 10,225 | 799 | | | | 15.6 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 10,225 | 768 | | | | 15.6 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 10,225 | 739 | | | | 15.6 | 1.1 | 15.6 | 1.1 | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 10,225 | 710 | | | | 15.6 | 1.1 | 15.6 | 1.1 | | | | |
| R71 | 69 | 0.067 | 1.000 | 10,225 | 683 | | | | 15.6 | 1.0 | 15.6 | 1.0 | | | | |
| R72 | 70 | 0.064 | 1.000 | 10,225 | 657 | | | | 15.6 | 1.0 | 15.6 | 1.0 | | | | |
| 合 計 | | | | | 591,623 | 142,421 | 222 | B = 142,643 | 7,857 | 5,509 | 801.8 | 164.2 | 8,659 | C = 5,673 | B/C = 25.1 | B-C = 136,970 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：残事業 感度分析 工期+10%)

| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レー ター | 便 益 | | | 費 用 | | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | | |
|-----------------------|-----|-------|-----------------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|-------|-------|--------|--------------|--------------|---------|----------|-------------|
| | | | | | 便益① | | 残存価値 ② | 計 ①+② | 建設費③ | | 維持管理費④ | | | ③+④ | | |
| | | | | | 便益 | 現在価値 | | | 費用 | 現在価値 | 費用 | | | 現在価値 | 費用 | 現在価値 |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 整備期間 22年 | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 0 | 0 | | | 353 | 339 | 0.2 | 0.2 | 353.2 | 339.6 | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 0 | 0 | | | 351 | 325 | 0.2 | 0.2 | 351.2 | 324.7 | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 0 | 0 | | | 347 | 308 | 0.2 | 0.2 | 347.2 | 308.7 | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 0 | 0 | | | 341 | 291 | 0.2 | 0.2 | 341.2 | 291.7 | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 0 | 0 | | | 335 | 275 | 0.2 | 0.2 | 335.2 | 275.5 | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 0 | 0 | | | 340 | 269 | 0.2 | 0.2 | 340.2 | 268.9 | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 0 | 0 | | | 391 | 297 | 0.2 | 0.2 | 391.2 | 297.3 | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 0 | 0 | | | 492 | 359 | 0.2 | 0.1 | 492.2 | 359.6 | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 0 | 0 | | | 588 | 413 | 0.2 | 0.1 | 588.2 | 413.3 | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 0 | 0 | | | 681 | 460 | 0.2 | 0.1 | 681.2 | 460.2 | | |
| | R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 0 | 0 | | | 702 | 456 | 0.2 | 0.1 | 702.2 | 456.1 | | |
| | R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 0 | 0 | | | 352 | 220 | 1.1 | 0.7 | 353.1 | 220.5 | | |
| | R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 0 | 0 | | | 355 | 213 | 1.1 | 0.7 | 356.1 | 213.9 | | |
| | R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 0 | 0 | | | 278 | 161 | 1.1 | 0.6 | 279.1 | 161.2 | | |
| | R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 10,503 | 5,832 | | | 262 | 145 | 1.2 | 0.7 | 263.2 | 146.1 | | |
| | R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 10,933 | 5,837 | | | 259 | 138 | 1.4 | 0.7 | 260.4 | 139.0 | | |
| | R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 10,933 | 5,613 | | | 259 | 133 | 1.4 | 0.7 | 260.4 | 133.7 | | |
| | R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 11,276 | 5,566 | | | 267 | 132 | 2.8 | 1.4 | 269.8 | 133.2 | | |
| | R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 11,276 | 5,352 | | | 265 | 126 | 2.8 | 1.3 | 267.8 | 127.1 | | |
| | R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 11,276 | 5,146 | | | 255 | 116 | 2.8 | 1.3 | 257.8 | 117.7 | | |
| | R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 11,285 | 4,952 | | | 204 | 90 | 4.2 | 1.8 | 208.2 | 91.4 | | |
| | R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 11,285 | 4,762 | | | 204 | 86 | 4.2 | 1.8 | 208.2 | 87.9 | | |
| 施設完成後の 評価期間 50年 | R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 11,294 | 4,582 | | | | | 15.7 | 6.4 | 15.7 | 6.4 | | |
| | R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 11,294 | 4,406 | | | | | 15.7 | 6.1 | 15.7 | 6.1 | | |
| | R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 11,294 | 4,237 | | | | | 15.7 | 5.9 | 15.7 | 5.9 | | |
| | R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 11,294 | 4,074 | | | | | 15.7 | 5.7 | 15.7 | 5.7 | | |
| | R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 11,294 | 3,917 | | | | | 15.7 | 5.4 | 15.7 | 5.4 | | |
| | R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 11,294 | 3,766 | | | | | 15.7 | 5.2 | 15.7 | 5.2 | | |
| | R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 11,294 | 3,621 | | | | | 15.7 | 5.0 | 15.7 | 5.0 | | |
| | R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 11,294 | 3,482 | | | | | 15.7 | 4.8 | 15.7 | 4.8 | | |
| | R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 11,294 | 3,348 | | | | | 15.7 | 4.7 | 15.7 | 4.7 | | |
| | R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 11,294 | 3,219 | | | | | 15.7 | 4.5 | 15.7 | 4.5 | | |
| | R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 11,294 | 3,096 | | | | | 15.7 | 4.3 | 15.7 | 4.3 | | |
| | R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 11,294 | 2,977 | | | | | 15.7 | 4.1 | 15.7 | 4.1 | | |
| | R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 11,294 | 2,862 | | | | | 15.7 | 4.0 | 15.7 | 4.0 | | |
| | R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 11,294 | 2,752 | | | | | 15.7 | 3.8 | 15.7 | 3.8 | | |
| | R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 11,294 | 2,646 | | | | | 15.7 | 3.7 | 15.7 | 3.7 | | |
| | R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 11,294 | 2,544 | | | | | 15.7 | 3.5 | 15.7 | 3.5 | | |
| | R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 11,294 | 2,447 | | | | | 15.7 | 3.4 | 15.7 | 3.4 | | |
| | R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 11,294 | 2,352 | | | | | 15.7 | 3.3 | 15.7 | 3.3 | | |
| | R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 11,294 | 2,262 | | | | | 15.7 | 3.1 | 15.7 | 3.1 | | |
| | R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 11,294 | 2,175 | | | | | 15.7 | 3.0 | 15.7 | 3.0 | | |
| | R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 11,294 | 2,091 | | | | | 15.7 | 2.9 | 15.7 | 2.9 | | |
| | R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 11,294 | 2,011 | | | | | 15.7 | 2.8 | 15.7 | 2.8 | | |
| | R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 11,294 | 1,934 | | | | | 15.7 | 2.7 | 15.7 | 2.7 | | |
| | R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 11,294 | 1,859 | | | | | 15.7 | 2.6 | 15.7 | 2.6 | | |
| | R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 11,294 | 1,788 | | | | | 15.7 | 2.5 | 15.7 | 2.5 | | |
| | R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 11,294 | 1,719 | | | | | 15.7 | 2.4 | 15.7 | 2.4 | | |
| | R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 11,294 | 1,653 | | | | | 15.7 | 2.3 | 15.7 | 2.3 | | |
| | R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 11,294 | 1,589 | | | | | 15.7 | 2.2 | 15.7 | 2.2 | | |
| | R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 11,294 | 1,528 | | | | | 15.7 | 2.1 | 15.7 | 2.1 | | |
| | R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 11,294 | 1,469 | | | | | 15.7 | 2.0 | 15.7 | 2.0 | | |
| | R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 11,294 | 1,413 | | | | | 15.7 | 2.0 | 15.7 | 2.0 | | |
| | R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 11,294 | 1,358 | | | | | 15.7 | 1.9 | 15.7 | 1.9 | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 11,294 | 1,306 | | | | | 15.7 | 1.8 | 15.7 | 1.8 | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 11,294 | 1,256 | | | | | 15.7 | 1.7 | 15.7 | 1.7 | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 11,294 | 1,208 | | | | | 15.7 | 1.7 | 15.7 | 1.7 | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 11,294 | 1,161 | | | | | 15.7 | 1.6 | 15.7 | 1.6 | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 11,294 | 1,117 | | | | | 15.7 | 1.6 | 15.7 | 1.6 | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 11,294 | 1,074 | | | | | 15.7 | 1.5 | 15.7 | 1.5 | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 11,294 | 1,032 | | | | | 15.7 | 1.4 | 15.7 | 1.4 | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 11,294 | 993 | | | | | 15.7 | 1.4 | 15.7 | 1.4 | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 11,294 | 954 | | | | | 15.7 | 1.3 | 15.7 | 1.3 | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 11,294 | 918 | | | | | 15.7 | 1.3 | 15.7 | 1.3 | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 11,294 | 882 | | | | | 15.7 | 1.2 | 15.7 | 1.2 | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 11,294 | 848 | | | | | 15.7 | 1.2 | 15.7 | 1.2 | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 11,294 | 816 | | | | | 15.7 | 1.1 | 15.7 | 1.1 | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 11,294 | 784 | | | | | 15.7 | 1.1 | 15.7 | 1.1 | | | |
| R71 | 69 | 0.067 | 1.000 | 11,294 | 754 | | | | | 15.7 | 1.0 | 15.7 | 1.0 | | | |
| R72 | 70 | 0.064 | 1.000 | 11,294 | 725 | | | | | 15.7 | 1.0 | 15.7 | 1.0 | | | |
| R73 | 71 | 0.062 | 1.000 | 11,294 | 697 | | | | | 15.7 | 1.0 | 15.7 | 1.0 | | | |
| R74 | 72 | 0.059 | 1.000 | 11,294 | 671 | | | | | 15.7 | 0.9 | 15.7 | 0.9 | | | |
| 合 計 | | | | | 653,467 | 145,433 | 205 | B=145,638 | 7,881 | 5,352 | 811.3 | 155.6 | 8,692 | C=5,508 | B/C=26.4 | B-C=140,130 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

様式-5 (費用対便益：残事業 感度分析 工期-10%)

| 年次 | 年度 | t | 割引率 (r=0.04) | デフ レー ター | 水系名：土器川 | | | | 河川名：土器川 | | | | (百万円) | | | |
|-----------------------|-----|-------|-----------------|----------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|-------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | | | | | 便 益 | | | 計 ①+② | 費 用 | | | | 費用便益比 B/C | 純現在価値 B-C | | |
| | | | | | 便益① | 残存価値 ② | 費用 | | 建設費③ | 維持管理費④ | ③+④ | | | | | |
| 基準 | R2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 便益 | 現在価値 | | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | 費用 | 現在価値 | | | |
| 整備期間 18年 | R3 | 1 | 0.962 | 1.000 | 0 | 0 | | 431 | 414 | 0.2 | 0.2 | 431.2 | 414.6 | | | |
| | R4 | 2 | 0.925 | 1.000 | 0 | 0 | | 428 | 396 | 0.2 | 0.2 | 428.2 | 395.9 | | | |
| | R5 | 3 | 0.889 | 1.000 | 0 | 0 | | 420 | 373 | 0.2 | 0.2 | 420.2 | 373.6 | | | |
| | R6 | 4 | 0.855 | 1.000 | 0 | 0 | | 411 | 351 | 0.2 | 0.2 | 411.2 | 351.5 | | | |
| | R7 | 5 | 0.822 | 1.000 | 0 | 0 | | 415 | 341 | 0.2 | 0.2 | 415.2 | 341.3 | | | |
| | R8 | 6 | 0.790 | 1.000 | 0 | 0 | | 506 | 400 | 0.2 | 0.2 | 506.2 | 400.1 | | | |
| | R9 | 7 | 0.760 | 1.000 | 0 | 0 | | 652 | 495 | 0.2 | 0.2 | 652.2 | 495.6 | | | |
| | R10 | 8 | 0.731 | 1.000 | 0 | 0 | | 802 | 586 | 0.2 | 0.1 | 802.2 | 586.2 | | | |
| | R11 | 9 | 0.703 | 1.000 | 0 | 0 | | 875 | 615 | 0.2 | 0.1 | 875.2 | 614.9 | | | |
| | R12 | 10 | 0.676 | 1.000 | 0 | 0 | | 412 | 278 | 1.1 | 0.7 | 413.1 | 279.1 | | | |
| | R13 | 11 | 0.650 | 1.000 | 10,503 | 6,823 | | 405 | 263 | 1.2 | 0.8 | 406.2 | 263.9 | | | |
| | R14 | 12 | 0.625 | 1.000 | 10,933 | 6,829 | | 315 | 197 | 1.4 | 0.9 | 316.4 | 197.6 | | | |
| | R15 | 13 | 0.601 | 1.000 | 10,933 | 6,566 | | 318 | 191 | 1.4 | 0.8 | 319.4 | 191.8 | | | |
| | R16 | 14 | 0.577 | 1.000 | 11,276 | 6,512 | | 318 | 184 | 2.8 | 1.6 | 320.8 | 185.3 | | | |
| | R17 | 15 | 0.555 | 1.000 | 11,276 | 6,261 | | 325 | 180 | 2.8 | 1.6 | 327.8 | 182.0 | | | |
| | R18 | 16 | 0.534 | 1.000 | 11,276 | 6,020 | | 323 | 172 | 2.8 | 1.5 | 325.8 | 173.9 | | | |
| | R19 | 17 | 0.513 | 1.000 | 11,285 | 5,793 | | 261 | 134 | 4.2 | 2.2 | 265.2 | 136.1 | | | |
| | R20 | 18 | 0.494 | 1.000 | 11,285 | 5,571 | | 237 | 117 | 4.2 | 2.1 | 241.2 | 119.1 | | | |
| 施設完成後の 評価期間 50年 | R21 | 19 | 0.475 | 1.000 | 11,294 | 5,361 | | | | 15.7 | 7.5 | 15.7 | 7.5 | | | |
| | R22 | 20 | 0.456 | 1.000 | 11,294 | 5,154 | | | | 15.7 | 7.2 | 15.7 | 7.2 | | | |
| | R23 | 21 | 0.439 | 1.000 | 11,294 | 4,956 | | | | 15.7 | 6.9 | 15.7 | 6.9 | | | |
| | R24 | 22 | 0.422 | 1.000 | 11,294 | 4,766 | | | | 15.7 | 6.6 | 15.7 | 6.6 | | | |
| | R25 | 23 | 0.406 | 1.000 | 11,294 | 4,582 | | | | 15.7 | 6.4 | 15.7 | 6.4 | | | |
| | R26 | 24 | 0.390 | 1.000 | 11,294 | 4,406 | | | | 15.7 | 6.1 | 15.7 | 6.1 | | | |
| | R27 | 25 | 0.375 | 1.000 | 11,294 | 4,237 | | | | 15.7 | 5.9 | 15.7 | 5.9 | | | |
| | R28 | 26 | 0.361 | 1.000 | 11,294 | 4,074 | | | | 15.7 | 5.7 | 15.7 | 5.7 | | | |
| | R29 | 27 | 0.347 | 1.000 | 11,294 | 3,917 | | | | 15.7 | 5.4 | 15.7 | 5.4 | | | |
| | R30 | 28 | 0.333 | 1.000 | 11,294 | 3,766 | | | | 15.7 | 5.2 | 15.7 | 5.2 | | | |
| | R31 | 29 | 0.321 | 1.000 | 11,294 | 3,621 | | | | 15.7 | 5.0 | 15.7 | 5.0 | | | |
| | R32 | 30 | 0.308 | 1.000 | 11,294 | 3,482 | | | | 15.7 | 4.8 | 15.7 | 4.8 | | | |
| | R33 | 31 | 0.296 | 1.000 | 11,294 | 3,348 | | | | 15.7 | 4.7 | 15.7 | 4.7 | | | |
| | R34 | 32 | 0.285 | 1.000 | 11,294 | 3,219 | | | | 15.7 | 4.5 | 15.7 | 4.5 | | | |
| | R35 | 33 | 0.274 | 1.000 | 11,294 | 3,096 | | | | 15.7 | 4.3 | 15.7 | 4.3 | | | |
| | R36 | 34 | 0.264 | 1.000 | 11,294 | 2,977 | | | | 15.7 | 4.1 | 15.7 | 4.1 | | | |
| | R37 | 35 | 0.253 | 1.000 | 11,294 | 2,862 | | | | 15.7 | 4.0 | 15.7 | 4.0 | | | |
| | R38 | 36 | 0.244 | 1.000 | 11,294 | 2,752 | | | | 15.7 | 3.8 | 15.7 | 3.8 | | | |
| | R39 | 37 | 0.234 | 1.000 | 11,294 | 2,646 | | | | 15.7 | 3.7 | 15.7 | 3.7 | | | |
| | R40 | 38 | 0.225 | 1.000 | 11,294 | 2,544 | | | | 15.7 | 3.5 | 15.7 | 3.5 | | | |
| | R41 | 39 | 0.217 | 1.000 | 11,294 | 2,447 | | | | 15.7 | 3.4 | 15.7 | 3.4 | | | |
| | R42 | 40 | 0.208 | 1.000 | 11,294 | 2,352 | | | | 15.7 | 3.3 | 15.7 | 3.3 | | | |
| | R43 | 41 | 0.200 | 1.000 | 11,294 | 2,262 | | | | 15.7 | 3.1 | 15.7 | 3.1 | | | |
| | R44 | 42 | 0.193 | 1.000 | 11,294 | 2,175 | | | | 15.7 | 3.0 | 15.7 | 3.0 | | | |
| | R45 | 43 | 0.185 | 1.000 | 11,294 | 2,091 | | | | 15.7 | 2.9 | 15.7 | 2.9 | | | |
| | R46 | 44 | 0.178 | 1.000 | 11,294 | 2,011 | | | | 15.7 | 2.8 | 15.7 | 2.8 | | | |
| | R47 | 45 | 0.171 | 1.000 | 11,294 | 1,934 | | | | 15.7 | 2.7 | 15.7 | 2.7 | | | |
| | R48 | 46 | 0.165 | 1.000 | 11,294 | 1,859 | | | | 15.7 | 2.6 | 15.7 | 2.6 | | | |
| | R49 | 47 | 0.158 | 1.000 | 11,294 | 1,788 | | | | 15.7 | 2.5 | 15.7 | 2.5 | | | |
| | R50 | 48 | 0.152 | 1.000 | 11,294 | 1,719 | | | | 15.7 | 2.4 | 15.7 | 2.4 | | | |
| R51 | 49 | 0.146 | 1.000 | 11,294 | 1,653 | | | | 15.7 | 2.3 | 15.7 | 2.3 | | | | |
| R52 | 50 | 0.141 | 1.000 | 11,294 | 1,589 | | | | 15.7 | 2.2 | 15.7 | 2.2 | | | | |
| R53 | 51 | 0.135 | 1.000 | 11,294 | 1,528 | | | | 15.7 | 2.1 | 15.7 | 2.1 | | | | |
| R54 | 52 | 0.130 | 1.000 | 11,294 | 1,469 | | | | 15.7 | 2.0 | 15.7 | 2.0 | | | | |
| R55 | 53 | 0.125 | 1.000 | 11,294 | 1,413 | | | | 15.7 | 2.0 | 15.7 | 2.0 | | | | |
| R56 | 54 | 0.120 | 1.000 | 11,294 | 1,358 | | | | 15.7 | 1.9 | 15.7 | 1.9 | | | | |
| R57 | 55 | 0.116 | 1.000 | 11,294 | 1,306 | | | | 15.7 | 1.8 | 15.7 | 1.8 | | | | |
| R58 | 56 | 0.111 | 1.000 | 11,294 | 1,256 | | | | 15.7 | 1.7 | 15.7 | 1.7 | | | | |
| R59 | 57 | 0.107 | 1.000 | 11,294 | 1,208 | | | | 15.7 | 1.7 | 15.7 | 1.7 | | | | |
| R60 | 58 | 0.103 | 1.000 | 11,294 | 1,161 | | | | 15.7 | 1.6 | 15.7 | 1.6 | | | | |
| R61 | 59 | 0.099 | 1.000 | 11,294 | 1,117 | | | | 15.7 | 1.6 | 15.7 | 1.6 | | | | |
| R62 | 60 | 0.095 | 1.000 | 11,294 | 1,074 | | | | 15.7 | 1.5 | 15.7 | 1.5 | | | | |
| R63 | 61 | 0.091 | 1.000 | 11,294 | 1,032 | | | | 15.7 | 1.4 | 15.7 | 1.4 | | | | |
| R64 | 62 | 0.088 | 1.000 | 11,294 | 993 | | | | 15.7 | 1.4 | 15.7 | 1.4 | | | | |
| R65 | 63 | 0.085 | 1.000 | 11,294 | 954 | | | | 15.7 | 1.3 | 15.7 | 1.3 | | | | |
| R66 | 64 | 0.081 | 1.000 | 11,294 | 918 | | | | 15.7 | 1.3 | 15.7 | 1.3 | | | | |
| R67 | 65 | 0.078 | 1.000 | 11,294 | 882 | | | | 15.7 | 1.2 | 15.7 | 1.2 | | | | |
| R68 | 66 | 0.075 | 1.000 | 11,294 | 848 | | | | 15.7 | 1.2 | 15.7 | 1.2 | | | | |
| R69 | 67 | 0.072 | 1.000 | 11,294 | 816 | | | | 15.7 | 1.1 | 15.7 | 1.1 | | | | |
| R70 | 68 | 0.069 | 1.000 | 11,294 | 784 | | | | 15.7 | 1.1 | 15.7 | 1.1 | | | | |
| 合計 | | | | | 653,467 | 170,138 | 240 | B=170,378 | 7,854 | 5,687 | 808.7 | 180.2 | 8,663 | C=5,887 | B/C=29.0 | B-C=164,511 |

注1) 整備期間の便益は、事業の進捗に応じた年便益を設定した。

事業費の内訳書

河川事業

| | |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 土器川直轄河川改修事業（全体事業費） |
|-----|--------------------|

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

| | | |
|------|----|-----|
| 評価年度 | R2 | 再評価 |
|------|----|-----|

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

| 区分 | 費目 | 工種 | 単位 | 数量 | 金額 (百万円) | 備考 | |
|---------|------|--------|-----------------|------|-------------|---|------|
| 工事費 | 本工事費 | | 式 | 1 | 6,922 | | |
| | | | 式 | 1 | 4,311 | | |
| | | 局所洗掘対策 | 式 | 1 | 1,449 | 土器箇所(左岸1.6k) | |
| | | 侵食対策 | m | 1400 | 671 | 飯野箇所(右岸1.0k～1.2k、3.9k～4.8k) | |
| | | 堤防拡幅 | m | 750 | 383 | 土器箇所(左岸1.6k、2.4k) 飯野箇所(右岸1.0k～1.2k、3.2k～3.4k) 長尾箇所(右岸16.6k～16.8k) | |
| | | 引堤 | m | 500 | 547 | 飯野箇所(右岸1.4k～2.0k) | |
| | | 河道掘削 | 千m ³ | 31 | 642 | 土器箇所(0.8k～1.4k) | |
| | | 河道拡幅 | 式 | 1 | 313 | 炭所東箇所(17.9k～18.8k) | |
| | | 河床低下対策 | 式 | 1 | 306 | 長尾箇所(14.8k～15.4k) | |
| | | | | | | | |
| | | 附帯工事費 | | 式 | 1 | 2,611 | |
| | | | 道路橋 | 橋 | 1 | 2,473 | 蓬莱橋 |
| | | | 清水川水門耐震対策 | 式 | 1 | 138 | 耐震対策 |
| | | | | | | | |
| 用地費及補償費 | | | 式 | 1 | 2,875 | | |
| | 用地費 | | 式 | 1 | 2,394 | | |
| | 補償費 | | 式 | 1 | 481 | | |
| 間接経費 | | | 式 | 1 | 2,802 | | |
| 工事諸費 | | | 式 | 1 | 3,019 | | |
| 事業費 計 | | | 式 | 1 | 15,618 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|---|-----|--|
| 維持管理費 | | | 式 | 1 | 898 | |
|-------|--|--|---|---|-----|--|

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

河川事業

| | |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 土器川直轄河川改修事業（残事業費） |
|-----|-------------------|

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

| | | |
|------|----|-----|
| 評価年度 | R2 | 再評価 |
|------|----|-----|

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

| 区分 | 費目 | 工種 | 単位 | 数量 | 金額 (百万円) | 備考 | |
|---------|-------|--------|----|-------|-------------|--|--|
| 工事費 | | | 式 | 1 | 3,740 | | |
| | 本工事費 | | | 式 | 1 | 1,267 | |
| | | 堤防拡幅 | m | 750 | 148 | 土器箇所(左岸2.4k) 飯野箇所(右岸3.2k~3.4k) 長尾箇所(右岸16.6k~16.8k) | |
| | | 引堤 | m | 500 | 500 | 飯野箇所(右岸1.4k~2.0k) | |
| | | 河道拡幅 | 式 | 1 | 313 | 炭所東箇所(17.9k~18.8k) | |
| | | 河床低下対策 | 式 | 1 | 306 | 長尾箇所(14.8k~15.4k) | |
| | | | | | | | |
| | 附帯工事費 | | | 式 | 1 | 2,473 | |
| 道路橋 | | 橋 | 1 | 2,473 | 蓬莱橋 | | |
| | | | | | | | |
| 用地費及補償費 | | | 式 | 1 | 1,945 | | |
| | 用地費 | | | 式 | 1 | 1,945 | |
| | 補償費 | | | 式 | 1 | 0 | |
| 間接経費 | | | 式 | 1 | 1,123 | | |
| 工事諸費 | | | 式 | 1 | 1,364 | | |
| 事業費 計 | | | 式 | 1 | 8,172 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|---|-----|--|
| 維持管理費 | | | 式 | 1 | 882 | |
|-------|--|--|---|---|-----|--|

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式-7 (費用便益分析チェックシート)

費用便益分析チェックシート

事業名: 土器川水系直轄河川改修事業

記入日: 令和2年10月

| 項 目 | | チェック欄 | 内 容 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---------|
| 共通事項 | 基準年度 | <input checked="" type="checkbox"/> | 令和2年度 | |
| | 評価対象期間 | <input checked="" type="checkbox"/> | H21年～R72年(整備期間H21年～R22年) | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | R3年～R72年(整備期間R3年～R22年) | |
| 氾濫原の資産等 | 人口・世帯数 | <input checked="" type="checkbox"/> | 国勢調査平成27年版 | |
| | 産業分類別従業者数 | <input checked="" type="checkbox"/> | 事業所・企業統計調査平成26年版 | |
| | 農漁家数 | <input checked="" type="checkbox"/> | 国勢調査平成27年版 | |
| | 延床面積 | <input checked="" type="checkbox"/> | メッシュデータ平成22年版 (財)日本建設情報総合センター | |
| | 水田・畑面積 | <input checked="" type="checkbox"/> | 数値地図平成28年版 (1/10細分区画土地利用データ) (財)日本地図センター | |
| | 資産評価単価 | 家屋1㎡評価額 | <input checked="" type="checkbox"/> | 令和2年4月版 |
| | | 家庭用品評価額 | <input checked="" type="checkbox"/> | 令和2年4月版 |
| | | 事業所償却・在庫資産 | <input checked="" type="checkbox"/> | 令和2年4月版 |
| | | 農漁家償却・在庫資産 | <input checked="" type="checkbox"/> | 令和2年4月版 |
| | | 農作物価格 | <input checked="" type="checkbox"/> | 令和2年4月版 |
| 被害率 | <input checked="" type="checkbox"/> | 「治水経済調査マニュアル(案)令和2年4月」P47～P54記載の被害率を適用しているか | | |
| 原単価 | <input checked="" type="checkbox"/> | 「治水経済調査マニュアル(案)令和2年4月」P55～P58記載の原単価を適用しているか | | |
| 算定条件 | 社会的割引率 | <input checked="" type="checkbox"/> | 費用について、評価時点の前後に社会的割引率4%を適用し現在価値化をしているか | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 便益について、評価時点の前後に社会的割引率4%を適用し現在価値化をしているか | |
| | デフレーター | <input checked="" type="checkbox"/> | 費用について、「治水経済調査マニュアル(案)巻末参考資料(最新版)」のデフレーターを用いて、物価変動を調整しているか | |
| | 感度分析 | <input checked="" type="checkbox"/> | 残事業、全体事業それぞれの費用便益分析において、残事業費(基準年度の翌年度以降の事業費)±10%の感度分析を行っているか | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 残事業、全体事業それぞれの費用便益分析において、残工期(基準年度の翌年度以降の工期)±10%の感度分析を行っているか | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 残事業、全体事業それぞれの費用便益分析において、資産±10%の感度分析を行っているか | | |
| その他 | [上記によらない場合、その理由及び適用した資料等を記述すること] | | | |
