

仁淀川床上浸水対策特別緊急事業  
(宇治川)  
事後評価 (参考資料)


令和5年9月8日

国土交通省 四国地方整備局

## ■費用便益比算出資料

様式—1	氾濫ブロック分割	1
様式—2	資産データ	2
様式—3	被害額	3
様式—4	年平均被害軽減期待額	7
様式—5	費用対便益	8
様式—6	事業費の内訳書	9

## 様式—1 氾濫ブロック分割

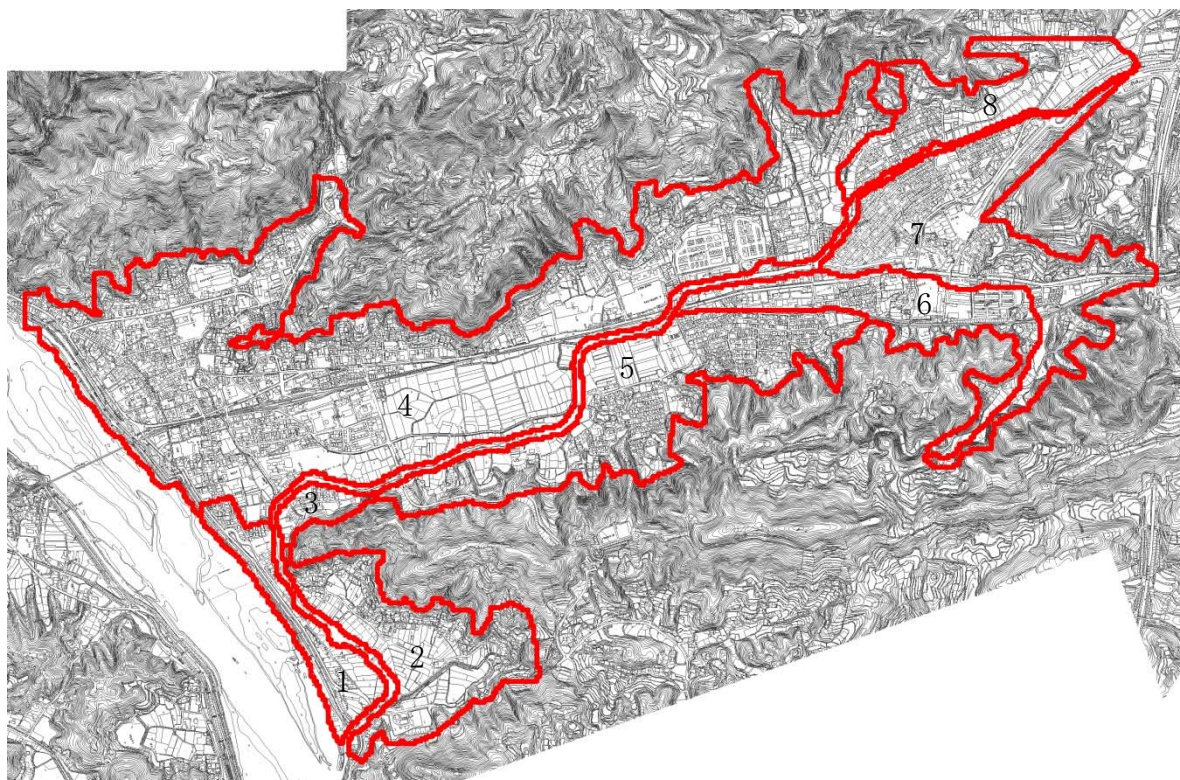

各ブロックの概要は以下のとおりである。

ブロック	特徴
ブロック1	早稲川を氾濫流の分断点とし、早稲川流域を境に、下流部右岸は、仁淀川の合流点までほぼ平坦な地形となっている。
ブロック2	左岸0.8k付近において山が迫り出しており、氾濫流の分断点とし、下流部は、仁淀川の合流点までほぼ平坦な地形となっている。
ブロック3	背後の山地と迫り出している尾根に囲まれた平地部である。
ブロック4	いの町中心部と枝川地区の右岸部の平地部である。ブロック上流端は地盤高が高く、氾濫流の分断点となる。
ブロック5	JR土讃線盛土と1.6k付近の迫り出している尾根に囲まれた平地部である。
ブロック6	上流は天神ヶ谷川と下流のJR土讃線盛土に挟まれた平地部である。
ブロック7	宇治川と天神ヶ谷川に囲まれた平地部である。堤防は盛土形式となっている。
ブロック8	周囲を山地と下流部の地盤が高い場所に囲まれた平地部である。

## 様式一2 資産データ

様式一2 資産データ 水系名：仁淀川水系 河川名：宇治川 国勢調査年：平成27年 事業所統計調査年：平成26年

汎濫ブロック	ブロック面積 (ha)	一般資産等基礎数量										一般資産額 (百万円)					一般資産額等合計	備考		
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (産業分類別に算出) (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲			畑作物	小計
ブロック1	16	156	67	61	1	2	2	3	3,227	845	291	220	3	1	4,587	2	43	45	4,632	
ブロック2	37	311	124	40	3	4	12	2	8,164	1,556	95	97	7	2	9,921	11	25	36	9,956	
ブロック3	5	117	45	17	0	1	0	0	1,987	559	89	65	0	0	2,700	0	0	0	2,700	
ブロック4	208	4,993	1,978	3,011	44	36	32	3	76,664	24,803	9,093	5,454	96	25	116,137	27	52	79	116,216	
ブロック5	56	1,458	578	221	18	10	10	0	21,648	7,247	585	415	39	10	29,944	9	0	9	29,953	
ブロック6	29	871	371	229	8	6	1	0	13,316	4,647	539	387	17	5	18,911	1	0	1	18,912	
ブロック7	57	2,004	821	292	32	12	1	4	26,382	10,294	867	612	69	18	38,244	1	67	68	38,312	
ブロック8	28	513	199	19	16	3	5	9	5,609	2,489	108	66	34	9	8,314	4	142	147	8,461	
合計	437	10,424	4,183	3,890	122	73	63	20	156,998	52,439	11,668	7,315	267	70	228,757	55	330	385	229,142	

# 様式—3 被害額

## I. 事業実施前

様式—3 被害額 (事業実施前) 水系名: 仁淀川水系 河川名: 宇治川 流量規模: 1/2 (単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式—3 被害額 (事業実施前) 水系名: 仁淀川水系 河川名: 宇治川 流量規模: 1/3 (単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
ブロック4	1,108	407	183	92	1	0	1,791	4	7	11	1,647	176	106	56	161	34	25	0	397	3,845	
ブロック5	617	315	26	18	0	0	977	1	0	1	791	25	44	26	70	5	20	0	119	1,888	
ブロック6	167	45	9	5	0	0	226	0	0	0	169	13	19	9	28	3	3	0	46	441	
ブロック7	478	158	24	14	0	0	675	0	7	7	528	29	59	30	90	7	10	0	135	1,345	
ブロック8	237	172	8	4	1	0	422	0	20	20	410	3	20	12	32	1	11	0	47	899	
合計	2,608	1,097	250	132	2	1	4,090	5	34	39	3,544	245	248	133	381	49	68	0	744	8,418	

様式—3 被害額 (事業実施前) 水系名: 仁淀川水系 河川名: 宇治川 流量規模: 1/5 (単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
ブロック4	1,214	460	200	101	1	0	1,976	4	7	11	1,803	189	114	60	173	37	29	0	428	4,219	
ブロック5	723	403	34	23	0	0	1,184	1	0	1	947	29	50	29	79	6	25	0	139	2,271	
ブロック6	175	47	9	5	0	0	236	0	0	0	176	13	19	10	29	3	3	0	48	460	
ブロック7	738	370	41	26	1	0	1,177	0	8	8	902	39	73	41	114	8	23	0	184	2,272	
ブロック8	247	185	9	4	1	0	446	0	21	21	432	3	20	12	32	1	12	0	48	947	
合計	3,098	1,465	292	160	3	1	5,019	5	36	41	4,261	273	276	152	428	55	91	0	848	10,169	

様式—3 被害額 (事業実施前) 水系名: 仁淀川水系 河川名: 宇治川 流量規模: 1/8 (単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
ブロック4	1,274	489	212	108	1	0	2,083	4	8	12	1,900	198	118	62	180	39	30	0	447	4,443	
ブロック5	953	599	49	32	1	0	1,634	1	0	1	1,283	37	61	37	97	9	37	0	181	3,099	
ブロック6	185	49	9	5	0	0	249	0	0	0	186	14	21	10	31	3	3	0	51	486	
ブロック7	854	471	50	32	1	0	1,408	0	8	8	1,074	44	79	45	125	9	29	0	207	2,697	
ブロック8	261	206	9	4	1	0	481	0	22	22	462	3	21	13	34	1	13	0	50	1,016	
合計	3,527	1,813	329	182	3	2	5,856	5	38	43	4,905	296	300	168	467	61	113	0	937	11,740	

資産評価単価: 令和5年6月版 令和3年評価

様式-3 被害額（事業実施前） 水系名：仁淀川水系 河川名：宇治川 流量規模：1/10 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
ブロック4	1,298	499	216	110	1	0	2,124	4	8	12	1,933	201	120	63	184	39	31	0	455	4,524		
ブロック5	988	624	51	34	1	0	1,698	1	0	1	1,334	38	62	38	100	9	39	0	186	3,219		
ブロック6	227	68	11	6	0	0	312	0	0	0	233	15	23	12	34	3	4	0	57	603		
ブロック7	1,625	1,334	123	78	4	2	3,166	0	8	8	2,379	75	117	71	188	20	83	0	367	5,920		
ブロック8	329	298	13	6	2	1	648	0	22	22	589	3	24	16	40	1	19	0	63	1,322		
合計	4,467	2,824	413	234	7	3	7,948	5	38	44	6,469	333	346	200	546	73	176	0	1,128	15,588		

様式-3 被害額（事業実施前） 水系名：仁淀川水系 河川名：宇治川 流量規模：1/20 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
ブロック4	1,442	598	259	133	1	0	2,432	5	8	13	2,202	220	129	69	197	43	37	0	497	5,144		
ブロック5	1,130	729	64	42	1	0	1,966	1	0	1	1,535	45	68	42	110	11	45	0	211	3,713		
ブロック6	284	99	14	8	0	0	406	0	0	0	302	18	26	14	39	4	6	0	67	775		
ブロック7	2,181	1,874	142	91	6	2	4,295	0	9	9	3,218	82	144	88	233	24	117	0	456	7,977		
ブロック8	374	342	15	7	2	1	741	0	23	23	662	4	28	17	45	1	21	0	71	1,498		
合計	5,411	3,641	493	281	10	4	9,840	6	40	46	7,920	369	394	230	624	83	227	0	1,302	19,108		

様式-3 被害額（事業実施前） 水系名：仁淀川水系 河川名：宇治川 流量規模：1/30 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
ブロック4	1,496	626	270	139	1	0	2,532	5	9	13	2,281	227	132	71	203	44	39	0	513	5,339		
ブロック5	1,243	829	71	47	1	1	2,192	1	0	1	1,704	49	74	45	119	12	52	0	232	4,128		
ブロック6	275	94	14	8	0	0	391	0	0	0	292	18	26	14	40	4	6	0	68	751		
ブロック7	2,257	1,986	157	100	6	3	4,509	0	9	9	3,377	88	150	92	242	27	124	0	481	8,376		
ブロック8	453	424	18	9	3	1	908	0	24	25	791	5	34	21	55	2	26	0	89	1,813		
合計	5,725	3,960	529	302	11	5	10,532	6	41	48	8,446	387	416	243	659	89	247	0	1,382	20,407		

資産評価単価：令和5年6月版 令和3年評価

## II. 事業実施後

様式-3 被害額（事業実施後） 水系名：仁淀川水系 河川名：宇治川 流量規模：1/2 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額（事業実施後） 水系名：仁淀川水系 河川名：宇治川 流量規模：1/3 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
ブロック4	1,108	407	183	92	1	0	1,791	4	7	11	1,647	176	106	56	161	34	25	0	397	3,845		
ブロック5	617	315	26	18	0	0	977	1	0	1	791	25	44	26	70	5	20	0	119	1,888		
ブロック6	167	45	9	5	0	0	226	0	0	0	169	13	19	9	28	3	3	0	46	441		
ブロック7	478	158	24	14	0	0	675	0	7	7	528	29	59	30	90	7	10	0	135	1,345		
ブロック8	237	172	8	4	1	0	422	0	20	20	410	3	20	12	32	1	11	0	47	899		
合計	2,608	1,097	250	132	2	1	4,090	5	34	39	3,544	245	248	133	381	49	68	0	744	8,418		

様式-3 被害額（事業実施後） 水系名：仁淀川水系 河川名：宇治川 流量規模：1/5 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
ブロック4	1,207	456	199	101	1	0	1,964	4	7	11	1,794	187	113	59	172	36	28	0	424	4,193		
ブロック5	712	402	33	23	0	0	1,170	1	0	1	938	29	48	29	77	6	25	0	137	2,246		
ブロック6	171	45	9	5	0	0	229	0	0	0	171	13	19	10	29	3	3	0	47	447		
ブロック7	735	367	41	26	1	0	1,171	0	8	8	897	39	73	41	113	8	23	0	183	2,259		
ブロック8	244	183	8	4	1	0	440	0	21	21	427	3	20	12	32	1	11	0	47	936		
合計	3,068	1,453	290	159	3	1	4,974	5	36	41	4,227	271	273	150	423	54	91	0	838	10,081		

様式-3 被害額（事業実施後） 水系名：仁淀川水系 河川名：宇治川 流量規模：1/8 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
ブロック4	1,263	484	210	107	1	0	2,065	4	8	12	1,885	195	117	62	179	38	30	0	442	4,405		
ブロック5	944	600	49	32	1	0	1,627	1	0	1	1,277	37	60	36	96	9	37	0	180	3,084		
ブロック6	181	48	9	5	0	0	243	0	0	0	181	14	20	10	30	3	3	0	50	474		
ブロック7	817	438	47	31	1	0	1,334	0	8	8	1,019	43	78	44	122	9	27	0	201	2,562		
ブロック8	258	205	9	4	1	0	478	0	21	22	459	3	21	13	34	1	13	0	50	1,010		
合計	3,463	1,776	324	179	3	2	5,746	5	38	43	4,823	292	296	165	461	60	111	0	923	11,534		

資産評価単価：令和5年6月版 令和3年評価

様式-3 被害額（事業実施後） 水系名：仁淀川水系 河川名：宇治川 流量規模：1/10 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
ブロック4	1,293	497	215	110	1	0	2,116	4	8	12	1,927	200	120	63	183	39	31	0	453	4,509	
ブロック5	984	624	51	34	1	0	1,694	1	0	1	1,329	38	62	38	99	9	39	0	186	3,210	
ブロック6	189	50	9	5	0	0	254	0	0	0	190	14	21	11	32	3	3	0	52	496	
ブロック7	834	445	48	31	1	0	1,360	0	8	8	1,038	43	79	45	124	9	28	0	204	2,610	
ブロック8	265	210	9	5	1	0	490	0	22	22	470	3	21	13	35	1	13	0	52	1,034	
合計	3,565	1,826	333	185	3	2	5,914	5	38	43	4,955	299	303	169	473	61	114	0	948	11,859	

様式-3 被害額（事業実施後） 水系名：仁淀川水系 河川名：宇治川 流量規模：1/20 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
ブロック4	1,440	596	258	133	1	0	2,429	5	8	13	2,199	219	128	69	197	43	37	0	496	5,137	
ブロック5	1,129	728	64	42	1	0	1,965	1	0	1	1,535	45	68	42	110	11	45	0	211	3,711	
ブロック6	232	66	12	7	0	0	317	0	0	0	236	17	25	13	38	4	4	0	63	616	
ブロック7	2,141	1,848	139	90	6	2	4,227	0	9	9	3,167	81	143	88	231	24	115	0	450	7,853	
ブロック8	365	335	14	7	2	1	724	0	23	23	650	4	27	17	44	1	21	0	70	1,467	
合計	5,307	3,574	488	278	9	4	9,661	6	40	46	7,786	367	391	228	619	82	223	0	1,290	18,784	

様式-3 被害額（事業実施後） 水系名：仁淀川水系 河川名：宇治川 流量規模：1/30 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
ブロック4	1,490	620	268	138	1	0	2,516	5	9	13	2,269	226	132	71	203	44	39	0	511	5,310	
ブロック5	1,243	828	71	46	1	1	2,190	1	0	1	1,703	49	74	45	119	12	52	0	232	4,126	
ブロック6	274	94	14	8	0	0	390	0	0	0	291	18	26	14	40	4	6	0	68	748	
ブロック7	2,159	1,869	143	92	6	3	4,271	0	9	9	3,200	82	145	88	233	24	116	0	456	7,936	
ブロック8	406	372	16	8	2	1	805	0	23	24	713	4	31	19	50	2	23	0	79	1,620	
合計	5,572	3,783	511	291	10	4	10,172	6	41	47	8,176	380	407	237	644	86	236	0	1,345	19,740	

資産評価単価：令和5年6月版 令和3年評価



## 様式—4 年平均被害軽減期待額

様式—4 年平均被害軽減期待額 水系名：仁淀川水系 河川名：宇治川 対象河道：平成26年 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害軽減額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/2	0.50000	0	0	0	—	—	—	0	
1/3	0.33333	8,418	8,418	0	0	0.167	0	0	
1/5	0.20000	10,169	10,081	88	44	0.133	6	6	
1/8	0.12500	11,740	11,534	206	147	0.075	11	17	
1/10	0.10000	15,588	11,859	3,729	1,967	0.025	49	66	
1/20	0.05000	19,108	18,784	324	2,026	0.050	101	167	
1/30	0.03333	20,407	19,740	667	496	0.017	8	176	

# 様式—5 費用対便益

様式—5		費用対便益 (全体事業)				水系名: 仁淀川水系 河川名: 宇治川						単位: 百万円					
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便 益		残存 価値 ②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
					便 益	現在価値 ①		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
基準	R 5	0	1.000	1.000													
H 3 0 年 — 整 備 期 間	H 27	-8	1.369	1.132	0	0		50	77	0.0	0.0	49.5	76.7				
	H 28	-7	1.316	1.124	0	0		387	573	0.0	0.0	387.3	573.0				
	H 29	-6	1.265	1.098	0	0		671	933	0.0	0.0	671.2	932.5				
	H 30	-5	1.217	1.061	0	0		667	861	0.0	0.0	666.7	860.5				
	R 1	-4	1.170	1.037	176	206				3.5	4.1	3.5	4.1				
施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 (50年)	R 2	-3	1.125	1.037	176	198				2.4	2.7	2.4	2.7				
	R 3	-2	1.082	1.000	176	190				2.3	2.5	2.3	2.5				
	R 4	-1	1.040	1.000	176	183				4.9	5.1	4.9	5.1				
	R 5	0	1.000	1.000	176	176				3.5	3.5	3.5	3.5				
	R 6	1	0.962	1.000	176	169				3.5	3.4	3.5	3.4				
	R 7	2	0.925	1.000	176	162				3.5	3.3	3.5	3.3				
	R 8	3	0.889	1.000	176	156				3.5	3.1	3.5	3.1				
	R 9	4	0.855	1.000	176	150				3.5	3.0	3.5	3.0				
	R 10	5	0.822	1.000	176	144				3.5	2.9	3.5	2.9				
	R 11	6	0.790	1.000	176	139				3.5	2.8	3.5	2.8				
	R 12	7	0.760	1.000	176	134				3.5	2.7	3.5	2.7				
	R 13	8	0.731	1.000	176	128				3.5	2.6	3.5	2.6				
	R 14	9	0.703	1.000	176	123				3.5	2.5	3.5	2.5				
	R 15	10	0.676	1.000	176	119				99.0	66.9	99.0	66.9				
	R 16	11	0.650	1.000	176	114				3.5	2.3	3.5	2.3				
	R 17	12	0.625	1.000	176	110				3.5	2.2	3.5	2.2				
	R 18	13	0.601	1.000	176	106				3.5	2.1	3.5	2.1				
	R 19	14	0.577	1.000	176	101				3.5	2.0	3.5	2.0				
	R 20	15	0.555	1.000	176	98				3.5	2.0	3.5	2.0				
	R 21	16	0.534	1.000	176	94				3.5	1.9	3.5	1.9				
	R 22	17	0.513	1.000	176	90				3.5	1.8	3.5	1.8				
	R 23	18	0.494	1.000	176	87				3.5	1.7	3.5	1.7				
	R 24	19	0.475	1.000	176	83				3.5	1.7	3.5	1.7				
	R 25	20	0.456	1.000	176	80				3.5	1.6	3.5	1.6				
	R 26	21	0.439	1.000	176	77				3.5	1.5	3.5	1.5				
	R 27	22	0.422	1.000	176	74				3.5	1.5	3.5	1.5				
	R 28	23	0.406	1.000	176	71				3.5	1.4	3.5	1.4				
	R 29	24	0.390	1.000	176	69				3.5	1.4	3.5	1.4				
	R 30	25	0.375	1.000	176	66				99.0	37.2	99.0	37.2				
	R 31	26	0.361	1.000	176	63				3.5	1.3	3.5	1.3				
R 32	27	0.347	1.000	176	61				3.5	1.2	3.5	1.2					
R 33	28	0.333	1.000	176	59				3.5	1.2	3.5	1.2					
R 34	29	0.321	1.000	176	56				3.5	1.1	3.5	1.1					
R 35	30	0.308	1.000	176	54				3.5	1.1	3.5	1.1					
R 36	31	0.296	1.000	176	52				3.5	1.0	3.5	1.0					
R 37	32	0.285	1.000	176	50				3.5	1.0	3.5	1.0					
R 38	33	0.274	1.000	176	48				3.5	1.0	3.5	1.0					
R 39	34	0.264	1.000	176	46				3.5	0.9	3.5	0.9					
R 40	35	0.253	1.000	176	45				3.5	0.9	3.5	0.9					
R 41	36	0.244	1.000	176	43				3.5	0.9	3.5	0.9					
R 42	37	0.234	1.000	176	41				3.5	0.8	3.5	0.8					
R 43	38	0.225	1.000	176	40				3.5	0.8	3.5	0.8					
R 44	39	0.217	1.000	176	38				3.5	0.8	3.5	0.8					
R 45	40	0.208	1.000	176	37				99.0	20.6	99.0	20.6					
R 46	41	0.200	1.000	176	35				3.5	0.7	3.5	0.7					
R 47	42	0.193	1.000	176	34				3.5	0.7	3.5	0.7					
R 48	43	0.185	1.000	176	33				3.5	0.7	3.5	0.7					
R 49	44	0.178	1.000	176	31				3.5	0.6	3.5	0.6					
R 50	45	0.171	1.000	176	30				3.5	0.6	3.5	0.6					
合 計					8.785	4.592	18	4.610	1.775	2.443	462	211	2.237	2.654	1.7	1.956	7.98%

## 様式—6 事業費の内訳書

### 事業費の内訳書

#### 河川事業

事業名	仁淀川床上浸水対策特別緊急事業(宇治川) (全体事業費)
-----	------------------------------

※ ( ) 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	R5	完了後の事後評価
------	----	----------

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費	本工事費		式	1	1603	
			式	1	1603	
		機場本体増設	式	1	358	
		流入水路	式	1	146	
		機場上屋	式	1	80	
		ポンプ設備	式	1	970	
		除塵機設備	式	1	30	燃料タンク
	場内整備	式	1	19		
	附帯工事費		式	1	0	
用地費及補償費			式	1	0	
	用地費		式	1	0	
	補償費		式	1	0	
間接経費			式	1	34	
工事諸費			式	1	259	
事業費 計			式	1	1896	

維持管理費			式	1	508	
-------	--	--	---	---	-----	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。
