

平成 30 年 7 月 8 日
大洲河川国道事務所
山鳥坂ダム工事事務所
野村ダム管理所

肱川・矢落川出水状況(速報版)

～大洲市内排水作業実施、

8 日朝の雨では越水無し(鹿野川ダム・野村ダムで洪水貯留)～

○大洲市内の浸水状況を解消するため肱川本川及び矢落川の 5 箇所に排水ポンプ車 7 台、照明車 1 台を配備し、夜間を徹して排水作業を行い、8 日朝まで排水作業を実施しました。

○7 日深夜から 8 日朝にかけて再度強い降雨がありましたが、鹿野川ダムと野村ダムで河川水を最大限貯留することにより下流への流量を低減させました。

・鹿野川ダム

鹿野川ダム地点時間最大雨量 24.5mm (8 日 5 時～6 時)

ダム流入量 最大 毎秒 1,199m³ 洪水貯留量 毎秒 200m³

ダム流下量 最大 毎秒 999m³

・野村ダム

野村ダム地点時間最大雨量 17.5mm (8 日 5 時～6 時)

ダム流入量 最大 毎秒 394m³ 洪水貯留量 毎秒 67m³

ダム流下量 最大 毎秒 327m³

○東大洲地区等の暫定堤防箇所からの再度の越流は発生しませんでした。

大洲第二水位観測所(肱川橋地点) 最高水位 4.00m (7 日 21 時～8 日 13 時)

(参考:はん濫危険水位 5.80m)

本施策は、四国圏広域地方計画「NO.1 南海トラフ地震を初めとする大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト」の取り組みに該当します。

問い合わせ先

国土交通省	四国地方整備局	大洲河川国道事務所	Tel: 0893-24-5185(代)
	副所長	阿部 勝義(アベ カツヨシ)	(内 204)
	◎ 事業対策官	原田 隆史(ハラダ タカシ)	(内 208)
国土交通省	四国地方整備局	山鳥坂ダム工事事務所	Tel: 0893-34-3000(代)
	副所長	石岡 克浩(イシオカ カツヒロ)	(内 204)
	◎ 事業計画課長	柴田 治信(シバタ ハルノブ)	(内 331)
国土交通省	四国地方整備局	野村ダム管理所	Tel: 0894-72-1211(代)
	管理所長	川西 浩二(カワニシ コウジ)	(内 201)
	◎ 専門官	酒井 博之(サカイ ヒロユキ)	(内 330)


◎: 主な問い合わせ先

■排水作業の実施状況




都谷川樋門での排水作業の状況

■鹿野川ダムの洪水貯留状況(7月7日21時~7月8日13時)

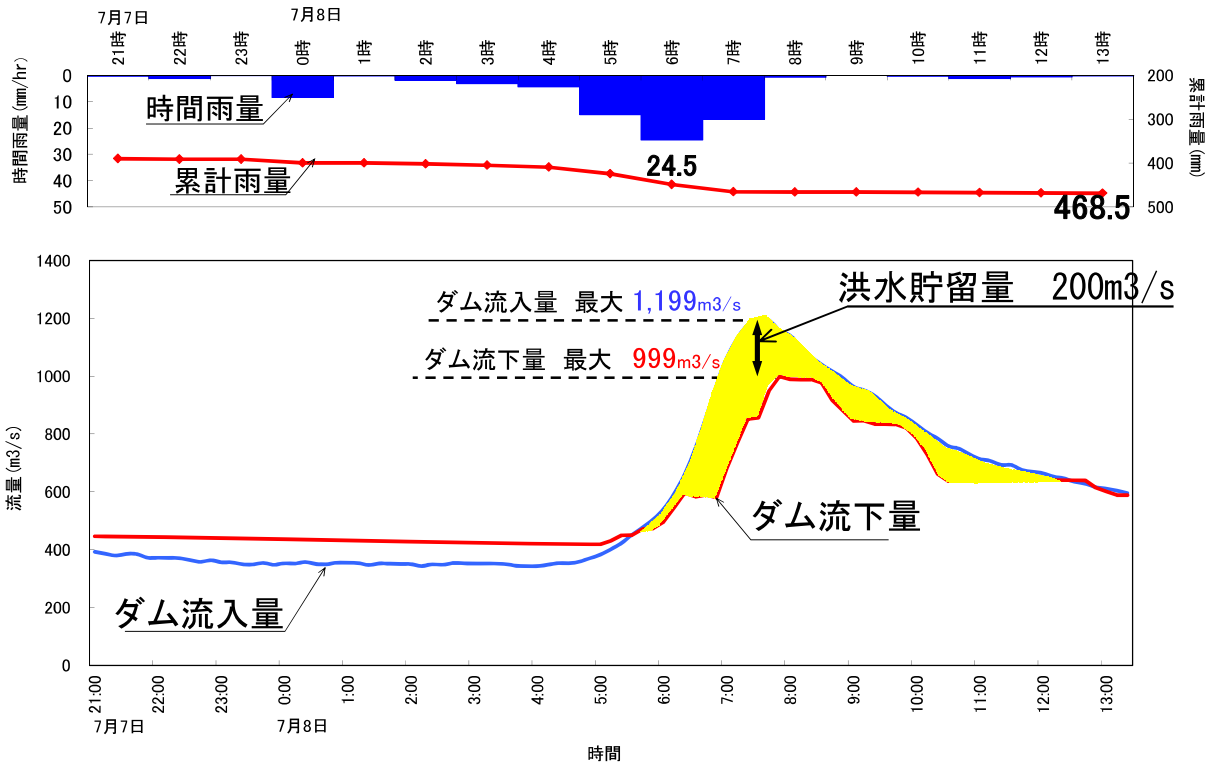

■野村ダムの洪水貯留状況(7月7日21時~7月8日13時)

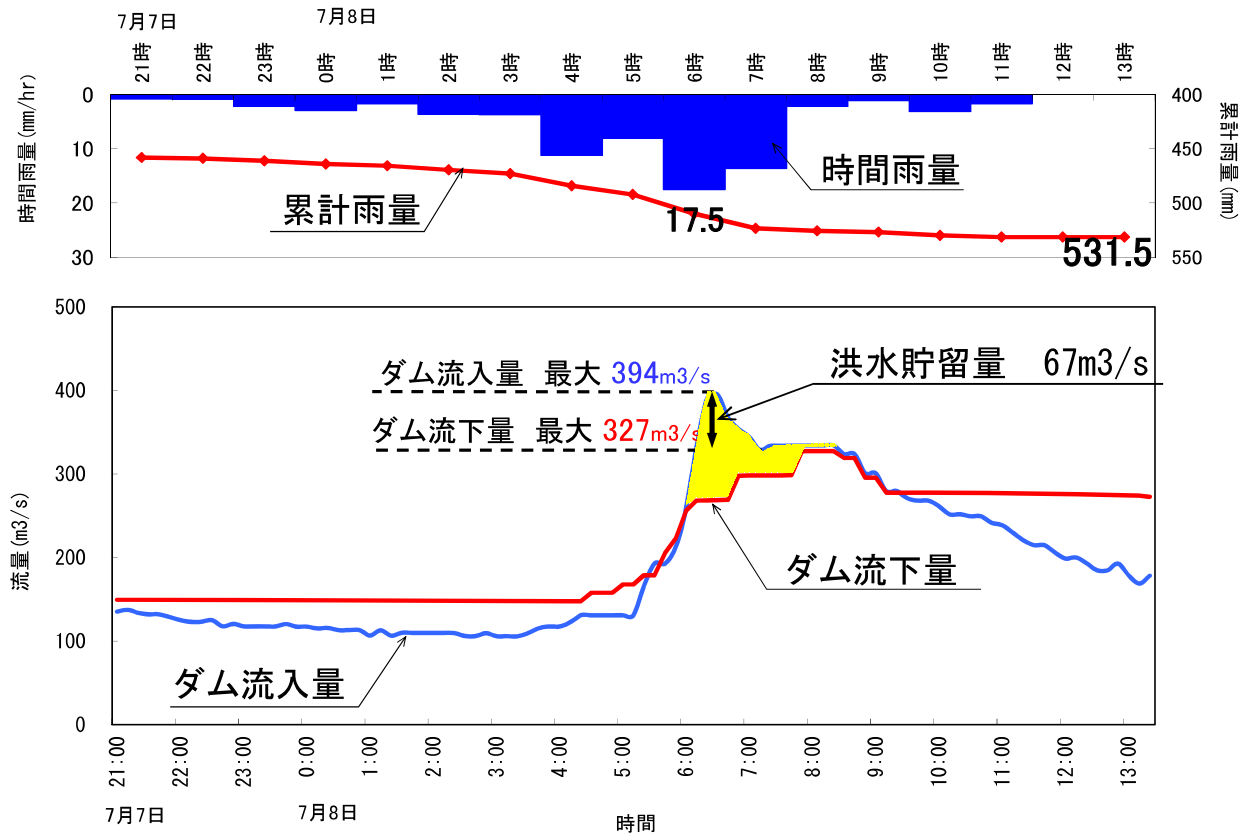

■現在の各ダムの貯水状況(7月8日14時)

