



令和 7 年 9 月 16 日
国土交通省四国地方整備局
徳島河川国道事務所

今切川左岸 6K/400 付近（北島町江尻地先） の護岸空洞化対策工事が完了しました

6 月 18 日より応急対策工を実施しておりました、今切川左岸 6K/400 付近（北島町江尻地先）の延長約 140m 区間での護岸空洞化について、対策工事が完了しました。

対策工事では一部のコンクリート護岸を取り壊し、背面の空洞化を確認するとともに、その空洞にコンクリート充填（計約 38m³）を実施しました。

関係機関の皆様につきましては施工へご協力いただきありがとうございました。

引き続き、河川施設の監視・管理に努めてまいります。

問い合わせ先（◎：主な問合せ先）

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

TEL:088-654-9266(直通)

副所長(河川)

河川管理課長

佐藤 英人（内線 204）

住岡 久雄（内線 331）◎


○被災要因

護岸の継目となる目地部分より、干満の影響を受け、護岸裏側の砂や土が抜け出し、空洞化に至ったとみられます。

○対策方法

護岸裏側から砂や土が抜け出すのを防ぐため、護岸継目部分へのシーリングを実施し、確認した空洞にコンクリートを充填しました。

位置図

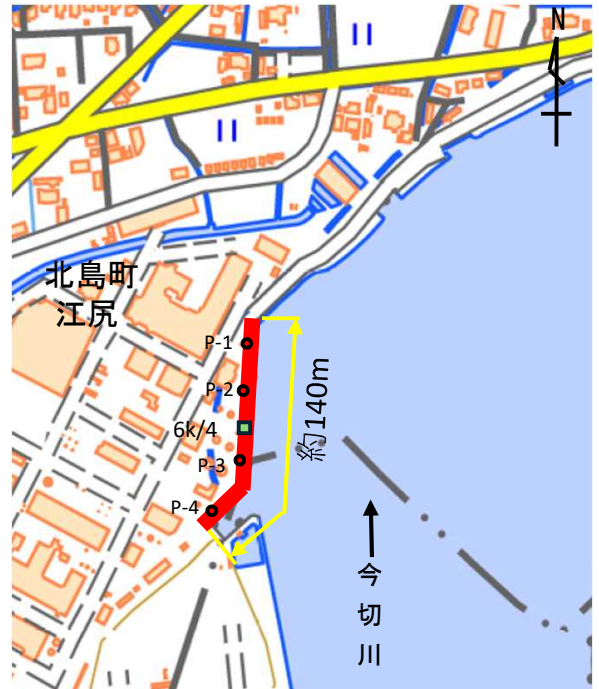

空洞化確認状況



護岸内部状況



コンクリート充填



対策工完了

