

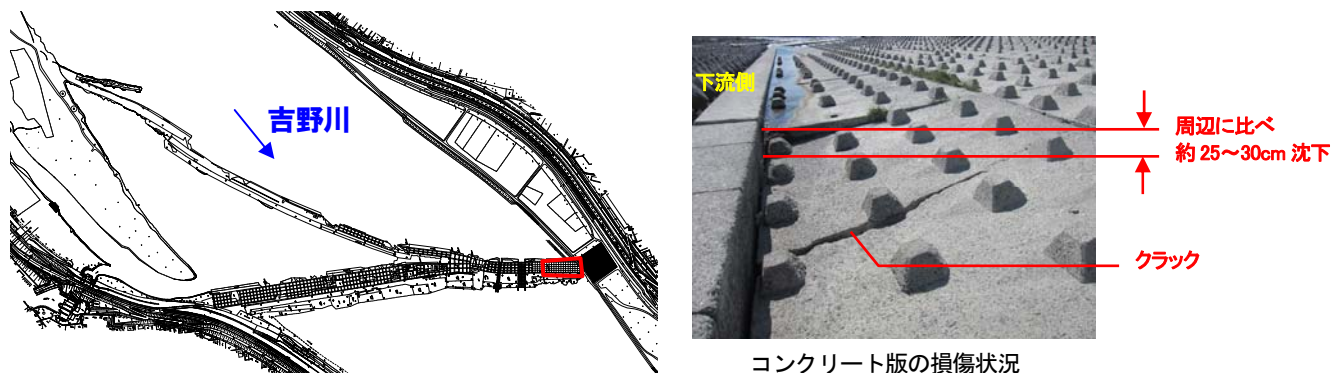


■ 修繕工事の概要

- 修繕工事については、平成25年12月3日より作業ヤードの整備等に着手しており、平成26年1月中旬より堰本体の修繕工事のうち、コンクリート版の撤去を開始しています。
- その後、現地見学会及び空洞状況等の調査を行ったうえで、堰内部の空洞を玉石等で補充したのち、コンクリート版で覆い、作業ヤードの撤去を含めて、平成26年3月上旬までに工事を完了させる予定です。
- 工事現場付近について、見学会開催日以外の工事期間中は、安全上入れません。

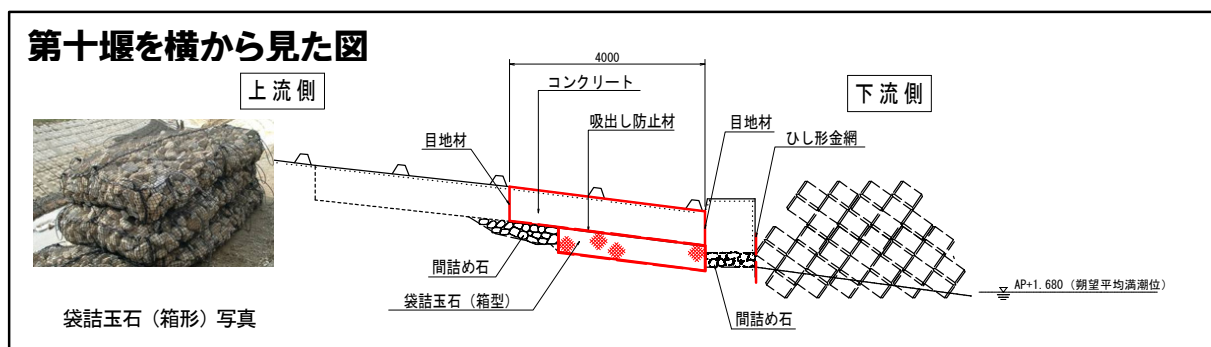

コンクリート版の損傷状況

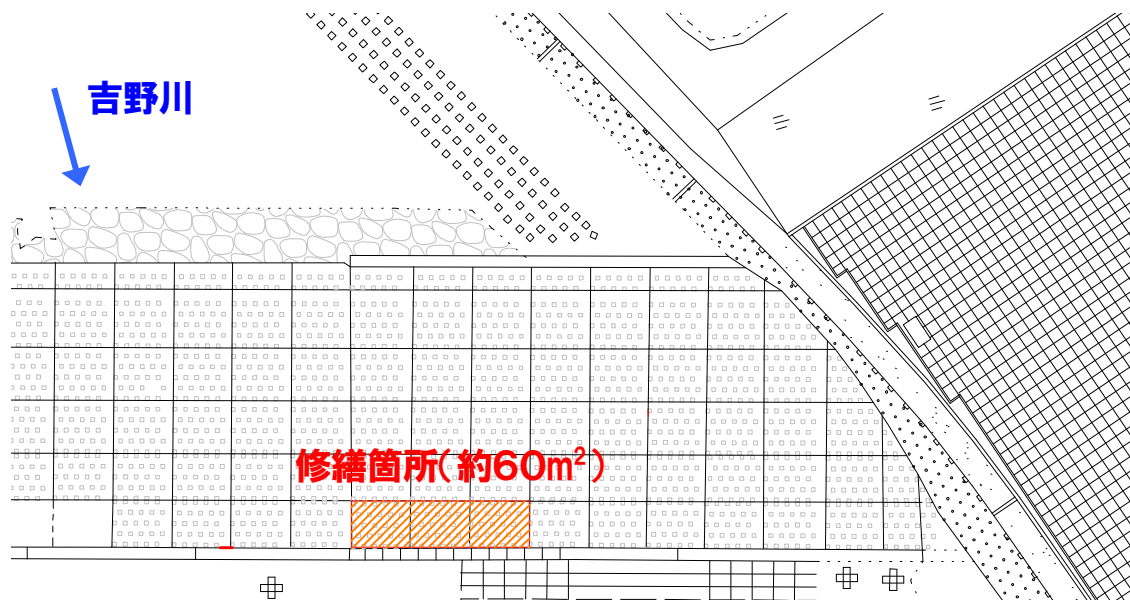

■ 空洞状況等の調査内容

今後、堰内部の空洞の大きさや水の流れ等を観測します。
結果については、今年度中にその概要を事務所のホームページにてお知らせする予定です。
