

# 法花トンネル工事だより (No.14)


編集：平成18年 6月 1日

## トンネル本坑掘削開始！

平成18年5月30日からトンネル本坑掘削を開始しました。  
本坑の掘削は下図の  
①注入式長尺先受工→②鏡ボルト→③上半掘削→④鋼製支保工建込み  
→⑤コンクリート吹付けの順で施工していきます。

## 現場見学会 開催！

平成18年5月17日に、上八万小学校3,4年生(約120名)を対象に現場見学会を開催しました。  
悪天候にも係らず、工事関係者の説明を、熱心に聴いている姿が印象的でした。また、初めて見るトンネル現場に感動しているようでした。

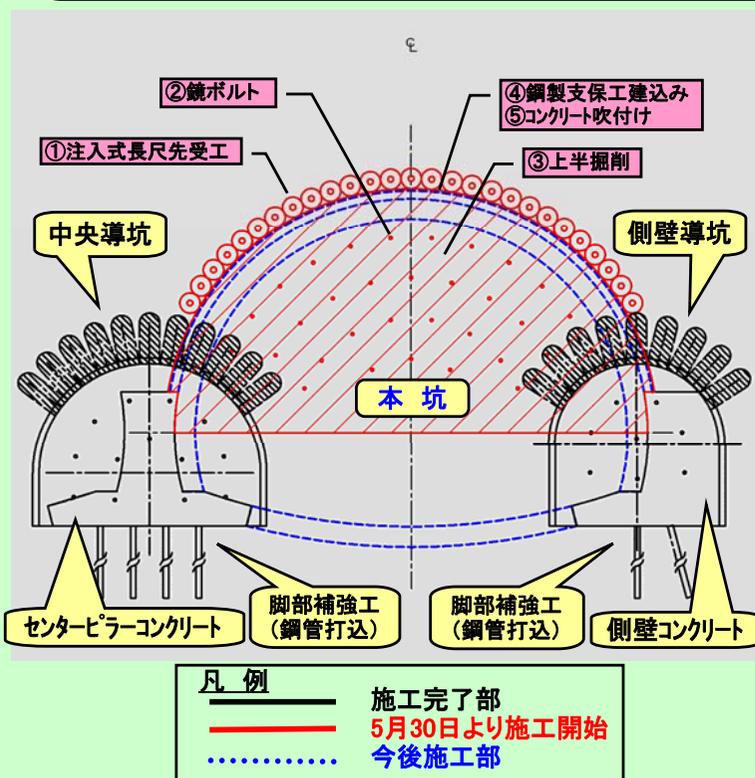

**トレヴィマシ(注入式長尺先受工)**

### 注入式長尺先受工

トンネル上方のやわらかい土砂を補強するために、直径14cm、長さ14mの鋼管を打込みます。  
トレヴィマシは、鋼管を打込む機械で、イタリア製です。総重量は118tもあります。



**現場見学会開催(上八万小学校3,4年生)**

法花トンネルのホームページが開設されています。  
アクセス方法は、  
徳島河川国道事務所(<http://www.toku-mlit.go.jp/>)に  
アクセスし、  
・道路資料館→・工事現場ガイド→・法花トンネル工事  
の順にクリックして下さい。法花トンネル工事の詳しい情報  
が得られます。

発注者：国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所  
連絡先：徳島建設監督官詰所  
TEL088-669-6090

<http://www.toku-mlit.go.jp/jimusyo/virtual/road/0403hok/>  
施工者：清水・大本特定建設工事共同企業体  
連絡先：法花トンネル工事作業所  
TEL088-668-6495

