


法花トンネル工事だより (No.8)

編集：平成17年10月1日

トンネル掘削 進行中！

トンネル掘削が順調に進んでいます。(中央導坑：65m 側壁導坑：73m)

法花トンネルの掘削方法は、野外劇場の手前まで、左下の平面図に、示すように本坑(将来道路になるトンネル)を掘削する前に、導坑を掘削します。この工法は、沈下防止対策として最も有効な工法です。

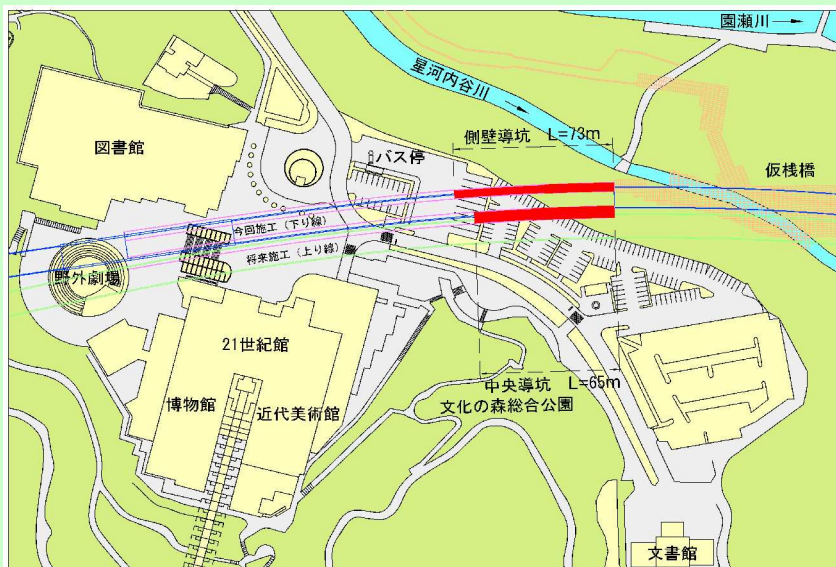

トンネル位置図 (平成17年9月30日 現在)



中央導坑掘削状況(シャロウダー)



切羽(地山)に削孔する機械(油圧ジャンボ)

法花トンネルのホームページが開設されました。
アクセス方法は、
徳島河川国道事務所 (<http://www.toku-mlit.go.jp/>)
にアクセスし、
・道路資料館 ・工事現場ガイド ・法花トンネル工事
の順にクリックして下さい。法花トンネル工事の詳細な
情報が得られます。

発注者：国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所
連絡先：徳島建設監督官詰所
088-669-6090
<http://www.toku-mlit.go.jp/jimusyo/virtual/>
施工者：清水・大本特定建設工事共同企業体
連絡先：法花トンネル工事作業所
088-668-6495
