


踏切道安全通行カルテ

更新日：令和6年1月末

よみがな	ふくだまちだいよん	所在地	香川県高松市瓦町1丁目7-15		
踏切道名	福田町第四	道路名	国道11号	道路管理者名	国土交通省
		鉄道路線名	琴平線	鉄道事業者名	高松琴平電気鉄道

位置図・現況写真

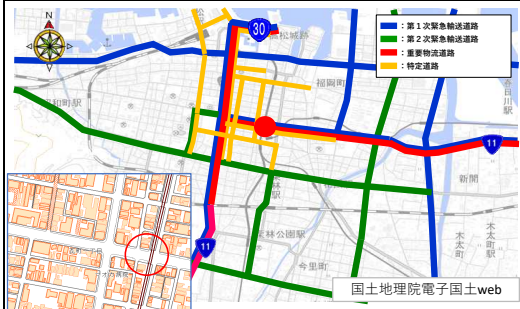

国土地理院電子国土web

現況



諸元・構造等

踏切種別		第1種		幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	
踏切長(m)		6.7			左道路	3.5	12.6	3.6	
横断本数(本)		2			踏切道	3.0	16.0	3.0	
交差角(度)		90			右道路	3.6	15.0	3.5	
道路 線形	左道路	直線		迂 回 路	種類	有無等		距離(m)	
	右道路	直線			自動車	両方共なし		-	
交通規制		交通規制なし			歩行者	迂回路なし (200m以内)		-	
車両進入防護柵等		設置していない			バリアフリー化	迂回路なし (200m以内)		-	
歩車道分離方法		白線・黄線			バリアフリー化 状況	-	DID地区	○	
踏切 保安 設備	賢い踏切		-		踏切支障報知 装置(手動)		○		
	高規格保安設備		-		高齢者等の事故 防止対策設備		連接軌道 隙間緩衝材		
特性	通学路指定状況 (学校指定)		○		通学路交通安全 プログラム		-		
	バリアフリー法に 基づく特定道路上		○(対応済)		緊急輸送道路上 重要物流道路上		緊1次、重物		
自動車交通量 (台/日)		23,888		歩行者等交通量 (人/日)		4,875	鉄道交通量 (本/日)	264	

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	20	前後歩道との 幅員差(m)	-0.6	踏切内の 事故発生 状況	事故 別	件数	死者数	地域 課題	-
A. 踏切自動車交通遮断 量(台・時)	97,941	AとBの和	117,928		踏切 事故	0	0		
B. 踏切歩行者等交通遮断 量(人・時)	19,988				道路交 通事故	0	0		

カルテ踏切の基準							R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭路踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切	
-	○	-	-	-	-	-	

法指定の状況					R6年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準（踏切道改良促進法施行規則）				
R4.12.16（現法）	第2条第12号 (地域課題踏切)	-	-	-	-

対策図・完了写真		対策実施の状況				R6年1月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
		-	-	-	-	
	対策内容					
	-					
	事業完了年度	対策の効果等				
	-	-				
	除却年度					
	-					
